


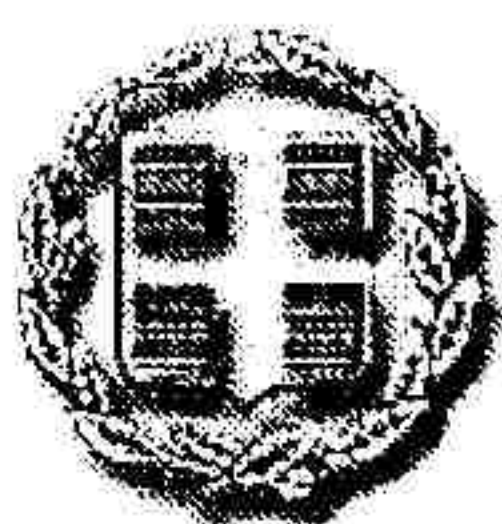

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

25 ΣΕΠ. 2012

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 15/9/2012

Αρ. Πρωτ.:Γ.Π 72940

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 210.5230110, 5237254
- Fax : 210.5237254

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 315/23-7-2012 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Κ. Τριαντάφυλλο σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», σας πληροφορούμε τα εξής :

Το έργο ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. Υ4β/Γ.Π. 98716/31-10-2002 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, με προϋπολογισμό 16.740.866 €. Η Σύμβαση με την ανάδοχο Κοινοπραξία υπεγράφη την 19-9-03 με διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες, ήτοι μέχρι 19-9-06.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16.528.313,10 €, συμπερ. απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ. Έχουν υπογραφεί δύο συμπληρωματικές συμβάσεις για τις απαραίτητες, επί πλέον, μελέτες και νέες εργασίες αρχαιολογίας, ανάδειξη ταφικού συνόλου, νέας θεμελίωσης καθώς και της αναγκαίας επέκτασης του ενεργειακού κέντρου του Νοσοκομείου και ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε στα 24.768.410,68 €, σύμφωνα με τον 4^ο ΑΠΕ (Σύμφωνη Γνώμη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής-έγγραφο Α.Π. 614/3-3-2011).

Το έργο εντάχθηκε ως έργο –γέφυρα από το Γ' ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ (αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 950/17-3-2010 Απόφαση –ΕΠ «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου»), με επιλέξιμη δαπάνη 8.897.673,47 €.

Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η Νέα Πτέρυγα του Νοσοκομείου και έχουν ήδη παραδοθεί και λειτουργούν ορισμένα τμήματα αυτής. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα κτίρια 6 και 7, που αφορούν εκσυγχρονισμό νοσηλευτικών κλινικών (χειρουργική και παιδιατρική) και με τη συνεργασία της Διοίκησης του Νοσοκομείου, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διοικητικής παραλαβής των ως άνω κτιρίων 6 και 7 και των υπολοίπων τμημάτων (ορισμοί επιτροπών, σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής, εκπαίδευση προσωπικού) προκειμένου να μετεγκατασταθούν οι χρήστες και να εκκενωθούν σταδιακά τα υφιστάμενα κτίρια, έως τέλος Οκτωβρίου 2012.

Σε ότι αφορά τη συνέχιση του έργου, υπενθυμίζουμε ότι παράλληλα λόγω των ανασκαφικών ερευνών στο έργο και λοιπών οικονομικών προβλημάτων, προκλήθηκε μία πολύχρονη καθυστέρηση, η οποία επί της ουσίας απαιτεί την επανεξέταση των μελετών δημοπράτησης των υφισταμένων κτιρίων που είχαν συνταχθεί το 2002, σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση των κτιρίων λόγω χρήσης και παλαιότητας, ώστε οι επεμβάσεις που θα γίνουν να οδηγήσουν στην πλήρη ανακαίνιση αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων νοσηλευτικών υποδομών. Ως εκ τούτου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, απαιτούνται και πρόσθετες εργασίες πέραν των συμβατικά προβλεπόμενων.

Για το θέμα αυτό η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. είναι σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου

Αιγαίου, καθώς και το Υπουργείο Οικονομίας, προκειμένου να εξευρεθεί ο προσφορότερος τρόπος προσέγγισης των παραπάνω πρόσθετων εργασιών, ο οποίος τελικά θα καθορίσει και τον ακριβή χρόνο περαίωσης του συνόλου του έργου.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Κ. Τριαντάφυλλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Δ/ση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΚΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

