



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

25 ΦΕΒ. 2016

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 24.02.2016

Αρ. Πρωτ 190

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση μεγάλων δημοσίων έργων

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2626/25.01.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Γιώργος Δημαράς

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Γιώργο Δημαρά
2) Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γρ. Υπουργού


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΠΡ05.00/ΟΔ/ΔΗ/551/29-01-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ-Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών ,το με αρ. πρωτ. ΕΠΠ-ΒΕ/Α/Φ12/εξ.994/29-01-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ /ΚΕΣΠ/ ΠΕ&ΒΕ και το με αρ. πρωτ. Α/6/00/07/34/6766/29-01-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΕΠ.Κ & ΔΕ ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΠΡ05.00/ΟΔ/ΔΗ/551/29-01-2016 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΕΠΠ-ΒΕ/Α/Φ12/εξ.994/29-01-2016 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. Α/6/00/07/34/6766/29-01-2016 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΠΡΟΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : κ.κ Κωστόπουλος, Θεοδοσάκης,
Μανουσάκης, Ντούντα

Τηλέφωνο : 210-6417507

FAX : 210-6417530

e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX



Αθήνα, 29 - 01 - 2016

Αριθ. Πρωτ. : ΚΓ/ΠΡ05.00/ΟΔ/ΔΗ/551

Προς : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(δια του Γρ. Γ.Δ.Σ.Υ.)
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 ΑΘΗΝΑ
Fax. : 210 6442940
e-mail : gke@ggde.gr
e-mail : gdsy@ggde.gr

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση βουλευτού.

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ.: 190/26-01-2016 έγγραφό σας.
β) Η από 25 Ιανουαρίου 2016 ερώτηση βουλευτού κ. Δημαρά Γεωργίου.

Σε απάντηση του σχετικού (α) εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την σχετική (β) ερώτηση βουλευτού με θέμα «Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση μεγάλων δημοσίων έργων», και όσον αφορά έργα αρμοδιότητάς της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Α. Σχετικά με την "Ολυμπία Οδό"

Για το έργο: «Ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, Τμήμα 1 Δουναίικα - Πύργος (Χ.Θ 66+360 - Χ.Θ 74+500).

1. Έχει εγκριθεί με την αρ. πρ. Δ.Ο.Υ/ο/6124/17-12-2015 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω68Χ4653ΟΞ-ΕΣΜ) η δέσμευση ποσού 67.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και η διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ07100044 της ΣΑΕ 071.
2. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στις 8 Μαρτίου 2016.

Β. Σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο Ακτιο - Αμβρακία (τμήμα της Ιονίας Οδού).

Το Υπουργείο μας δημοπράτησε και ανέθεσε στις 16/03/2010 την κατασκευή του έργου «Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα Βορρά-Νότου» μήκους 48,5Κμ, του οποίου η κατασκευή γίνεται σε τέσσερα διακεκριμένα τμήματα από αντίστοιχες εργολαβίες που είναι οι παρακάτω :

Β1) α) Τμήμα από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 22+500 (Ακτιο-Δρυμός)
Ανάδοχος του έργου: « ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε »

1. Χρηματοδότηση: Ενάριθμο έργο 2009/ΣΕ07180000 της ΣΑΕ 071/8
Υπογραφείσα σύμβαση: 16-03-2010
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης: 16-03-2013
Εγκεκριμένη προθεσμία περάτωσης: 16-04-2016 (ΑΔΑ: 6Ψ0Ζ4653ΟΞ-ΑΣ4)
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 30-10-2017

2. Αρχικός προϋπολογισμός (ποσό σύμβασης): 87.410.459,44 €

Τελευταία πιστοποίηση: 41^η Πιστοποίηση
Πιστοποιηθέν ποσό: 44.907.560,75 € (ΑΔΑ: 6ΛΕΜ4653ΟΞ-ΥΟ7)

β) Τμήμα από Χ.Θ 22+500 έως Χ.Θ 26+900 (Δρυμός)
Ανάδοχος του έργου: Κ/ξία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» (ΑΔΑ: 6Π0Θ1-ΒΥ0)

1. Χρηματοδότηση: Ενάρθμο έργο 2009/ΣΕ07180000 της ΣΑΕ 071/8
Υπογραφείσα σύμβαση: 16/03/2010
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης: 16-03-2013
Υπό έγκριση προθεσμία περάτωσης: 16-04-2016
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 30-10-2017

2. Αρχικός προϋπολογισμός (ποσό σύμβασης): 24.064.606,12 €
Τελευταία πιστοποίηση: 19^η Πιστοποίηση
Πιστοποιηθέν ποσό: 8.983.559,28€ (ΑΔΑ: 7ΨΞΖ465ΦΘΘ-ΘΝΔ)

γ) Τμήμα από Χ.Θ 26+900 έως 35+000 (Δρυμός-Λουτράκι)
Ανάδοχος του έργου: : Κ/ξία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ- ΑΚΤΩΡ Α.Ε» (ΑΔΑ: 78ΧΜ1-ΑΑΕ)

1. Χρηματοδότηση: Ενάρθμο έργο 2009/ΣΕ07180000 της ΣΑΕ 071/8
Υπογραφείσα σύμβαση: 16/03/2010
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης: 08-03-2014
Εγκεκριμένη προθεσμία περάτωσης: 08-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΩ004653ΟΞ-ΛΨ5).
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 10-10-2017

2. Αρχικός προϋπολογισμός (ποσό σύμβασης) : 27.969.354,92 €
Τελευταία πιστοποίηση: 24^η Πιστοποίηση
Πιστοποιηθέν ποσό: 10.116.418,09 € (ΑΔΑ: ΒΜ3Ω465ΦΘΘ-5Ι7)

δ) Τμήμα από Χ.Θ 35+000 έως Χ.Θ 48+500 (Παράκαμψη Αμφιλοχίας)
Ανάδοχος του έργου: «Consorzio Stabile Italimprese Societa a Responsabilita Limatata».

1. Χρηματοδότηση: Ενάρθμο έργο 2009/ΣΕ07180000 της ΣΑΕ 071/8
Υπογραφείσα σύμβαση: 16/03/2010
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης: 16-03-2013
Υπό έγκριση προθεσμία περάτωσης: 16-04-2016
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 30-10-2017

2. Αρχικός προϋπολογισμός (ποσό σύμβασης): 38.105.185,61€
Τελευταία πιστοποίηση: 29^η Πιστοποίηση
Πιστοποιηθέν ποσό: 19.988.711,63€ (ΑΔΑ:ΨΟ04465ΦΘΘ-5ΨΥ)

Β2) Σχετικά με την εκτίμηση του κόστους ολοκλήρωσης και παράδοσης των έργων, σημειώνουμε ότι για το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο δεν αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση.
Οι όποιες πρόσθετες δαπάνες θα αφορούν συμπληρωματικές εργασίες αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων που παρατηρούνται στους ορεινούς όγκους κατά μήκος των έργων.

Γ) Σχετικά με το ενδεχόμενο μη παράδοσης των έργων στα χρονικά περιθώρια που έχει θέσει η Κομισιόν, σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε η δαπάνη των υπολειπομένων εργασιών να μεταφερθεί στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο.


Το έργο έχει χαρακτηριστεί "έργο-phasing" και η χρηματοδότηση του θα συνεχιστεί από το ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020, συνεπώς είναι εξασφαλισμένη η επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου μέχρι το 2020.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φάκ. Δ/ντού.
2. Τμήμα Γ'
3. κ. Κωστόπουλο
- 4 κα Ντούντα Φ.
5. κ. Μανουσάκη, 6. κ. Θεοδοσάκη
7. ΦΚ/ΠΡ05.00/ΟΔ/ΔΗ
8. Χ.Α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε/Κ.Σ.Σ.Υ

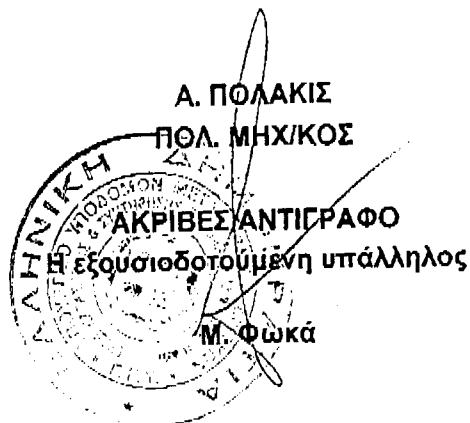



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**

**ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ / ΚΕΣΠ / ΠΕ&Β.Ε.**

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης
Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αθήνα,

29-01-2016

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΠΠ-ΒΕ/Α /Φ12/εξ.994
Σχετικά: 778



0000994-16

Ειςρχόμενο

ΑΡ. ΠΡΩΤ:994 - 29/1/2016

ΤΜΗΜΑ Γ

Αντ/μος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

Πληροφορίες : Ελ. Γκούφα
Τηλέφωνο: 210 6992251
Φαξ: 210 6996668

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182, 101 78 Αθήνα
Τηλ. 210 6467912, 210 6455731
FAX 210 6442940

ΚΟΙΝ.: Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Συγκ. Υποδ. (μ.σ. το
(α) σχετικό)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 2626/25-01-2016 Κοινοβουλευτική Ερώτηση του κ.υ. Τζαβρούλη Δημήτρη με θέμα «Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση μεγάλων δημοσίων έργων»

Σχετικά: (α) Το με α.π. 190/26-01-2016 έγγραφο σας (α.π. εισερχομένου στην Υπηρεσία μας Γ 778/26-01-2016).

Επί του περιεχομένου της εν θέματι Κοινοβουλευτικής Ερώτησης που μας απεστάλη με το (α) σχετικό και σε ό,τι αφορά στο Έργο Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με βάση το Χρονοδιάγραμμα του Έργου που ίσχυε κατά την επανεκκίνηση του (Ιανουάριος 2014, βάσει του Ν. 4219/2013 με τον οποίο τροποποιήθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε αρχικά με τον Ν. 3621/2007), η ολοκλήρωσή του προβλεπόταν να γίνει έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2015. Έχει ήδη δοθεί παράταση (λόγω αλλαγής νομοθεσίας για την εφαρμογή στηθαίων ασφαλείας) για την 6^η ΑΤΠ έως τις 17-07-2016 και την συνολική Τ1 έως τις 27-09-2016, καθώς όμως έχουν διαπιστωθεί διάφορα γεγονότα καθυστέρησης (για εμπλοκές με σιδηροδρομικό δίκτυο, αδειοδοτήσεις, αρχαιολογία, απαλλοτριώσεις κλπ) και οι ως άνω χρόνοι περάτωσης του Έργου δεν είναι εφικτοί, σε συνεργασία των Ελληνικών Αρχών με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε. γίνεται προσπάθεια αναθεώρησης των Επιχ. Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία του Έργου (εν όλω ή εν μέρει) μέχρι τις 31-03-2017.
2. Ο αρχικός προϋπολογισμός για το κατασκευαστικό κόστος του Έργου της Ολυμπίας Οδού (Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα), με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε με τον Ν.3621/2007, ήταν 2.098.650.000 ευρώ (με προϋπολογισμό



έναρξη εργασιών στις 1/1/2008 και πέρασ: α) στις 30/6/2011 για το τμήμα Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα - Πύργος και β) στις 31/12/2013 για το τμήμα Πύργος – Τσακώνα). Μετά την επανεκκίνηση του Έργου και την περικοπή εκ του φυσικού του αντικειμένου του τμήματος Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα, ο προϋπολογισμός για το κατασκευαστικό κόστος του Έργου που προβλέπεται σήμερα συμβατικά, είναι 1.338.197.922 ευρώ, περιλαμβανομένων και των εργασιών που είχαν κατασκευαστεί μέχρι την 17/12/2013 για το τμήμα Πάτρα – Πύργος και τις μελέτες που είχαν εκπονηθεί για το τμήμα Πύργος - Τσακώνα. Το κόστος του Έργου δεν διαφοροποιήθηκε σε σχέση με την αρχική Προσφορά του Παραχωρησιούχου, καθόσον με βάση αυτή αφαιρέθηκε το αντικείμενο του τμήματος Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα.

Τα ποσά που έχουν μέχρι σήμερα πιστοποιηθεί και πληρωθεί στον Ανάδοχο του Έργου από το Δημόσιο (λόγω και των καθυστερήσεων που έχουν προκύψει), περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα:

	ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ (€)	ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ (€)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ (Χ.Σ.)	412.893.970,45	412.893.970,45
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ (Π.Χ.Σ.)	218.481.761,00	218.481.761,00
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	130.000.000,00	130.000.000,00
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (με βάση την από 12/04/2013 Συμφωνία και την από 29/11/2013 Συμπληρωματική Συμφωνία μεταξύ Δημοσίου και Παραχωρησιούχου)	62.967.544,00	60.366.329,00
Δαπάνες και έξοδα που επήλθαν σε σχέση και κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης της περάσεως της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης	88.766.668,25	88.766.668,25
ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ	777.021,87	777.021,87
Συμπληρωματικές εργασίες (αρχιτεκτονικά κλπ)	14.145.738,27	14.145.738,27
ΣΥΝΟΛΟ	928.032.703,84	925.431.488,84

Ε. 4.

1. ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ
2. Φ12
3. Χρον. Αρχείο/ Γ
4. Ελ. Γκούφα

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ

Ι. Καρνίσης
Πολ. Μηχ/κός με Β' β.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Υ.Δ.Ι. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.)
ΤΜΗΜΑ : Κ.Ε.

Πληροφορίες : Γ. Δώσσης
Τηλέφωνο : 2106992237
e-mail : gdossas@gmail.com

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016
Αρ. πρωτ.: Α/6/00/07/34/6766

ΠΡΟΣ : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΠ.: Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ/κών Υποδομών

ΘΕΜΑ : «Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση μεγάλων δημοσίων έργων»

ΣΧΕΤ.: (α) Η με αρ. πρωτ. 2626/25-1-2016 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γεωργίου Δημαρά προς τη Βουλή των Ελλήνων.
(β) Το με αρ. πρωτ. 190/26-01-2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του (α) σχετικού που μας διαβιβάστηκε με το (β) σχετικό και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας και όσον αφορά το έργο «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε 65)», σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η αρχική Σύμβαση Παραχώρησης του έργου υπογράφηκε την 31/5/2007 και κυρώθηκε με τον νόμο Ν.3597/2007 ΦΕΚ 168Α'. Οι εργασίες κατασκευής του έργου εκκίνησαν την 31/03/2008. Η Σύμβαση προέβλεπε, για το σύνολο του έργου από Ημικόμβο ΠΑΘΕ (Λαμία) έως Α/Κ Εγνατίας (μήκους 172χλμ), ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 30/9/2013. Λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα οι δανειστικές τράπεζες σταμάτησαν την χρηματοδότηση του έργου την άνοιξη του 2010. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τον Φεβρουάριο του 2011 να γίνει αναστολή εργασιών στο έργο του Αυτοκινητόδρομου Ε65 καθώς και των λοιπών έργων Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομων. Τον Νοέμβριο του 2013 επετεύχθη Συμφωνία Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης η οποία κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων (Ν. 4219/2013- ΦΕΚ 269Α), Οι εργασίες επανεκκίνησαν στις 20/12/2013 για το Τμήμα του έργου Α/Κ Ευριάδας - Α/Κ Τρικάλων, μήκους περίπου 79 χλμ, με στόχο την ολοκλήρωσή τους στις 31/12/2015 (Κατασκευαστική Περίοδος Τ1). Λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν στην παράδοση των χώρων εκτέλεσης του έργου κυρίως λόγω των διαδικασιών απαλλοτρίωσης καθώς και των δεσμεύσεων χώρων για αρχαιολογικές έρευνες, ζητήθηκε εκ μέρους των Παραχωρησιούχου παράταση προθεσμίας και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την Σύμβαση Παραχώρησης δόθηκε παράταση μέχρι την 10/1/2017.
2. Το συνολικό τίμημα Μελετών - Κατασκευών σύμφωνα με την προσφορά του Παραχωρησιούχου ανέρχεται σε 1.305.064.287 € για το σύνολο του έργου Με την Συμφωνία Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 4219/2013- ΦΕΚ 269Α), για το Τμήμα του έργου Α/Κ Ευριάδας - Α/Κ Τρικάλων, η Χρηματοδοτική Συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ),

ανέρχεται στο ποσό των 517.990.000,00 € και έχει ήδη καταβληθεί το ποσό των 417.990.000,58 €. Η καταβολή της Χρηματοδοτικής Συμβολής πραγματοποιείται σε καθορισμένες ημερομηνίες, σύμφωνα με την επίτευξη καθορισμένου ποσοστού ολοκλήρωσης του έργου το οποίο μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε ποσοστό φυσικής προόδου 66,25%.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Τροποποίησης, προβλέπεται Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου επίσης με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 231.407.833,00 € η οποία καταβάλλεται σε καθορισμένες ημερομηνίες και έχει ήδη καταβληθεί το ποσό των 203.550.689,00 €.

Ε.Δ.

1. Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
2. Τμήμα : Κ.Ε.
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ.Α.: Α/6/00/34

Ο Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.

Ζήσιμος Καρβούνης

Πολ. Μηχ. με Β' βαθμό

