



07 ΜΑΡ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 04.03.2014

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 1141/1155

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Τροχαία ατυχήματα στο βόρειο οδικό άξονα (ΒΟΑΚ) Κρήτης

ΣΧΕΤ: 1) Η Ερώτηση 6017/05.02.2014 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης
2) Η Ερώτηση 6095/07.02.2014 που κατέθεσαν στη Βουλή,
οι Βουλευτές κυρία Μαρία Διακάκη και κύριοι Μιχάλης Κριτσωτάκης,
Κωστής Δερμιτζάκης, Ανδρέας Ξανθός

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη
2) Βουλευτή κα Μαρία Διακάκη
3) Βουλευτή κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη
4) Βουλευτή κ. Κωστή Δερμιτζάκη
5) Βουλευτή κ. Ανδρέα Ξανθό
6) Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Ερωτήσεων, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία και τους κυρίους Βουλευτές, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εξής :

Το Υπουργείο, προγραμματίζει άμεσα την εκπόνηση μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον ΒΟΑΚ. Η μελέτη αυτή θα χωροθετήσει όλο τον άξονα γεωγραφικά, θα ιεραρχήσει την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα των επί μέρους τμημάτων, με βάση αντικειμενικές παραμέτρους όπως ο τωρινός αλλά και αναμενόμενος μελλοντικά κυκλοφοριακός φόρτος, στατιστικά ατυχημάτων, επιδιωκόμενη χρονοαπόσταση μεταξύ βασικών προορισμών, όπως αεροδρόμια-λιμάνια, κ.λ.π., ταχύτητες κυκλοφορίας, κ.α. και εν τέλει θα προσδιορίζει το απαιτούμενο κόστος τόσο για την κατασκευή του άξονα συνολικά, όσο και σε επί μέρους τμήματά του. Μέσα από αυτή τη μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού, θα προκύψουν οι βασικές προτεραιότητες, με τις αντίστοιχες δαπάνες τους, αλλά και η εξέταση διαφόρων δυνατοτήτων χρηματοδοτήσεων μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή άλλες μεθόδους κατασκευής. Η μελέτη αυτή ήταν και είναι αίτημα πολλών φορέων και Υπηρεσιών της Κρήτης, όπως τεχνικά επιμελητήρια, κ.α.

Με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του ΒΟΑΚ, στόχος είναι να ολοκληρωθούν όλα τα έργα με νομικές δεσμεύσεις στο ΕΣΠΑ, μέχρι το τέλος του 2015 και να εκπονηθούν και εγκριθούν όλα τα στάδια ενός ολοκληρωμένου πακέτου μελετών. Σκοπός μας είναι η ένταξη και κατασκευή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος έργων στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αναζητώντας όμως συγχρόνως και άλλους τρόπους χρηματοδότησης, για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης, σε ένα διεθνές και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, προκειμένου οι χρονικές οδικές αποστάσεις να μικρύνουν και να αυξηθεί η ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Υπενθυμίζεται ότι, η συντήρηση του ΒΟΑΚ εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

Επισυνάπτονται πίνακες, των ώριμων μελετών που εκπονούνται, καθώς και των έργων που εκτελεί η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.» (πρώην ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ), για την ενημέρωσή σας.

Συνημμένα

- 7 πίνακες του «Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ



Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη

Πίνακας μελετών

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΜΗΚ ΟΣ Km	ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ	6	619.306	40.000.000 €	Για έγκριση οι Π.Ο.& προμελέτης
2	ΚΑΛΥΒΕΣ - ΒΡΥΣΕΣ	~8	634.084	50.000.000 €	Για έγκριση της οριστικής μελέτης
3	ΒΡΥΣΕΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΜΑΡΙ - ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ	30	2.390.543	70.000.000 €	Για έγκριση οι Π.Ο.& προμελέτης
4	ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ - ΠΑΝΟΡΜΟ	8	639.980	35.000.000 €	Για έγκριση οι Π.Ο.& της οριστικής μελέτης
5	ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΕΞΑΝΤΗΣ	~9	3.059.000	50.000.000 €	Πλήρης
6	ΦΟΔΕΛΕ - ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ	14	1.962.174	300.000.000 €	Για έγκριση Πρωθ. Αναγν.μελέτης
7	ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	10	877.877	65.000.000 €	Πλήρης Υπό ανάθεση οριστική μελέτη 4 γεφυρών
8	ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	14	959.385	90.000.000 €	Εγκεκρ ΠΟ - Υπο έγκρ οριστική μελέτη
9	ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΦΡΟΥΖΗ	5	3.777.760	40.000.000	Για έγκριση οι Π.Ο.& προμελέτης

10	ΚΑΒΟΥΣΙ - ΑΓΚΑΘΙΑΣ	~25		220.000.000 €	Για έγκριση Πρωθ. Αναγν.μελέτης
11	ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΛΑΣΤΡΟΣ		440.205	€	
12	ΦΡΟΥΖΗ - ΚΑΒΟΥΣΙ	~6	1.027.145	65.000.000 €	Για έγκριση πρ. αναγ. μελέτης
13	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (3)		3.276.704		
	ΣΥΝΟΛΟ	135	19.664.163	1.025.000.000 €	



Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗ/ΣΗΣ	ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΗ	ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Μήκος (Κm)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ						
1	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΙΑΝΝΟΥ	13.000.000	11.500.000	Νέο έργο ΝΟΑΚ	Συντελεσμένη	31-Μαϊ-11	24 μήνες	3,8	Δημοπράτηση 31-5-2011 Υπογραφή σύμβασης : 9 Ιανουαρ.2012 - Εκτελείται.
2	ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ (Ημικόμβος Μαλίων)	10.000.000	7.500.000	Νέο έργο ΒΟΑΚ	Συντελεσμένη 95%	24-Απρ-12	18 μήνες	-	Δημοπράτηση 24-4-2012. Υπογραφή σύμβασης 29 Νοεμβρίου 2012. Εκτελείται.
3	ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	85.000.000	65.000.000	Νέο έργο ΒΟΑΚ	Κιηρυγμένη απαλ/ση	17-Ιαν-12	36 μήνες	9,1	Υπογραφή σύμβασης την 22/10/2012.
4	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Βηθ ΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΑΛΑΤΑΣ - ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ	4.000.000	3.000.000	Έργο γέφυρα ΒΟΑΚ	Συντελεσμένη	16-Απρ-13	18 μήνες	-	Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του υπολειπόμενου αντικειμένου έκπτωσης εργολαβίας
5	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Βηθ ΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΑΛΑΤΑΣ - ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ	4.000.000	3.000.000,0	Έργο γέφυρα ΒΟΑΚ	Συντελεσμένη	16-Απρ-13	18 μήνες	-	Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του υπολειπόμενου αντικειμένου έκπτωσης εργολαβίας. Κατακύρωση αποτελέσματος & υπογραφή της σύμβασης.
6	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΧΗΝ ΑΓΚΑΘΙΑΣ - ΧΑΜΕΖΙ	12.000.000	10.500.000	Έργο γέφυρα ΒΟΑΚ	Συντελεσμένη	9&16/4/2013	24 μήνες	3,7	Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του υπολειπόμενου αντικειμένου έκπτωσης εργολαβίας
		128.000.000	100.500.000					16,6	

Ησάκλειο 31-12-2013

Γιωργος Αγαπακης
Διττής ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ	ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ	ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ (Δ/ση Προκήρυξης)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Μήκος (Km)	Βαθμός ωρίμανσης		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΔΗΜ/ΣΗΣ											
1	Α/Κ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - Α/Κ ΕΞΑΝΤΗ	75.000.000	63.500.000	ΣΕΣ	ΕΥΠΕ/οικ.205672/ 30-11-2011.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	4/3/2014	30 μήνες	10,0	<		
2	ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ Α/Κ ΜΟΥΡΝΙΩΝ - ΧΑΝΙΑ	12.000.000	6.500.000	ΣΕΣ	Εγκρίθηκε η παράταση Π.Ο. (20261/24-11-1995)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	4/3/2014	18 μήνες	1,1	<		
3	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΠΟΜΑΡΜΑ (Χ.Θ. 22+170 - Χ.Θ. 29+994)	47.000.000	47.000.000	ΕΣΠΑ	ΝΑΙ (Υπό έγκριση η τροποποίηση)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Α' 2014	24 μήνες	8,0	<		
		134.000.000	117.000.000								19,1			

Ν Ε Α Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α Ε Ρ Γ Α Π Ρ Ο Σ Ε Ν Τ Α Ξ Η & Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ο Σ Ε.Σ.

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ	ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΥΧΩΝ	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ	ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Μήκος (Km)	Βαθμός ωρίμανσης		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ									ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ	ΕΛΛΕΙΨΗ	
1	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ	50.000.000	40.000.000	Νέο έργο ΒΟΑΚ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	-	30 μήνες	6,0		<	Εκκρεμεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από Δ/νση Περι. Α.Δ. Κρήτης και προμελέτης από ΔΜΕΟ. Εκκρεμεί η σύνταξη της οριστικής μελέτης οδοποιίας, οριστικών μελετών τεχνικών έργων, υδραυλική μελέτη
2	ΒΟΑΚ ΤΜΗΜΑ Κ. ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ	60.000.000	50.000.000	Νέο έργο ΒΟΑΚ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	-	36 μήνες	8,0		<	Εκκρεμεί η έγκριση της οριστικής μελέτης οδοποιίας, οριστικών μελετών τεχνικών έργων, υδραυλική μελέτη από ΔΜΕΟ.
3	ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ - ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ	50.000.000	40.000.000	Νέο έργο ΒΟΑΚ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	-	30 μήνες	6,0		<	Εκκρεμεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από ΕΥΠΕ. Εκκρεμεί η αποστολή και έγκριση της οριστικής μελέτης οδοποιίας, της υδραυλικής μελέτης, της προμελέτης τεχνικών έργων, από ΔΜΕΟ
4	Α/Κ ΑΝΩΠΟΛΗΣ	20.000.000	15.000.000	Νέο έργο ΒΟΑΚ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	-	24 μήνες	1,5		<	Εχουν υποβληθεί για έλεγχο στην υπηρεσία η ΜΠΕ, η οριστική μελέτη οδοποιίας, η υδραυλική μελέτη και η προκαταρκτική μελέτη τεχνικών έργων και ακολουθός για έγκριση
5	ΗΜΙΚΟΜΒΟΣ ΜΟΧΟΥ	3.500.000	3.000.000	Νέο έργο ΒΟΑΚ	Απόφαση παρατάσης & τροποσης 2038/78/29 9-11	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Συντελεσμένη		18 μήνες	1,0		<	Εχει πλήρεις μελέτες & συντζ/νη απαλλοτρίωσηΑ καίταιται προσαρμογή των συμβι τευχών με ΕΤΕΠ και υποβολή πρότασης στην Διαχειριστική Αρχή για ένταξη
6	ΝΕΑΠΟΛΗ - ΛΙΜΝΕΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)	50.000.000	45.000.000	Νέο έργο ΒΟΑΚ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	-	30 μήνες	7,0		<	Εχουν υποβληθεί από τον μελετητή στην υπηρεσία μας η οριστική μελέτη οδοποιίας και η υδραυλική μελέτη ενώ εκρεμεί η υποβολή της προμελέτης τεχνικών έργων και του κτηματολογίου Ο ανάδοχος έχει υποβάλει πρόταση αναδιαμόρφωσης του τεχνικού και οικονομικού αντικείμενου με σύνταξη ΣΠ ώστε να περιληφθούν οι τροποποιήσεις που προβλέπονται από τη ΜΠΕ και να καταστεί ώριμο προς δημοπρατηση ένα τμήμα του έργου διατι δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι τεχνικές μελέτες για ολο το οδικό τμήμα
7	ΒΟΑΚ- ΤΜΗΜΑ: ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΟΥΖΗ.	50.000.000	40.000.000	Νέο έργο ΒΟΑΚ	Υπό έγκριση (Δ/νση Χωρ. Α.Δ. Κρήτης)	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	-	36 μήνες	5,0		<	Εκκρεμεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από Δ/νση Περι. Α.Δ. Κρήτης και προμελέτης από ΔΜΕΟ. Εκκρεμεί η σύνταξη της οριστικής μελέτης οδοποιίας, οριστικών μελετών τεχνικών έργων, υδραυλική μελέτη, Κτηματολόγιο
8	ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ - ΓΕΡΑΠΕΤΡΑ	90.000.000	80.000.000	Νέο έργο ΒΟΑΚ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	-	30 μήνες	14,0		<	Εχουν συνταχθεί και εγκριθεί όλες οι μελέτες, εκτός του Κτηματολογίου που εκπονείται
		373.500.000	313.000.000								48,5			

(*) Με βάση τα κριτήρια Δ1 & Δ2 της εγκ. 38/2005

Ημερομηνία 31-12-2013

Γιώργος Αναπακίης
Διευθ. ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ



Συνοπτικός Σχεδιασμός 2014 :	
α. Δημιοπράτηση έργων :	1.«Ολοκλήρωση τμήματος Αγία Βρβάρα - Απομαρμά», 2.«Γεροπόταμος – Πάνορμο – Εξάντης», 3.«Συνδετήρια οδός Α/Κ Μουρνιών – Χανιά» & 4.«Α/Η.Κ. Μοχού».
β. Προκήρυξη μελετών :	1. «Στρατηγικός σχεδιασμός» του ΒΟΑΚ (ΕΠΕΠ & ΟΑΚ ΑΕ) 2. "Α/Κ Μαλλίων με συνδετήρια οδό με Π.Ε.Ο." 3. Ολοκλήρωση διαδικασίας προκήρυξης μελέτης "Γούρνες - Χερσόνησος"
γ. Ολοκλήρωση πακέτου μελετών :	1. Παράκαμψη Καστελίου, 2. Καλύβες-Άγιοι Πάντες, 3. Εσταυρωμένο – Γεροπόταμος, 4. Α/Κ Ανώπολης 5. Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος 6. Καλό Χωριό - Φρουζή 7. Παχειά Άμμος - Ιεραπετρα κ.α.)
δ. Ολοκλήρωση & παράδοση έργων :	1. Άγιος Νικόλαος - Καλό Χωριό, 2. Ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλίων, 3. Ολοκλήρωση βελτίωσης Βόρεια ράμπας Κοκκίνι Χάνι, 4. Ολοκλήρωση Α/Κ Αμαρίου Ρεθύμνου 5. Ολοκλήρωση εργασιών Γαλατάς - ΠΕΟ & Ι/Κ Δραπανιά Καστελλίου Κισσάμου, κ.α.



Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜ.ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΕΡΑΙΩΣΗ	ΤΕΛΕΥΤ. ΕΓΚ. ΑΠΕ (ΕΥΡΩ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΛΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ									
1	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ	Ε.Π.Ε.Π.	21/10/2009	31/3/2014	2ος ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΕ 38.839.401,88	30.264.128,27	78%	Εκτελείται κανονικά.	ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2	ΜΑΛΙΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Ε.Π.Ε.Π.	15/1/2007	31/5/2012	ΣΥΜΒΑΣΗ 12.806.533,56		100%	Περατώθηκε και παραδόθηκε σε χρήση.	ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
3	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΛΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ.	Ε.Π.Ε.Π.	28/9/2009	30/9/2013 (*)	2ος ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΕ 1.777.378,83	1.683.695,34	95%	Εκκρεμεί εκτέλεση ειδικής διαταγής.	ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΑΜΑΡΙΟΥ	Ε.Π.Ε.Π.	10/7/2008	31/12/2013	ΣΥΜΒΑΣΗ 5.821.598,43	3.106.266,27	53%	Παρουσιάζει καθυστερήσεις λόγω αναδόχου	ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5	ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	Ε.Π.Ε.Π.	22/10/2012	22/10/2015	ΣΥΜΒΑΣΗ 56.905.665,56	2.367.104,38	4%	Έναρξη εργασιών	ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
6	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΑΛΙΩΝ	Ε.Π.Ε.Π.	29/11/2012	29/5/2014	ΣΥΜΒΑΣΗ 6.620.350,08	2.896.119,92	44%		ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
7	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤ.ΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 6 ΥΦ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ	ΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	21/11/2008	11/12/2013	2ος ΑΠΕ 4.023.000,00	3.543.300,01	88%	Εκτέλεση συμπλ. εργασιών εκτός οδοστρώματος (αντιστήριξη γέφ Πετρέ) & αρμοί Καρτερό, Παντάνασσας, Παλαϊοκάστρο, Πετρέ	ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
8	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β' ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ.	Ε.Π.	2/2/2010	30/6/2013	ΣΥΜΒΑΣΗ 2.472.063,87	2.233.240,00	90%	Εκκρεμεί αίτημα παράτασης. Άδεια εκτέλεσης εργασιών από Τροχαία ΒΟΑΚ	ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΑΜΠΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ	Τ.Ε.Ο. Α.Ε.		31/12/2013	ΣΥΜΒΑΣΗ 40.000,00	0,00	0%	Εκκρεμεί αίτημα παράτασης. Άδεια εκτέλεσης εργασιών από Τροχαία ΒΟΑΚ	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΠΙΣΤΩΤΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ									
1	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ - ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΚΑΣΤΕΛΙ (Β' ΦΑΣΗ)	Ε.Π.Ε.Π.	27/10/2005	ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΕΚΠΙΣΤΩΤΗ (Απ.4137/22-10-2010)	2ος ΑΠΕ 3.474.066,05		65%	Οριστικοποίηση της έκτασης. Εκκρεμεί η περαίωση του ισόπεδου κόμβου τέλους του συνδεδηγμένου δρόμου Γαλατάς - Π.Ε.Ο. & παράλληλοι δρόμοι στο Κολυμπάρι.	ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
2	ΑΥΧΗΝ ΑΓΚΑΘΙΑΣ - ΧΑΜΕΖΙ	Ε.Π.Ε.Π.	13/3/2006	ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΕΚΠΙΣΤΩΤΗ (Απ.4126/22-10-2010)	ΣΥΜΒΑΣΗ 19.454.155,68		77%	Οριστικοποίηση της έκτασης. Παρατηρήθηκε μεγάλη αδυναμία του αναδόχου για την εγκαρην ολοκλήρωση των εργασιών. Υπολείπεται το 25% κατασκευής της κοιλαδογέφυρας και το 15% της οδοποιίας.	ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΕΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜ. ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΕΡΑΙΩΣΗ	ΤΕΛΕΥΤ. ΕΓΚ. ΑΠΕ (ΕΥΡΩ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
-----	-----------------	------------------------	--------------------------	----------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------	----------

ΚΑΘΕΤΟΣ - ΝΟΤΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ (Ν.Ο.Α.Κ.) ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σύνολο	Ε.Π.Ε.Π.	14/2/2007	28/2/2014	ΣΥΜΒΑΣΗ	39.118.239,63	37.853.267,16	97%	Το έργο είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Εκτελούνται ασφαλιστικές εργασίες. Υλοποιήθηκε η μεταφορά αρχαίων ευρημάτων.	ΣΕΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
			2/10/2009	28/2/2014	ΣΥΜΒΑΣΗ	16.214.036,95	15.862.687,51	98%		
			14/2/2013	28/2/2014	ΣΥΜΒΑΣΗ	3.076.775,80	3.058.500,00	99%		
					ΣΥΜΒΑΣΗ	58.409.052,38	56.774.454,67	97%		
					ΣΥΜΒΑΣΗ					
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ- ΑΠΟΜΑΡΜΑ (Ν.Ο.Α.Κ.) ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σύνολο	Ε.Π.Ε.Π.	16/1/2008	16/4/2014	ΣΥΜΒΑΣΗ	45.454.082,42	38.349.624,42	84%	Απόρριψη της 2ης Σ.Σ. (καταλοθήσεις [B14 & B28]) από Α.Α.Σ. & Π. Έλεγχος δημοκράτησης νέου έργου. Απαιτείται συμπληρωματική κατασκευή η οποία είναι σε εξέλιξη.	ΣΕΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
			19/2/2010	16/4/2014	ΣΥΜΒΑΣΗ	17.381.406,58	16.340.301,04	94%		
					ΣΥΜΒΑΣΗ	62.835.489,00	54.689.925,46	87%		
					ΣΥΜΒΑΣΗ					
3	ΠΑΡΑΚΑΜΠΗ ΒΙΑΝΝΟΥ	Ε.Π.Ε.Π.	9/1/2012	9/1/2014	ΣΥΜΒΑΣΗ	9.861.399,49	3.490.100,00	35%	Εκτελείται με κανονικούς ρυθμούς. Προβλήματα με αρχαιολογικά ευρήματα.	ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ηράκλειο 31-12-2013

Γιώργος Αναπάκης
 Διευθ. ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ


Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜ. ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΕΡΑΙΩΣΗ	ΤΕΛΕΥΤ. ΕΓΚ. ΑΠΕ (ΕΥΡΩ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΛΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ							
1	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΛΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ.	Ε.Π.Ε.Π.	28/9/2009	Σεπτέμβριος 2013	ΣΥΜΒΑΣΗ 1.777.378,83	95	Παραδόθηκε σε χρήση.
2	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤ. ΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 6 ΥΦ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ	ΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	21/11/2008	Νοέμβριος 2013	ΣΥΜΒΑΣΗ 3.881.475,25	88	Παραδόθηκε σε χρήση.
3	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β' ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ.	Ε.Π.	2/2/2010	Δεκέμβριος 2013	ΣΥΜΒΑΣΗ 2.472.063,87	100	Παραδόθηκε σε χρήση.

ΚΑΘΕΤΟΣ - ΝΟΤΙΟΣ ΟΛΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ							
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ (Ν.Ο.Α.Κ.)	Ε.Π.Ε.Π.	14/2/2007	Οκτώβριος 2013	ΣΥΜΒΑΣΗ 38.409.609,56 & ΙΣ.Σ. 16.116.004,25	97,00	Προς ολοκλήρωση.

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΕΩΣ 31/12/2013

1	ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	30/6/2005	Ιούλιος 2013	41.312.980,00	100,00	Ολοκληρωμένο.
2	ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΠΔΕ	21/5/2008	Ιούλιος 2013	9.130.456,32	96,00	Ολοκληρωμένη η κατασκευή του - Εκκρεμεί η ζήτησις Λειτουργία του.

Ηράκλειο 31-12-2013

Γιώργος Ανατάκης
Δ/ντής ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗ/ΖΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΕΥΤ. ΕΓΚ. ΑΠΕ (ΕΥΡΩ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ	Ε.Π.Ε.Π.	8/10/2007	8/11/2010	ΣΥΜΒΑΣΗ 6.355.057,32	100	Ολοκληρώθηκε και έχει παραδοθεί σε χρήση.	Οριστική Παραλαβή
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Ε.Π.Ε.Π.	8/10/2007	8/12/2010	1ος ΑΠΕ 550.800,01	100	Ολοκληρώθηκε	Οριστική παραλαβή
3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ	Ε.Π.Ε.Π.	29/7/2008	29/9/2010	1ος ΑΠΕ 542.969,46	100	Ολοκληρώθηκε	Οριστική παραλαβή
4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Ε.Π.Ε.Π.	8/10/2007	30/12/2011	ΣΥΜΒΑΣΗ 510.400,00	100	Ολοκληρώθηκε	Προσωρινή παραλαβή
5	Β' ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α/Κ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - Κ.Τ.Ε.Ο.	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	30/3/2007	31/12/2010	1ος ΑΠΕ 10.063.509,18	100	Ολοκληρώθηκε και έχει παραδοθεί σε χρήση.	Οριστική παραλαβή του έργου.
6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΛΙΔΑ - ΜΑΛΛΙΑ	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	21/9/2005	30/4/2012	2ος ΑΠΕ 11.299.239,54	100	Ολοκληρώθηκε και έχει παραδοθεί σε χρήση.	Οριστική παραλαβή του έργου.
7	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ	Ε.Π.	11/4/2004	31/12/2011	2ος ΑΠΕ 1.770.258,18	100	Ολοκληρώθηκε και έχει παραδοθεί σε χρήση.	Σε προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου.

Ηράκλειο 10-11-2012


Γιώργος Αγαπάκης
Διευτής ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ

ΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β.Ο.Α.Κ. - Ν.Ο.Α.Κ. ΣΤΟ ΕΣΠΑ^(*)
(σε εκατομμύρια Ευρώ)

α/α	Έργα - γέφυρες			Έργα από Ε.Π.	Νέα Έργα (συμβασιολογημένα) (ΣΕΣ, ΠΕΠ, ΕΣΠΑ)	Υπό δημοπρ/σ η έργα	Γενικό Σύνολο
	Επιλέξιμες δαπάνες	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Σύνολο				
Β.Ο.Α.Κ.	91,7	13,4	105,1	7,7	97,3	87,0	297,1
Ν.Ο.Α.Κ.	97,2	36,0	133,2	0,0	13,0	47,0	146,2
Μερικά σύνολα	123,2	48,7	238,3	7,7	110,3	134,0	490,3

(*) Με βάση τα μέχρι σήμερα τεχνικά δελτία των έργων.

Ηράκλειο 31-12-2012

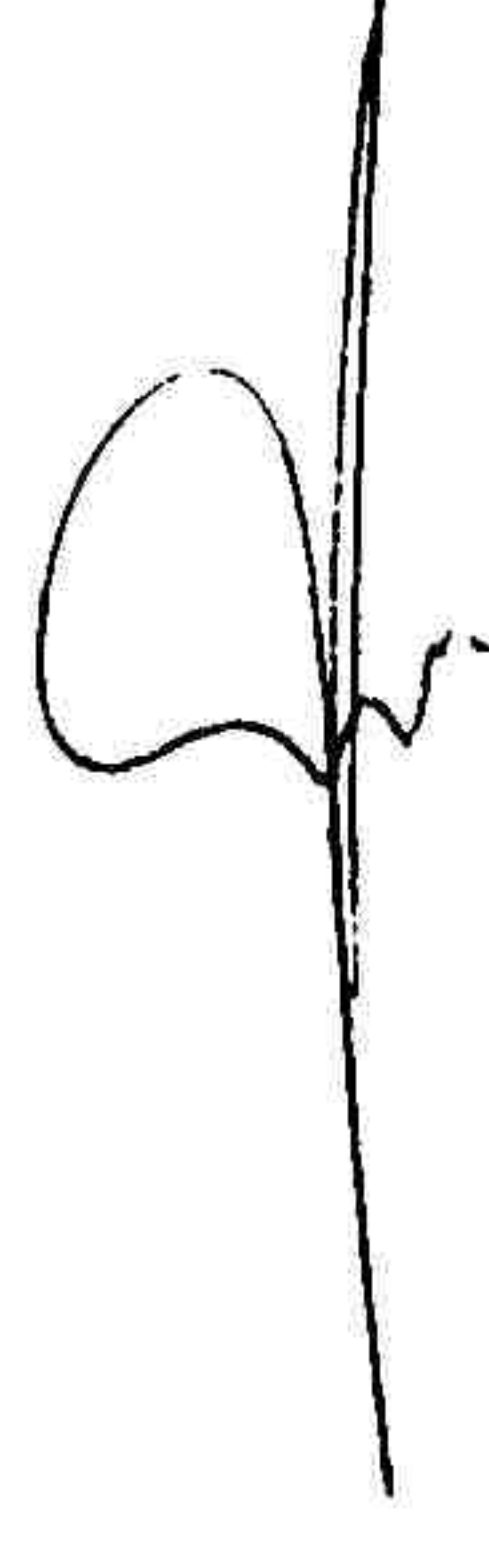

Ιωργος Αγαπακης
Διευτής ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ



Α/Α	Αριθμός Υποέργου	Υποέργο	ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		Πληρωθέν Ποσό (€)	Υπόλοιπο Συμβατικού Ποσού	Υπόλοιπο από αρχικό προϋπολογισμό προς μεταφορά
			Αριθμός Απόφασης Διάθεσης Πίστωσης	Ποσό (€)	Σύμβαση / ΑΠΕ	Ποσό (€)			
2010ΣΕ07180009	Υποέργο 1	Εργασίες πρασίνου στο Ν. Λασιθίου του Β.Ο.Α.Κ.	Δ1/ο/2709/28_08_2008	880.000,00 €	Δ1/483/24-5-2012 (2ος ΑΠΕ)	423.963,55 €	419.559,01 €	4.404,54 €	460.440,99 €
	Υποέργο 2	Εργασίες πρασίνου στο Ν. Χανίων του Β.Ο.Α.Κ.	Δ1β/ο/2710/28-8-2006	1.090.000,00 €	Δ1/1546/2-8-2011 (1ος ΑΠΕ)	575.611,83 €	565.493,04 €	10.118,79 €	524.506,96 €
	Υποέργο 3	Συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα Γαλατάς - Κολυμπάρι - Καστέλλι (Β' φάση)	Δ1β/ο/690/27_10_2005	8.850.000,00 €	Δ1/ο/6/40/09_06_2005	4.680.258,53 €	3.082.542,13 €	1.597.716,40 €	5.767.457,87 €
	Υποέργο 4	Εργασίες πρασίνου στον Ν. Ηρακλείου του Β.Ο.Α.Κ.	Δ1β/ο/2708/28_08_2006	1.020.000,00 €	Δ1/1358/5-11-2013 (3ος ΑΠΕ)	557.382,37 €	556.410,73 €	971,64 €	463.589,27 €
	Υποέργο 5	Κατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδεδεμένων Οδών	Δ1β/ο/1467/17_05_2006	8.070.000,00 €	Δ1/3315/16_11_2011 (3ος ΑΠΕ)	6.589.155,59 €	6.588.312,33 €	843,26 €	1.481.687,67 €
	Υποέργο 6	Κατασκευή τμήματος από Μάλια έως όρια Ν. Ηρακλείου / Ν. Λασιθίου	Δ1β/ο/1466/17_05_2006	15.900.000,00 €	Δ1/ο/4808/11_12_2013 (4ος ΑΠΕ)	12.731.385,65 €	12.721.169,09 €	10.216,56 €	3.178.830,91 €
	Υποέργο 7	Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς - Χαμέζ και ολοκλήρωση στο τμήμα Χαμέζ - Σητεία (από Χ.Θ. 3+473 έως Χ.Θ. 4+200)	Δ1β/ο/1/41/13_06_2003	22.010.271,00 €	Δ1/0/3929/2-10-2009	19.454.155,68 €	14.900.511,14 €	4.553.644,54 €	7.109.759,86 €
	Υποέργο 8	Κατασκευή Α/Κ Αμρίου της παράκμησης Ρεθύμνου	Δ1/2340/2_10_2009	5.638.293,17 €	Δ1/2538/8_08_2013 (2ος ΑΠΕ)	5.821.598,43 €	3.106.272,91 €	2.715.325,52 €	2.532.020,26 €
	Υποέργο 9	Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος Ν.Ε.Ο., Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό του Β.Ο.Α.Κ.	Δ1/2867/10_12_2008	54.000.000,00 €	Δ1/2221/29-7-2013 (3ος ΑΠΕ)	38.839.401,88 €	30.425.113,29 €	8.414.288,59 €	23.574.886,71 €
	Υποέργο 10	Τεχνική βοήθεια στο Β.Ο.Α.Κ. (Σύμβουλος Διαχείρισης)				260.730,13	260.730,13	- €	- €
	Υποέργο 11	Μεταποτίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. στο Β.Ο.Α.Κ.		2.500.000,00 €		2.768.792,74 €	340.252,91 €	2.428.539,83 €	2.159.747,09 €
	Υποέργο 12	Απαλλοτριώσεις του Β.Ο.Α.Κ.		20.000.000,00 €		20.000.000,00 €	7.856.703,46 €	12.143.296,54 €	12.143.296,54 €
	Υποέργο 13	Δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών στο Β.Ο.Α.Κ.		80.000,00 €		80.000,00 €	5.531,30 €	74.468,70 €	74.468,70 €
	Υποέργο 14	1η ΣΣΕ κατασκευής του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς - Χαμέζ και ολοκλήρωση στο τμήμα Χαμέζ - Σητεία (από Χ.Θ. 3+473 έως Χ.Θ. 4+200)						- €	- €
	Υποέργο 15	Τεχνική βοήθεια στο Β.Ο.Α.Κ. (Νέος Σύμβουλος Διαχείρισης)	Δ1/1281/26_04_2011	972.000,00 €	Σύμβαση	773.747,49 €	259.183,73 €	514.563,76 €	712.816,27 €
	Υποέργο 16	Ολοκλήρωση τμήματος Αυχίν Αγκαθιά - Χαμέζ - Σητεία μήκος 3,8 χλμ. Περίπου	Δ1/ο/307/25_01_2013	10.500.000,00 €	Σύμβαση	8.274.816,13 €	- €	8.274.816,13 €	10.500.000,00 €
	Υποέργο 17	Ολοκλήρωση Β' φάσης παράλληλων έργων Γαλατάς - Κολυμπάρι - Καστέλλι	Δ1/οικ/594/13-2-2013	3.000.000,00 €	Σύμβαση	1.928.670,92 €	- €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2010ΣΕ07180009								73.683.509,10 €	



Α/Α	Αριθμός Υποέργου	Υποέργο	ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΝΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		Πληρωθέν Ποσό (€)	Υπόλοιπο Συμβατικού Ποσού	Υπόλοιπο από αρχικό προϋπολογισμό προς μεταφορά
			Αριθμός Απόφασης Διάθεσης Πίστωσης	Ποσό (€)	Συμβαση / ΑΠΕ	Ποσό (€)			
2010ΣΕ07180010	Υποέργο 1	Ολοκλήρωση της κατασκευής οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 - Χ.Θ. 29+990)	Δ1/ο/608/21_02_07	54.500.000,00 €	Δ1/4409/22-11-2013 4ος ΑΠΕ	41.678.644,34 €	38.349.624,41€	3.329.019,93€	16.150.375,59 €
	Υποέργο 2	Ολοκλήρωση της κατασκευής οδού Απομαρμά - Άγιοι Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 29+990 - Χ.Θ. 37+900)	Δ1/β/ο/2711/28_08_2006	49.000.000,00 €	Δ1/2292/20-6-2013 5ος ΑΠΕ	39.118.239,63 €	37.853.262,18€	1.264.977,45€	11.146.737,82 €
	Υποέργο 3	Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. συνολικού έργου.		1.857.049,53 €		1.857.049,53 €	10.388,96€	1.846.660,57 €	1.846.660,57 €
	Υποέργο 4	Απαλλοτριώσεις συνολικού έργου.		13.255.082,37 €		13.255.082,37 €	5.357.877,67 €	7.897.204,70 €	7.897.204,70 €
	Υποέργο 5	Δαπάνες Αρχαιολογικών ερευνών.		100.000,00€				100.000,00 €	100.000,00 €
	Υποέργο 8	2η ΣΣΕ για την κατασκευή οδού Απομαρμά - Άγιοι Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 29+990 - Χ.Θ. 37+900)	Δ1/οικ/3092/13_09_2012	2.900.000,00 €	Δ1/2292/20-6-2013 5ος ΑΠΕ ΚΑΙ 1η τροφ/ση της 2ης Σ.Σ.	3.076.775,80 €	3.058.500,00€	18.275,80€	18.275,80 €
	Υποέργο 9	2η ΣΣΕ για την κατασκευή οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 - Χ.Θ. 29+990)							- €
	Υποέργο 10	Ολοκλήρωση της κατασκευής οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά. Τμήμα Αγ. Βαρβάρα - Πανασός		47.500.000,00€				47.500.000,00€	4.750.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΑΡΙΣΜΟΥ 2010ΣΕ07180010								41.909.254,48 €
2011ΣΕ07120012	Υποέργο 6	1η ΣΣΕ για την κατασκευή οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 - Χ.Θ. 29+990)	Δ1/3540/2_10_2009	19.000.000,00 €	Δ1/4409/22-11-2013 4ος ΑΠΕ Κ.Σ. ΚΑΙ 3η τροφ/ση Σ.Σ.	17.049.650,41 €	16.340.301,02€	709.349,39€	2.659.698,98 €
	Υποέργο 7	Ολοκλήρωση 1ης ΣΣΕ για την κατασκευή οδού Απομαρμά - Άγιοι Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 29+990 - Χ.Θ. 37+900)	Δ1/3067/28_08_2010	15.800.000,00 €	Δ1/2292/20-6-2013 5ος ΑΠΕ και 3η τροφ/ση της 1ης Σ.Σ.	16.214.036,95 €	15.862.687,51€	351.349,44€	351.349,44€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΑΡΙΣΜΟΥ 2011ΣΕ07120012									3.011.048,42 €

Α/Α	Αριθμός Υποέργου	Υποέργο	ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΝΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		Πληρωθέν Ποσό (€)	Υπόλοιπο Συμβατικού Ποσού	Υπόλοιπο από αρχικό προϋπολογισμό προς μεταφορά
			Αριθμός Απόφασης Διάθεσης Πίστωσης	Ποσό (€)	Συμβαση / ΑΠΕ	Ποσό (€)			
2011ΣΕ07180006	Υποέργο 1	Γούρνες - Χερσόνησος	Δ1/2308/5_09_2011	65.000.000,00 €	Συμβαση	56.905.665,56 €	2.367.104,38 €	54.538.561,18 €	62.632.895,62 €
	Υποέργο 2	Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.		2.500.000,00 €		2.500.000,00 €	290.048,45 €	2.209.951,55 €	2.209.951,55 €
	Υποέργο 3	Απαλλοτριώσεις		15.000.000,00 €		15.000.000,00 €	386.619,49€	14.613.380,51€	14.613.380,51 €
	Υποέργο 4	Συμπληρωματικές Μελέτες του τμήματος Γούρνες - Χερσόνησος		1.501.000,00 €		1.501.000,00 €	- €	1.501.000,00€	1.501.000,00 €
	Υποέργο 5	Αρχαιολογικές έρευνες		500.000,00 €		500.000,00 €	- €	500.000,00€	500.000,00 €
	Υποέργο 6	Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο "Τμήμα Γούρνες - Χερσόνησος"		877.877,28 €		748.483,86€	748.483,86€	129.393,42€	129.393,42 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΑΡΙΣΜΟΥ 2011ΣΕ07180006									81.586.621,10 €
2013ΣΕ07120002	Υποέργο 6	Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο "Τμήμα Γούρνες - Χερσόνησος"		129.393,42 €		129.393,42€	63.466,14€	65.927,28€	65.927,28 €
	Υποέργο 7	Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο "Τμήμα Γούρνες - Χερσόνησος"		336.500,00 €		336.500,00€	- €	336.500,00€	336.500,00 €

Α/Α	Αριθμός Υποέργου	Υποέργο	ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		Πληρωθέν Ποσό (€)	Υπόλοιπο Συμβατικού Ποσού	Υπόλοιπο από αρχικό προϋπολογισμό προς μεταφορά
			Αριθμός Απόφασης Διάθεσης Πίστωσης	Ποσό (€)	Συμβαση / ΑΠΕ	Ποσό (€)			
1	Υποέργο 1	Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του Β.Ο.Α.Κ.	Δ1268/10_12_2008	2.600.000,00 €	Δ1/2086/19_06_2013	1.777.378,83 €	1.683.695,38 €	93.683,45 €	916.304,62 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΑΡΙΣΜΟΥ 2012ΣΕ07180009							916.304,62 €		

Α/Α	Αριθμός Υποέργου	Υποέργο	ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		Πληρωθέν Ποσό (€)	Υπόλοιπο Συμβατικού Ποσού	Υπόλοιπο από αρχικό προϋπολογισμό προς μεταφορά
			Αριθμός Απόφασης Διάθεσης Πίστωσης	Ποσό (€)	Συμβαση / ΑΠΕ	Ποσό (€)			
2011ΣΕ07180000	Υποέργο 1	Κατασκευή τμήματος παράκαμψης Άνω Βιάννου - Απομαρμό (χ.θ. 22+170 - χ.θ. 29+990)	Δ1/358/15_03_2011	11.500.000,00 €	Δ1/1927/12_06_2013 (2ος ΑΠΕ)	9.861.399,49 €	3.490.100,00 €	6.371.299,49 €	8.009.900,00 €
	Υποέργο 2	Απαλλοτριώσεις στο τμήμα παράκαμψης Άνω Βιάννου		1.300.000,00 €			1.228.067,65 €	71.932,35 €	71.932,35 €
	Υποέργο 3	Εργασίες αποκατάστασης Δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας στη παράκαμψη Άνω Βιάννου		200.000,00 €			48.243,48 €	151.756,52 €	151.756,52 €
	Υποέργο 4	Αρχαιολογικές εργασίες στο τμήμα παράκαμψης Άνω Βιάννου		100.000,00 €			37.579,65 €	62.420,35 €	62.420,35 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΑΡΙΣΜΟΥ 2011ΣΕ07180000							8.296.009,22 €		

Α/Α	Αριθμός Υποέργου	Υποέργο	ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ		Πληρωθέν Ποσό (€)	Υπόλοιπο Συμβατικού Ποσού	Υπόλοιπο από αρχικό προϋπολογισμό προς μεταφορά
			Αριθμός Απόφασης Διάθεσης Πίστωσης	Ποσό (€)	Συμβαση / ΑΠΕ	Ποσό (€)			
2011ΣΕ07180021	Υποέργο 1	Ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλίων	Δ1/4110/17_1_2012	7.500.000,00 €	Δ1/2207/20_06_2013 (1ος ΑΠΕ)	6.620.350,08 €	2.896.319,92 €	3.724.030,16 €	4.603.680,08 €
	Υποέργο 2	Μελέτες για τη σύνδεση Β.Ο.Α.Κ. στην περιοχή των Μαλίων με την Παλαιά Εθνική Οδό		500.000,00 €					500.000,00 €
	Υποέργο 3	Μεταποσίες Δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας για την ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλίων		200.000,00 €					200.000,00 €
	Υποέργο 4	Απαλλοτριώσεις για την ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλίων		2.000.000,00 €					2.000.000,00 €
	Υποέργο 5	Αρχαιολογικές έρευνες για την ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλίων		50.000,00 €					50.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΑΡΙΣΜΟΥ 2011ΣΕ07180021							7.353.680,08 €		
