



07 ΙΑΝ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 295

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Θάλεια Παράσχη
Τηλέφωνο : 210 3332061

ΠΡΟΣ :

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
ΚΟΙΝ: - Βουλευτή:
κα Φεβρωνία Πατριανάκου
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 4765/11-12-2013

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κα Φεβρωνία Πατριανάκου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 9994/2104 Α1/0046/27-12-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.

Ο Υπουργός

Κ. Χατζηδάκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ


Γραφ. Υπουργού
Γραφ. Κοιν/κού Ελέγχου

✓
✓
Αρ. σελ. απάντησης (1)
Αρ. σελ. συνημμένων (3)
Συνολικός αρ. σελίδων (4)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

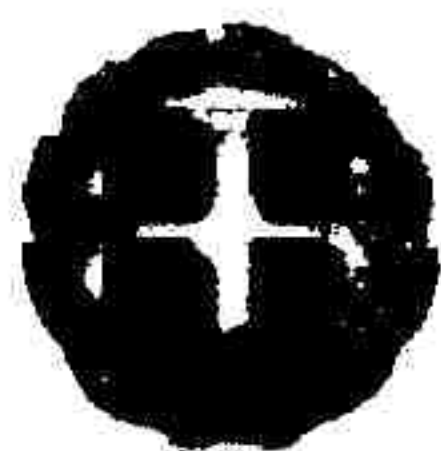

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Ελένη Περογιαννάκη

Τηλ. : 210- 7450849

Fax: 210- 7450847

e - mail : elenpero@mou.gr

Αθήνα, 27/12/2013

Α.Π. 9994/2104 Α1/0046

ΠΡΟΣ:

Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Νίκης 5 – 7

101 80 Αθήνα

Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 4765/11.12.2013 της Βουλευτού Λακωνίας κας Φεβρωνίας Πατριανάκου προς τους Υπουργούς Τουρισμού - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Οικονομικών – Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4765/11.12.2013 της Βουλευτού Λακωνίας κας Φεβρωνίας Πατριανάκου προς τους Υπουργούς Τουρισμού - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Οικονομικών – Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα : «Καθυστερήσεις στο έργο Αποκατάστασης και Ανάδειξης των Σπηλαίων και Εγκαταστάσεων Διρού Λακωνίας και προβλήματα επισκεψιμότητάς τους» και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής, συμπληρωματικά προς την απάντηση μας με Α.Π. 3164/784 Α1/0046/15-05-2013 και με επικαιροποίηση των ζητούμενων στοιχείων :

Το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των Κτηριακών Εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ II) με την με Α.Π. 2355/667/Α2/04.05.2012 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα με δικαιούχο την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 10,3 εκ. ευρώ, που συγχρηματοδοτείται κατά 85 % από το ΕΤΠΑ.

Το έργο θα υλοποιηθεί με την εκτέλεση τριών επιμέρους υποέργων:



Το υποέργο 1 «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των σπηλαίων και των κτιριακών εγκαταστάσεων Διρού Νομού Λακωνίας» περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης του λιμναίου σπηλαίου της Βλυχάδας, σήμερα μόνου επισκέψιμου, και εκπόνηση μελετών και εκτέλεση εργασιών για την προστασία και διαμόρφωση του κλειστού έως τώρα στο κοινό σπηλαίου Αλεπότρυπας, ώστε να καταστεί επισκέψιμο. Επίσης θα συνταχθεί μουσειακή μελέτη για την έκθεση των νεολιθικών ευρημάτων της Αλεπότρυπας στο σχεδιαζόμενο να κατασκευαστεί Μουσείο (υποέργο 3).

Το υποέργο 2 «Ολοκλήρωση μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού συγκροτήματος και περιβάλλοντος χώρου σπηλαίων Διρού και για την ανέγερση Μουσείου» περιλαμβάνει την ανάθεση σε ανάδοχο της εκπόνησης πλήρους μελέτης (προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης και φάκελος οικοδομικής άδειας) για την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηριακού συγκροτήματος και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την ανέγερση Μουσείου νεολιθικών ευρημάτων.

Το υποέργο 3 «Αποκατάσταση και αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων σπηλαίων Διρού» αφορά τις κατασκευαστικές και μηχανολογικές εργασίες που θα εκτελεσθούν από ανάδοχο που θα προκύψει από διαγωνιστική διαδικασία, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στην πλήρη μελέτη που προβλέπεται στο πλαίσιο του υποέργου 2.

Ως προς το ερώτημα 4 : Η μέχρι σήμερα εξέλιξη του συνολικού έργου θεωρείται ικανοποιητική και ειδικότερα από 17/5/2013 και ανά υποέργο σημειώνεται αξιοσημείωτη πρόοδος :

Το υποέργο 1 υλοποιείται με αυτεπιστασία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας (ΕΠΣΝΕ), κατόπιν σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας με τον δικαιούχο ΕΤΑΔ Α.Ε. της 27/6/2012. Από την έναρξη της υλοποίησης του εκτελείται κανονικά το επιστημονικό – ερευνητικό τμήμα του υποέργου. Παράλληλα είναι σε διαφορετικό στάδιο εξέλιξης οι απαιτούμενοι διαγωνισμοί για τις ΗΜ εγκαταστάσεις στα δύο σπήλαια, αποκατάσταση δαπέδων διαδρομής επισκεπτών και για την προμήθεια ειδικού χημικού σκευάσματος για καθαρισμό του ασβεστολίθου από τις επιφάνειες.

Η ολοκλήρωση του υποέργου εξαρτάται και από την εξέλιξη του υποέργου 3, ως προς το μέρος που αφορά στην προβλεπόμενη μουσειακή μελέτη.

Στο πλαίσιο του υποέργου 2 έχει παραληφθεί η οριστική μελέτη για την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηριακού συγκροτήματος και περιβάλλοντος χώρου σπηλαίων Διρού και για την ανέγερση μουσείου. Στη συνέχεια, και μετά την έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία



του ΥΠΠΟ, ο ανάδοχος προβλέπεται να εκδώσει τις απαιτούμενες άδειες και να συντάξει τα τεύχη για τη δημοπράτηση του έργου (έως τον Μάρτιο 2014).

Το υποέργο 3 θα προκηρυχθεί μετά την παραλαβή των τευχών για την δημοπράτηση του, που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο του υποέργου 2.

Ως προς το ερώτημα 5 : το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων του έργου παραμένει στο ύψος των 1.738.395 ευρώ (16,88% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου). Οι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα του ΕΣΠΑ δαπάνες ανέρχονται σε 189.508,21 ευρώ (ποσοστό 1,84%) έναντι 19.082 ευρώ και ποσοστού 0,19% του συνολικού προϋπολογισμού στις 17/4/2013.

Ως προς το ερώτημα 6 : έχει επιλυθεί το οριζόντιο θέμα της δυνατότητας πρόσληψης από τη ΓΓ Πολιτισμού επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού με σύμβαση, το οποίο προκάλεσε μικρή καθυστέρηση στην εξέλιξη του υποέργου 1.

Επίσης η σχετική καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του υποέργου 2, οφειλόμενη στο μεγάλο αριθμό προτάσεων υποψηφίων αναδόχων προς αξιολόγηση (23 σχήματα) και την εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν, δε φαίνεται να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην συνολική υλοποίηση, λόγω ομαλής εξέλιξης της σύμβασης.

Ως προς το ερώτημα 7 :

Με βάση την απόφαση ένταξης, το εγκεκριμένο (και αρχικό) χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του συνολικού έργου έχει διάρκεια 43,55 μηνών (30/4/2012 έως 15/12/2015). Όπως προκύπτει από την πορεία υλοποίησης, το υποέργο 3 εκτιμάται ότι θα προκηρυχθεί τον Απρίλιο 2014, και με την προϋπόθεση αυτή η δυνατότητα ολοκλήρωσής του εντός της προγραμματικής περιόδου αυτή τη στιγμή θεωρείται ρεαλιστική, δεδομένης και της υφιστάμενης νομοθετικής ρύθμισης για τα έργα ΕΣΠΑ, με την οποία είναι δυνατόν να επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή η σύμπτυξη των σταδίων αξιολόγησης ενός δημόσιου διαγωνισμού .

Εντούτοις, σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου προκύψει διοικητικής/δικαστικής ή τεχνικής φύσης καθυστέρηση ή εμπλοκή, είναι δυνατή, με βάση τις κατευθύνσεις σχετικών οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων –ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με το δικαιούχο, η διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της ολοκλήρωσής του έργου με πόρους του νέου ΕΣΠΑ από το 2014.



Ο Γενικός Γραμματέας

Δημοσίων Επενδύσεων –ΕΣΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Γιαννούσης
