


03 ΟΚΤ. 2013

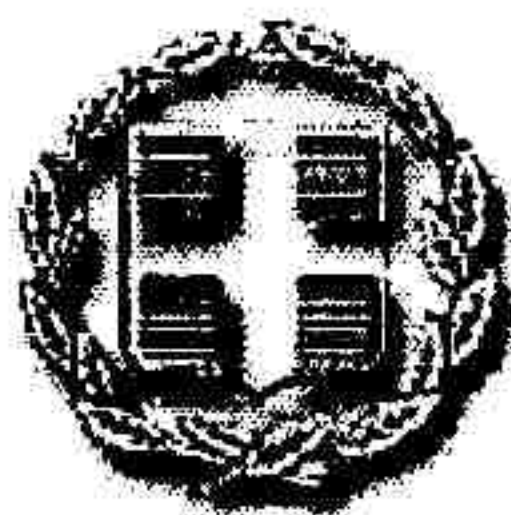

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17  
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα  
Τηλέφωνο : 2132161429  
Fax : 2105237254  
Πληροφορίες :  
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 27/9/2013.

Αρ. Πρωτ.: 81489

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 1097/29-8-2013 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Η. Παναγιώταρο, σχετικά με την αποπεράτωση του στο ΓΝ Χίου «Σκυλίτσειο», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, σύμφωνα με την Υ4β/ΓΠ 98716/Φ22, Φ14-21/συσχ. ΓΠ 99908/31.10.02 Υπουργική Απόφαση, με προϋπολογισμό 16.740.000€ και κατασκευάζεται από την Κ/ξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - SOCIETE FRANCAISE D' EQUIPEMENT HOSPITALIER S.A., σύμφωνα με την από 19.09.03 Σύμβαση και συνολική διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες, ήτοι μέχρι 19.09.06. Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 16.418.098 € συμπερ. απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ. Έχουν υπογραφεί δύο συμπληρωματικές συμβάσεις και ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε σε 25.085.342,23 €.

Το έργο είχε ενταχθεί και συγχρηματοδοτείτο από το Γ' ΚΠΣ και στη συνέχεια ως έργο -γέφυρα από το ΕΣΠΑ.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προσθήκη κατ' επέκταση του παλαιού Νοσοκομείου νέας πτέρυγας (κτίρια 13, 13α και 4), εμβαδού 8.000 τ.μ. Το νέο αυτό κτίριο φιλοξενεί τις κυριότερες λειτουργίες του Νοσοκομείου, καθώς περιλαμβάνει Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Εργαστηριακά Τμήματα Βιολογικών Υλικών και Τμήμα Απεικονίσεων, Σηπτικό Χειρουργείο και Ενδοσκοπήσεις, Χειρουργεία, Κεντρική Αποστείρωση, νέα Μαγειρεία και Φαρμακείο. Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων του Νοσοκομείου, τμήματα 2,3,4, 5, 5α, 6,7, καθώς και τμήμα του 1 και του 11, εμβαδού 8.200 τ.μ.

Με την έναρξη των εργασιών το Σεπτέμβριο 2003, λόγω του εντοπισμού αρχαιοτήτων στο χώρο ανέγερσης της νέας πτέρυγας, χρειάστηκε, ευθύς εξ αρχής, να σταματήσουν οι εργασίες προκειμένου να διεξαχθεί η απαραίτητη αρχαιολογική έρευνα. Μετά το πέρας της έρευνας αυτής η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία απαίτησε την προστασία με κατάχωση των ευρημάτων, διαδικασία που απαίτησε με τη σειρά της αλλαγή θεμελίωσης από συνήθη, σε πασσάλους, με αποτέλεσμα τη χρονική και οικονομική επιβάρυνση του έργου.

Συγκεκριμένα δόθηκε παράταση πέραν των δύο (2) ετών (27 μήνες) και απαιτήθηκε η υπογραφή δύο (2) συμπληρωματικών συμβάσεων για τις απαραίτητες, επί πλέον, μελέτες και νέες εργασίες αρχαιολογίας, ανάδειξη ταφικού συνόλου, νέας θεμελίωσης, καθώς και της αναγκαίας επέκτασης του ενεργειακού κέντρου του Νοσοκομείου.

Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η Νέα Πτέρυγα του Νοσοκομείου (κτίρια 13,13α και 14), καθώς και τα υφιστάμενα κτίρια 6 & 7, (χειρουργικές και παιδιατρικές κλίνες), έχουν παραδοθεί προς χρήση και λειτουργούν.

Σε ότι αφορά τη συνέχιση του έργου, λόγω των ανασκαφικών ερευνών στο έργο και λοιπών οικονομικών προβλημάτων, προκλήθηκε μία πολύχρονη καθυστέρηση, η οποία επί της ουσίας απαιτούσε την επανεξέταση των μελετών δημοπράτησης των υφισταμένων κτιρίων που είχαν συνταχθεί το 2002, σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση των κτιρίων λόγω χρήσης και παλαιότητας, ώστε οι επεμβάσεις που θα γίνουν, να οδηγήσουν στην πλήρη ανακαίνιση αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων νοσηλευτικών υποδομών.

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων και ως εκ τούτου την εμπλοκή με την Αρχαιολογία, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου που περιλαμβάνει την κατάργηση των υπογείων κτιρίων 15 (υπόγειος διάδρομος), 7<sup>Α</sup>, υπόγειου του 11, υπόγειου του 1, προβλέποντας τη σύνδεση με τις Η/Μ εγκαταστάσεις των ενεργειακών κέντρων μέσω του κτιρίου 5<sup>Α</sup> και των ισογείων των κτιρίων και της διαμόρφωσης της υφιστάμενης εσωτερικής αυλής.

Για το λόγο αυτό απαιτείτο, τόσο για τη μεταβατική περίοδο της λειτουργίας του υφιστάμενου Νοσοκομείου, όσο και για την εξυπηρέτηση τμήματος των μόνιμων Η/Μ δικτύων, η κατασκευή καναλιού και δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων (μέρος των οποίων θα καταστούν οριστικά) και προσωρινός διάδρομος διασύνδεσης για τη μεταφορά των ασθενών & προσωπικού από τα κτίρια 1,3,4 & 11.

Ως εκ τούτου, η ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ ενημέρωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σχετικά έγγραφα ΓΑ 127438/15.03.12 και ΓΑ 125921/23.12.11), ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, απαιτούνται και πρόσθετες εργασίες πέραν των συμβατικά προβλεπόμενων, οι οποίες δεν θα μπορούσαν οικονομικά να αντιμετωπισθούν από τον σημερινό προϋπολογισμό των 25,0 εκατομμυρίων ευρώ του έργου.

Βάσει των παραπάνω, με την υπ' αριθμ. Υ4β/Γ.Π.17685/Φ14-121,Φ22/13.03.2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση του έργου με την πλήρη παράδοση και παραλαβή του εκτελεσμένου αντικειμένου που αφορά στη νέα πτέρυγα και στην ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κτιρίων 6 και 7. Στο πλαίσιο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαιώσης του έργου για την ολοκλήρωση των εργασιών στις 31.10.2012.

Τέλος, η ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ προχωρά στη σύνταξη του Τακτοποιητικού ΑΠΕ περιλαμβάνοντας την απομείωση του εναπομένοντος συμβατικού αντικειμένου εκσυγχρονισμού των υπολοίπων υφισταμένων κτιρίων (1,2,3,4 ή 5α και 11) και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Νοσοκομείο και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου θα δρομολογήσει την προετοιμασία νέου έργου (μελέτη, τεύχη δημοπράτησης), προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και στη συνέχεια να δημοπρατηθεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βουλευτή κ. Η. Παναγιώταρο

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1.Γρ.Υπουργού

2.Γρ.Υφυπουργού

3.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομ. Συντ. & Κωδικ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

