


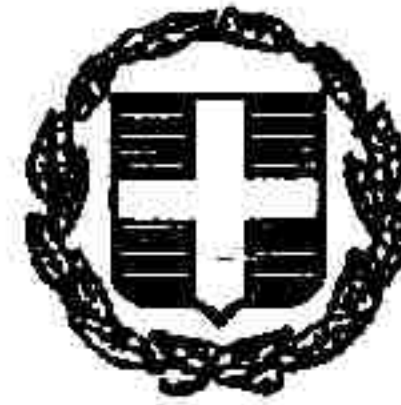

11 Νοε. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 10-11-2014
 Αριθμ. Πρωτ. 381

Προς:

Βουλή των Ελλήνων
 Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
 ✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Πορεία του έργου κατασκευής του Φράγματος Ασωπού στην Κορινθία»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3577/13-10-2014

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές **κ. Χ. Δήμας** και για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σε απάντηση των ερωτημάτων (1) και (2) η πορεία του έργου κατασκευής του Φράγματος του Ασωπού έχει ως εξής:

- Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου έγινε στις 31-10-2008. Με την αριθμ. 12477/20β2/536/13-07-2009 απόφαση του ΥπΑΑΤ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με Ανάδοχο τη μειοδότηρια εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» η οποία υπέγραψε το με αριθμ. πρωτ. 11255/20β2/536/14-7-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό συνολικού ποσού 31.295.593,52€ (ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης 44,65%) και προθεσμία περαίωσης των εργασιών 36 μηνών.

- Με την αριθμ. 14682/20B2/536/20-12-2010 Απόφαση του ΥπΑΑΤ ορίστηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευών, (νυν Δ/ση Τεχνικών Έργων/ Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος), ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία του εν λόγω έργου.

- Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών ορίστηκε η 23-3-2011 και συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου η 23-3-2014 (σχετ. η αριθμ. 7555/20β2/536/23-3-2011 ΥΑ). Με την αριθμ. 2700/94205/20B2/536/21-7-2014 ΥΑ εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι την 31-12-2015.

- Με το με αριθμ. πρωτ. 5341/27-11-2012 έγγραφο προς την Ανάδοχο Εταιρεία, η Δ/νουςα Υπηρεσία αναφέρεται στην πολύμηνη υπολειτουργία του εργοταξίου και στις αποσπασματικές εργασίες που εκτελούνται.

- Με το με αριθμ. πρωτ. 302/7749/20β2/536/21-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών (Προϊσταμένη Αρχή) ζητήθηκε από την Δ/νουςα Υπηρεσία να προχωρήσει ως αρμόδια στην διαδικασία έκπτωσης της Αναδόχου, βάσει του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.

- Με την με αριθμ. 395/25-1-2013 Ειδική Πρόσκληση της, η Δ/νουςα Υπηρεσία κάλεσε την Ανάδοχο εντός τριάντα ημερών να εκτελέσει α) την κατασκευή τμήματος μήκους 50,00 μέτρων του τεχνικού έργου ανοιχτής εκσκαφής εισόδου στη σήραγγα εκτροπής, β) την κατασκευή του πύργου υδροληψίας μέχρι το υψόμετρο + 154,20 μ. και να προχωρήσει στη πλήρη δραστηριοποίηση του εργοταξίου.

• Με την με αριθμ.971/12-3-2013 Απόφαση της, η Δ/νουςα Υπηρεσία κήρυξε έκπιωτη την Ανάδοχο Εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» και της επέδωσε την προαναφερόμενη Απόφαση.

• Με το με αριθμ. πρωτ. 1492/10-4-2013 (α.π. 1653/45955/10-4-2013 Δ.Τ.Μ.Κ.) έγγραφο της Δ/νουςας Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στην Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών, ως Προϊσταμένη Αρχή, η από 28-3-2013 ένσταση της Αναδόχου Εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» κατά της 971/12-3-2013 Απόφασης κήρυξης της ως έκπιωτης της εργολαβίας καθώς και οι απόψεις της Υπηρεσίας αυτής επί της ένστασης.

• Με την με αριθμ. 2208/63548/20Β2/536/27-5-2013 ΥΑ έγινε αποδοχή της από 28-3-2013 ένστασης της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ», αναδόχου του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ασωπού νομού Κορινθίας», κατά της 971/12-3-2013 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κήρυξη έκπιωσης.

• Λόγω της σοβαρής υστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες ο Ανάδοχος επικαλείται τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες, η Δ/νουςα Υπηρεσία επέδωσε την 5/9/14 Ειδική Πρόσκληση επαναδραστηριοποίησης του εργοταξίου με προθεσμία ενός μηνός.

• Με το με αριθμ. πρωτ. 4207/2-10-2014 (α.π. 3639/124240/6-10-2014) έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, διαβιβάστηκε η από 30/9/2014 αίτηση της αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» για την έγκριση σύστασης κοινοπραξίας με την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» για την κατασκευή του έργου με την θετική της εισήγηση.

• Με την αριθμ. 3841/131170/20β2/536/20-10-2014 ΥΑ εγκρίθηκε η ίδρυση Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή φράγματος Ασωπού νομού Κορινθίας».

Σχετικά με το ερώτημα (3) της υπόψη Ερώτησης η καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου και δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικό αίτημα πληρωμής. Πρόσφατα έχει γίνει μερική εξόφληση των οφειλομένων προς τους εργαζομένους, χωρίς όμως να υπάρχει ενημέρωση από αυτούς για την αποπληρωμή ή όχι των δεδουλευμένων τους.

Τέλος αναφέρεται ότι, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει πάλι στα πλαίσια της εγκεκριμένης κοινοπραξίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Χ. Δήμα
