

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ
Βουλευτής Ν. Ζακύνθου - ΠΑΣΟΚ

Αθήνα 26-9-2011


ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους Υπουργούς: α) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
β) Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων
γ) Εσωτερικών

Ο Βουλευτής Ζακύνθου Δημήτρης Βαρβαρίγος κατέθεσε Αναφορά με την οποία ο προϊστάμενος του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ζακύνθου ζητά επίσπευση των εργασιών ανέγερσης, αποκατάστασης, στατικής επάρκειας και επισκευών μεγάλης κλίμακας στο σχολικό συγκρότημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Αγίου Κήρυκου Ζακύνθου.

Ο ΑΝΑΦΕΡΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ

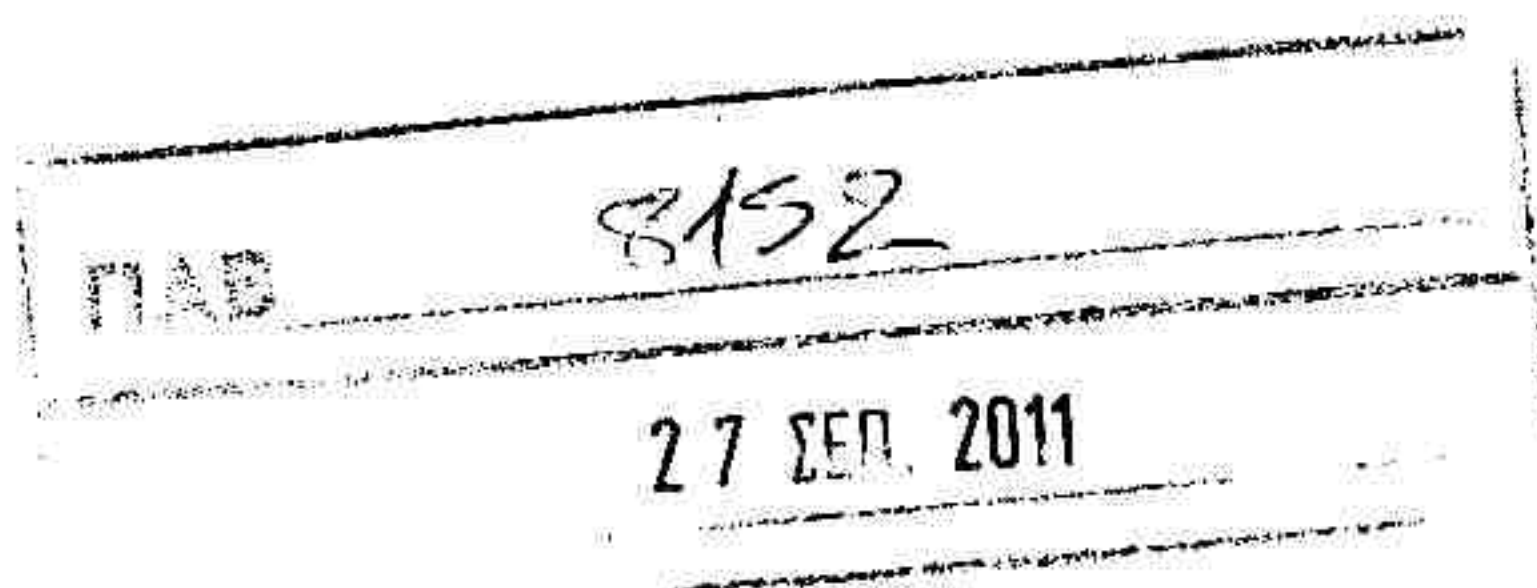



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Βαθμός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί μέχρι :

Ζάκυνθος 16-09-2011

Αριθ. Πρωτ. : 523

ΠΡΟΣ :
κ. Βουλευτή Ζακύνθου
Δημ. Βαρβαρίγο

Ταχ. Δ/ση : Φιλικών 1 Ζάκυνθος
Ταχ. Κώδικας : 29100

ΚΟΙΝ. :

Πληροφορίες : Κεφαλληνός Νικόλαος
Τηλ. & Fax : 26950 29792
Fax : 26950 44552
mail@gree.zak.sch.gr

Συνημμένα :

ΘΕΜΑ : Εργασίες ανέγερσης, αποκατάστασης στατικής επάρκειας και επισκευών μεγάλης κλίμακας στο σχολικό συγκρότημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Αγίου Κηρύκου Ζακύνθου.

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σχετικά με τις εργασίες και εργολαβίες που αφορούν το σχολικό συγκρότημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Αγίου Κηρύκου Ζακύνθου.

1. Η ανέγερση των εργαστηρίων βρίσκεται σε τέτοιο στάδιο ώστε να υπολείπονται μόνο εργασίες που αφορούν ηλεκτρομηχανολογικά, κουφώματα, στέγη και περιβάλλον χώρος.
Μας ανησυχεί το γεγονός ότι σύμφωνα με τις προφορικές διαβεβαιώσεις του εργολάβου δεν έχει αποπληρωθεί αίτημα 70.000 ευρώ συν ένα ποσό ανακεφαλαιωτικό για επιπλέον εργασίες 30.000 ευρώ και πρόθεσή του είναι να διακόψει τις εργασίες με το τέλος της επικόλλησης των πλακιδίων που γίνεται μέχρι και σήμερα.
2. Το έργο της αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Ε είναι σε πλήρη στασιμότητα. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι ο εργολάβος έχει υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα πριν ένα χρόνο με τον οποίο ζητάει επιπλέον 170.000 ευρώ για πρόσθετες εργασίες που φάνηκαν μετά την αποκάλυψη του σκελετού του κτιρίου. Υπάρχει η προφορική συναίνεση από Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ. για το άνω ποσό αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα.
3. Η εργολαβία των επισκευών μεγάλης κλίμακας που έχει δοθεί ήδη σε συγκεκριμένο εργολάβο, μετά τη έκδοση των δύο σχετικών αδειών από τη πολεοδομία Ζακύνθου (η τελευταία στάλθηκε στις 13/9/2011 στον Ο.Σ.Κ.), περιμένουμε να επιταχυνθεί εφ' όσον άμεσα ανταποκριθεί ο Ο.Σ.Κ. ώστε να εγκατασταθεί σύντομα ο ανάδοχος εργολάβος στο χώρο.

Με δεδομένες τις δύσκολες συνθήκες στην εύρεση πόρων, θα θέλαμε την βοήθεια και προσωπική σας παρέμβαση, με όποιο τρόπο μπορείτε προκειμένου το έργο αυτό να μην τελματώσει αλλά να προχωρήσει προς το τέλος του σε λογικά χρονικά όρια.

Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις στο έργο που θα ήταν η αιτία για άλλη μια χρονιά καταλήψεων και πολιτικής εκμετάλλευσης.

