



05 Νοε 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 4/11/ 2010
Αρ.Πρωτ: 3446 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Βουλευτή κ.
Άγγελο Κολοκοτρώνη

Θέμα : « Λίμνη Κορώνεια »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4959/13-10-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4959/13-10-2010** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη, σας διαβιβάζουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας επί του θέματος α) το υπ' αρ. πρωτ. 106206/20-10-2010 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ, β) το υπ' αριθμ. πρωτ. 182772/20-10-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) καθώς και γ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 5332/20-10-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνημμένα:


- Το α.π. 106206/20-10-2010 έγγραφο Ε.Γ.Υ.
- Το α.π. 182772/20-10-2010 έγγραφο (ΕΠΠΕΡΑΑ)
- Το α.π. 5332/20-10-2010 έγγραφο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

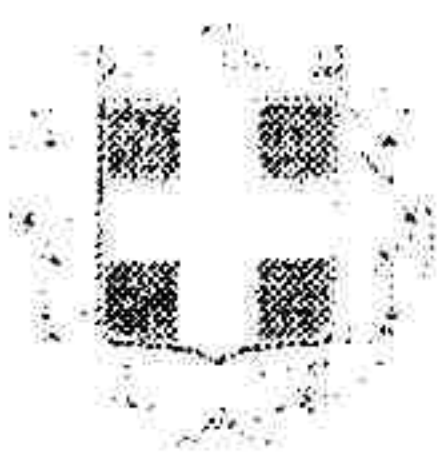

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα
Πληρ.: Χ. Νικολάρου
Τηλ.: 210 6931283
Fax: 210 6994355

Αθήνα, 20-10-2010

Αρ. πρωτ. : 106206

Προς:

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. αρ.3446/Β/511/14-10-10)

ΘΕΜΑ: «Η σωτηρία της Κορώνειας απαιτεί άμεσες λύσεις».

Σχετ.: Η με αρ.4959 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων. (Α.Π.Ε.Γ.Υ. 106206/15.10.10)

Σε απάντηση της με αρ. 4959 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Α. Κολοκοτρώνη και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Σε συμμόρφωση με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία οι ελληνικές αρχές θέσπισαν καθεστώς προστασίας στη λίμνη Κορώνεια, (ΚΥΑ 6919/2004), ειδικό πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης των υδάτων της λίμνης (ΚΥΑ 5308/1838/2005) και σχέδιο δράσης για τη νιτρορύπανση (ΚΥΑ 16175/824/2006). Επίσης ενέκριναν 21 δράσεις απαραίτητες για την αποκατάσταση της λίμνης στα πλαίσια κατευθυντήριου σχεδίου (Master Plan) που εκπονήθηκε από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Το 2006 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου "Αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας", με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και σκοπό την σωτηρία της λίμνης Κορώνειας. Διαπιστώθηκε όμως ότι οι απαιτούμενες δράσεις που προβλέπονται από το ανωτέρω έργο έχουν προχωρήσει με αργό και ασύμμετρο τρόπο, με ιδιαίτερα σοβαρή υστέρηση των μέτρων που συνιστούν καθοριστικούς όρους. Το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει επικεντρωθεί στην προώθηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων τα οποία αναμένεται να εφαρμοστούν άμεσα στην περιοχή της Κορώνειας ώστε να έχουμε νέους δικαιούχους μέσα στο 2010


Όσον αφορά το στάδιο που βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης της Κορώνειας και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους αρμόδιες να απαντήσουν είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή

- ΚΥΥ
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικό Αρχείο Φ10
- Χ.Καστρινέλλης

Π. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

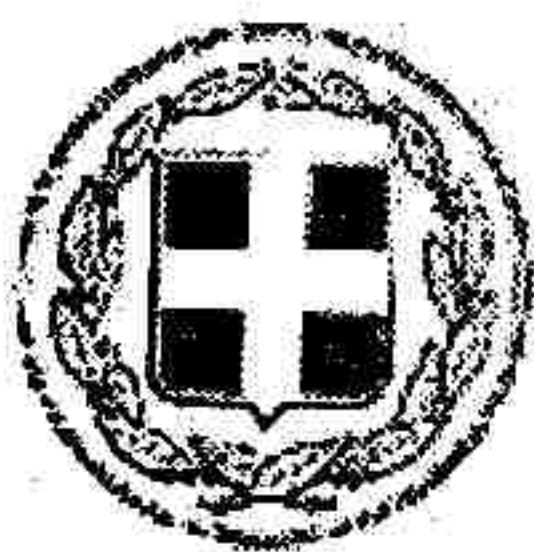

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

ΜΟΝΑΔΑ Α' – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Σπηλιοπούλου

Τηλ.: 213-214 2 240

Fax: 210-69 20 437

E-mail: g.spiliopoulou@mou.gr

Web: www.epperaa.gr



Αθήνα, 20/10/2010

Αρ. πρωτ.: 182772

Προς: ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Κοιν.:

ΘΕΜΑ: «Η σωτηρία της λίμνης Κορώνειας απαιτεί άμεσες λύσεις»

**ΣΧΕΤ: (α) Το με αρ. πρωτ. 3446/β/511/14.10.2010 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού
(Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου), το οποίο αφορά στην με αρ. πρωτ.
4959/13.10.2010 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.**

Σε απάντηση του (α) σχετικού σας εγγράφου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κολοκοτρώνη και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1) Η πορεία υλοποίησης των υποέργων που αποτελούν το έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και παρακολουθείται από την Υπηρεσία μας, έχει ως ακολούθως:

- Έργα δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδαιτημάτων προϋπολογισμού 17.170.000,00€.

Έχει ορισθεί ως ημερομηνία δημοπράτησης η 19-10-2010.

- Έργα βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών και αμφίδρομης λειτουργίας ενωτικής τάφρου προϋπολογισμού 5.840.000,00€.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 9.9.2008 και οι εργασίες βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης από τον ανάδοχο.

- Έργα λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης προϋπολογισμού 2.450.000,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 4.12.2007 και βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών. Υπάρχει αναστολή της περαιτέρω προόδου διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι της οριστικής εξέτασης από το ΣΤΕ, σχετικής προσφυγής η οποία ασκήθηκε κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης στις 14.11.2008. Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί οριστικά, μετά από τέσσερις αναβολές, στις 19/10/2010. Η υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την έναρξή του.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ



ΕΠΠΕΡΑΑ
Ενισχυτικό Πρόγραμμα
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



ΕΣΠΑ
2007-2013
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη

- Παρακολούθηση διαχειριστικών παρεμβάσεων και δημιουργία Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων προϋπολογισμού 242.344€.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 10.3.2009, το έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2010, ενώ έκτοτε συνεχίζεται η παρακολούθηση από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των έργων.

- Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για την Παρακολούθηση διαχειριστικών παρεμβάσεων και δημιουργία Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων προϋπολογισμού 535.074 €.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 4.3.2009 και το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στις 23.7.2009.

- Διαχείριση καλαμώνων στο υδροτοπικό σύστημα της Κορώνειας (μελέτη) προϋπολογισμού 119.887,00€.

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός, ενώ εκκρεμεί η εξέταση από το ΣΤΕ, σχετικής προσφυγής από μία εκ των εταιρειών που συμμετείχαν στη δημοπράτηση. Η εκδίκαση της υπόθεσης από το ΣΤΕ έχει ορισθεί, μετά από δύο αναβολές, για τις 08.03.2011.

- Διαχείριση καλαμώνων στο υδροτοπικό σύστημα της Κορώνειας (προμήθεια) προϋπολογισμού 391.050€.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 27.7.2009 και το ολοκληρώθηκε στις 19.02.2010.

- Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού προϋπολογισμού 400.000,00€.

Έχει δοθεί προέγκριση στα τελικά τεύχη δημοπράτησης και αναμένεται η δημοπράτηση.

- Σύμβουλος διαχείρισης έργου προϋπολογισμού 684.242€.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 27.8.2007 και ο Σύμβουλος προχωράει στις προβλεπόμενες από το χρονοδιάγραμμα εργασίες του.

2) Σε απάντηση του 2^{ου} σκέλους της ανωτέρω Ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι ετοιμάζεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ και την ΕΥΔ&ΠΤΣ του ΥΠΟΙΑΝ, Αίτημα Τροποποίησης της εγκριτικής απόφασης που αφορά στη χρονική παράταση υλοποίησης του έργου, μέχρι τέλους του 2011. Το σχετικό αίτημα αναμένεται να αποσταλεί άμεσα προς εξέταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Εσωτερική Διανομή

- Μονάδα Δ' Φάκελος «4.009»

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ




ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α.Α." ΕΣΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Προϊσταμένη της Μονάδας Δ'

α/α

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

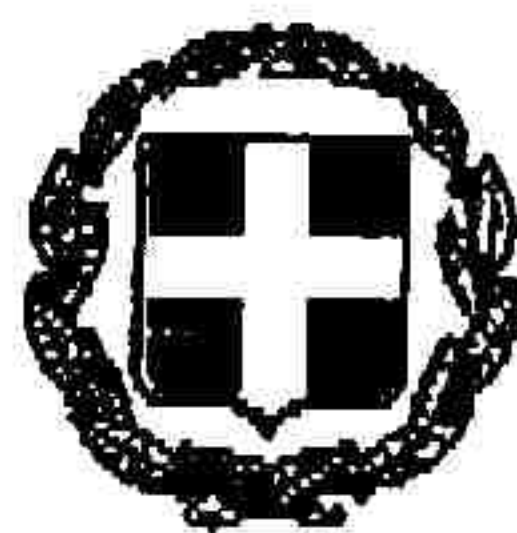

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ**

Ταχ. Δ/ση : Τάκη Οικονομίδη &

Καθ. Ρωσσίδα 11 – Θεσ/νίκη

Ταχ. Κώδικας : 54 008

Πληροφορίες: Ηρ. Μήτσιος

Τηλέφωνο: 2313309377

Fax: 2313309448

e-mail: hmitsios@rcm.gr

Θεσσαλονίκη 20-10-2010

Αρ. Πρωτ.: 5332

Π Ρ Ο Σ :

**Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 4959/13-10-2010 ερώτηση.

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 3446/Β/51/14-10-2010 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με όσα διαλαμβάνονται στην αριθμ. πρωτ. 4959/13-10-2010, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Με την με αριθμό Ε(2005)5779/19-12-2005 απόφαση της Επιτροπής εγκρίθηκε η συγχρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Συνοχής II προγραμματικής περιόδου 2000- 2006 του έργου «Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας Ν. Θεσσαλονίκης», προσαρμοσμένο στις βασικές αρχές της οδηγίας 2000/60 (αρ. Τ.Σ.:2005GR16CPE006). Στην εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι διατιθέμενοι πόροι, οι διαδικασίες υλοποίησης, το φυσικό αντικείμενο, οι στόχοι του έργου (ποσοτικοποιημένοι και μη).
Στην ίδια απόφαση γίνεται σαφή περιγραφή και αναφορά των ειδικών όρων που πρέπει να εκπληρώσουν οι Ελληνικές Αρχές προκειμένου να καταβληθούν οι εγκεκριμένοι οικονομικοί πόροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
- Προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντάχθηκε και υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των παρακάτω φορέων:
 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (νυν Υ.ΠΕ.Κ.Κ.Α.)
 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 - ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
 - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΙΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΕΜΠΩΝ

Το αναθεωρημένο αυτό σχέδιο αποκατάστασης στηρίζεται σε μία σειρά ενεργειών και δράσεων μελετών και τεχνικών έργων με βασικό στόχο την ενδογενή αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης με την ανόρθωση – αποκατάσταση των λειτουργιών στη λίμνη και τον υγρότοπο ώστε το ενιαίο σύστημα της λεκάνης της Μυγδονίας να είναι αυτοσυντηρούμενο ακόμη και σε δύσκολες υδρολογικά περιόδους.

Τελικός δικαιούχος και χρηματοδοτούμενος φορέας από την Ε.Ε. είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, όμως η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αν δεν σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο και οι 21 δράσεις, οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και η κάθε μία υποστηρίζει την άλλη. Συνεπώς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη - φορείς έχουν αναλάβει την υποχρέωση να

συνεργαστούν μεταξύ τους, ώστε με την παροχή εκατέρωθεν υπηρεσιών να εκπληρωθούν οι σκοποί της Προγραμματικής Σύμβασης με την υλοποίηση των τεχνικών έργων και δράσεων. Κάθε μέρος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο και αρμόδιο για τις δράσεις που αναλυτικά περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων έχει αντίκτυπο στο σύνολο των δράσεων, εξαιτίας ακριβώς του αλληλένδετου χαρακτήρα που αυτές έχουν και ταυτόχρονα θέτει την ελληνική πολιτεία υπόλογο έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως ήδη αναφέρθηκε το θέμα της σωτηρίας της λίμνης Κορώνειας αναδείχθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης ως περιφερειακό ζήτημα, το οποίο όμως στην πορεία έλαβε εθνικές και ευρωπαϊκές διαστάσεις.

Σε εφαρμογή λοιπόν των όρων της προγραμματικής σύμβασης έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συγκροτήθηκε η επιτροπή παρακολούθησης με ορισμό εκπροσώπου από κάθε φορέα προς το Γενικό Γραμματέα της Π.Κ.Μ.
2. Εγκρίθηκε από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής.
3. Στο πλαίσιο του κανονισμού λειτουργίας ορίστηκε και ειδική επιστημονική επιτροπή, αποτελούμενη από τους, η οποία συνεπικουρεί το έργο της επιτροπής παρακολούθησης σε καθαρά επιστημονικά ζητήματα.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα έχει συνέλθει 8 φορές μέχρι σήμερα παρακολουθώντας την πορεία της εξέλιξης των δράσεων των φορέων. Με πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης προκειμένου να συντονιστούν και επισπευτούν οι δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων · επίσης συνήλθε η Επιτροπή με εξειδικευμένο αντικείμενο συζήτησης επίλυση των προβλημάτων και την επίσπευση των δράσεων που αφορούν στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή της Π.Κ.Μ. και των δομών της στην επίσπευση και υλοποίηση δράσεων, των φορέων που συμμετέχουν – συμπράττουν στην προγραμματική σύμβαση – ενδεικτικά αναφέρουμε την υποβοήθηση των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ στην προώθηση υλοποίησης του τεχνικού έργου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που αφορά στο βαθέα ενδιαφέροντα και τη δημιουργία υδροτόπου, την συμβολή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στην υλοποίηση του έργου του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης – Μακεδονικών Τεμπών, που αφορά στην κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης και ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της για τη χρηματοδότηση του Δήμου Λαγκαδά, καθώς και τη συμβολή των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της χημικής κατάστασης της λίμνης, που ήταν δράση του πρώην Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. σήμερα ΥΠ.Ε. κ' Κ.Α.

Οι υποχρεώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 7 της προγραμματικής σύμβασης και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης και εκπονούνται από τις υπηρεσίες της είναι οι κατωτέρω :

1. Σύνταξη μελέτης έργων ορεινής υδρονομίας χειμάρρων Μπογδάνα- Καβαλαρίου - Κολχικού

- Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 08/05/2008. Η διαδικασία αξιολόγησης καθυστέρησε γιατί κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα από άλλα μελετητικά γραφεία, τα οποία εκδικάστηκαν στο ΣτΕ την 09-06-2008, και η απόφαση ήταν υπέρ του έργου.
- Στις 10-5-2010 συζητήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ η από 17-2-2010 προσφυγή σύμβασης μελετητικών γραφείων κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του διαγωνισμού και κατά των ΔΔ 463/11-2-2010 και ΔΔ 528/25-2-2010 αποφάσεων της προϊσταμένης αρχής με τις οποίες απορρίφθηκαν ένσταση και προσφυγή μελετητικών γραφείων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.
- Εκτιμούμε ότι σύντομα θα εκδοθεί η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών και θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο.
- Δεδομένου ότι η συνολική διάρκεια για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (χρόνος εκπόνησης – σύνταξης και ελέγχου τους), ανέρχεται στους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, και με την δυνατότητα σύντμησης η σύνταξη και η έγκριση της μελέτης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011.

2. Σύνταξη μελέτης έργων κατασκευής συλλογικών αρδευτικών δικτύων και εμπλουτισμού του φρεατίου υδροφορέα Λίμνης Κορώνειας (η συμβατική υποχρέωση της Π.Κ.Μ. αφορά μόνο στη σύνταξη της μελέτης, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση)

- Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 20/9/07 και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 5/3/2008.
- Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων από το ΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να εγκριθεί.

3. Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης της λειτουργίας των έργων.

- Καταρτίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του σχεδίου διαχείρισης της λειτουργίας των έργων προκειμένου να ανταποκρίνεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στις ειδικότερες ανάγκες διαχείρισης του οικοσυστήματος της λίμνης Κορώνειας.
- Εκδόθηκε η διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Λειτουργίας και Διαχείρισης Έργων για την Αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας Ν. Θεσσαλονίκης» (προϋπολογισμού 119.961,72€). Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 30-9-2010, ενώ η ανάδειξη αναδόχου αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου του 2010.

4. Μελέτη προτύπου AGRO 2.2

- Έχει χρηματοδοτηθεί, συνταχθεί, ολοκληρωθεί και παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Κ.Μ.

5. Πιστοποίηση προτύπου AGRO 2.2

- Με ευθύνη της Π.Κ.Μ. έχει αποσταλεί η «Μελέτη προτύπου AGRO 2.2» στον ΟΠΕΓΕΠ (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση του προτύπου.

6. Κλείσιμο γεωτρήσεων – Επανέλεγχος αδειών γεωτρήσεων – Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού (δράση η οποία συναρτάται με τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

- Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά τη σχετική μελέτη, στην περιοχή της Κορώνειας (κόνος ταπείνωσης), ο αριθμός των αρδευτικών γεωτρήσεων ανέρχεται σήμερα σε 1440.
- Γίνεται έλεγχος της αδειοδότησης από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας των γεωτρήσεων που βρίσκονται στην περιοχή της Κορώνειας και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πάσης λειτουργίας 245 αρδευτικών γεωτρήσεων μέχρι το τέλος του έτους.
- Οι περίπου 400 γεωτρήσεις που χωροθετούνται εντός των ορίων του υπό μελέτη Συλλογικού Αρδευτικού Δικτύου θα κλείσουν με την έναρξη λειτουργίας αυτού.

- Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι με σχετικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Υδάτων έπιασε η χρήση νερού από 42 βιομηχανικές γεωτρήσεις. Συνολικά η εξοικονόμηση νερού από την παύση λειτουργίας των 42 γεωτρήσεων ανέρχεται σε περίπου 5.700.000 m³ / έτος.

6.1. Ενέργειες ευαισθητοποίησης για τη μείωση του αρδευτικού νερού

- Στις 22-4-2010 εκδόθηκε Απόφαση (ΦΕΚ 591 Β/ 6-5-2010) για την τροποποίηση - συμπλήρωση των απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων για την προστασία του υδατικού δυναμικού του Ν. Θεσσαλονίκης, λόγω αναγκαιότητας λήψης πρόσθετων μέτρων για την αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης της ευαίσθητης περιοχής της λεκάνης Μυγδονίας.
- Συνεργασία με την υπηρεσία της αγροφυλακής να εντείνει τους ελέγχους στην περιοχή της λεκάνης της Μυγδονίας σε ότι αφορά τους κανόνες άρδευσης που έχουν επιβληθεί με τη ανωτέρω σχετική απόφαση του Γ.Γ. ΠΚΜ.
- Ολοκληρώθηκαν στο τέλος Ιουνίου οι επιτόπιοι έλεγχοι-αυτοψίες (συνολικά εννιά) από μικτά κλιμάκια υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υδάτων, της Αγροφυλακής και του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης για τον έλεγχο κατανάλωσης νερού με χρήση κανονισού (από 10:00 έως 16:00) και επιτόπου ενημέρωση των αγροτών (προφορικά και με έντυπο υλικό: 300 αφίσες και 500 ανακοινώσεις).
- Περαιτέρω κατά την εφαρμογή του Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο των σχεδίων βελτίωσης δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι η αντικατάσταση υφισταμένων συστημάτων άρδευσης (κανόνι) με στάγδην άρδευση, η οποία θα συμβάλλει στον περιορισμό της κατανάλωσης νερού.

Επιπλέον σας στέλνουμε τα κατωτέρω έγγραφα:

1. Το με αριθμ. 03/2445/19-10-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, ως αρμοδίου φορέα εκτέλεσης για τα έργα - δράσεις που έχουν τύχει Κοινοτικής Συνδρομής του Ταμείου Συνοχής, Θεσσαλονίκης.
2. Το αριθμ. 1019/18-10-2010 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών, για τη δράση «Κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης και ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» καθώς και
3. Το αριθμ. 2058/19-10-2010 έγγραφο της ΔΕΥΑ Λαγκαδά για το έργο - δράση «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και δεξαμενών υποδοχής βοθρολυμάτων και αντλιοστασίου Δ.Λαγκαδά Ν.Θεσσαλονίκης» και «Συντήρηση και Λειτουργία Ε.Ε.Λ. Λαγκαδά».

Ο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συνημμένα: 6 σελίδες

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ





ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

Λαγκαδάς, 19.10.2010

Αριθ. Πρωτ.: 2058

Διεύθυνση: Ματαπά 3, Λαγκαδάς

Τ.Κ.: 572 00

Τηλ.: 2394022520

Fax.: 2394020367

e-mail: deyal2001@yahoo.grΠληροφορίες: Πασχαλίδης Απόστολος
(2394023230, εσωτ. 16)

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας,
Γραφείο Γενικής Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης των έργων:

1. 'Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και δεξαμενών υποδοχής βοθρολυμάτων και αντλιοστασίου Δ. Λαγκαδά Ν. Θεσ/νίκης, Φάση 1, στα πλαίσια του έργου: Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας'»
2. 'Συντήρηση & Λειτουργία ΕΕΛ Λαγκαδά'

Σχετ.: το από 15.10.2010 έγγραφό σας

Σχετικά με την πρόοδο εργασιών των ανωτέρω έργων, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής:

1^ο ΕΡΓΟ: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και δεξαμενών υποδοχής βοθρολυμάτων και αντλιοστασίου Δ. Λαγκαδά Ν. Θεσ/νίκης, Φάση 1, στα πλαίσια του έργου: Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας'»

Νέα πιράταση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι και τις **30.03.2011** δόθηκε με την υπ' αριθ. 51/2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

- η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων & ομβρίων υδάτων σε συνολικό μήκος 30.000m για τα ακάθαρτα και 13.000m για τα ομβρία και
 - η κατασκευή δεξαμενών υποδοχής βοθρολυμάτων συνολικής χωρητικότητας 200m³
- Συνολικά αυτή τη στιγμή έχει εκτελεστεί περίπου το **40%** του έργου.

Πληθυσμιακά το ποσοστό της πόλης του Λαγκαδά που εξυπηρετείται μετά την ολοκλήρωση του 40% του έργου, ανέρχεται περίπου στο **7%**.

Όσον αφορά τον προγραμματισμό για το 2010, αναμένεται μέχρι το τέλος της χρονιάς:

1. η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου τμήματος του δικτύου ακαθάρτων
2. η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου τμήματος του δικτύου ομβρίων &

3. η κατασκευή των δεξαμενών υποδοχής βοθρολυμάτων

Εφόσον ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων & ακαθάρτων με την καινούρια εργολαβία, το ποσοστό του πληθυσμού της πόλεως του Λαγκαδά που θα εξυπηρετείται αντιστοιχεί στο 50% περίπου.

2° ΕΡΓΟ: «Συντήρηση & Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λαγκαδά»

Με την υπ' αριθ. 49/2010 απόφασή του το Δ.Σ. της Επιχείρησης έκανε δεκτή την ένσταση της εταιρείας ΕΤΕΡ Α.Ε. η οποία και αναδεικνύεται μειοδότης – ανάδοχος με μέση έκπτωση 28,18%.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό ενώ από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπεται η ολοκλήρωσή του εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή γίνεται αντιληπτό ότι μέχρι την άνοιξη του 2011 θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του εν λόγω έργου. Και σε συνδυασμό πάντα με την εξέλιξη του έργου του αποχετευτικού δικτύου της πόλης του Λαγκαδά, γίνεται κατανοητό ότι μέσα στο επόμενο έτος θα αρχίσει, πρώτα με τη λειτουργία των δεξαμενών υποδοχής βοθρολυμάτων και κατόπιν του αποχετευτικού δικτύου το οποίο κατασκευάζεται κατά τμήματα και στα κατάντι του Βιολογικού Σταθμού, η σταδιακή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λαγκαδά.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΛ συντάσσει αυτή τη στιγμή μελέτη για την σύνδεση του παντοροϊκού δικτύου του Λαγκαδά με την ΕΕΛ Λαγκαδά –αν και είναι κάτι που δεν προβλεπόταν από την αρχική μελέτη κατασκευής του χωριστικού αποχετευτικού δικτύου-, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την λειτουργία της ΕΕΛ, εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο το μεγαλύτερο τμήμα της πόλεως του Λαγκαδά (πάνω από το 50% του πληθυσμού). Η μελέτη αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου. Το κόστος των εργασιών εκτιμάται ότι θα καλυφθεί από την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία που κατασκευάζει το αποχετευτικό δίκτυο του Λαγκαδά. Εφόσον τελικά εγκριθεί η μελέτη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, οι εργασίες αυτές καθαυτές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 2 μήνες και είναι κάτι που υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010.

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά
Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Β. Όλγας 198
Τ.Κ. : 541 10
FAX : 2313 319 821
Τηλέφωνο : 2313 319 622
E-mail : A.Giantsis@nath.gr

Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2010

Ар. Прот.: 03/2445

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γρ. Γενικού Γραμματέα
Υπόψη κ. Ηρ. Μήτσιου
Φαξ: 2313309448

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση στη Βουλή με αρ. πρωτ. 4959/13-10-2010.

- Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Νομάρχης κ. Π. Ψωμιάδης) αρχές του 2003, ανέλαβε άμεσα μία σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων για τη σύνταξη νέας πρότασης του έργου «Αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας»
- Αποπληρωμή του έργου: Η τελική πληρωμή της κοινοτικής συνδρομής θα καταβληθεί εφόσον οι ελληνικές αρχές πιστοποιήσουν ότι το σύνολο των 21 παρεμβάσεων που περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση έχουν ολοκληρωθεί.
- το σύνολο των έργων και δράσεων είναι εικοσιένα (21) και περιγράφονται στην υπογραφείσα σχετικά προγραμματική σύμβαση μεταξύ των φορέων
 1. ΥΠΕΧΩΔΕ,
 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 3. ΥΠΟΙΟ,
 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
 6. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
 7. ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
 8. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΒΗΣΕίναι καθορισμένο ποιος είναι ο αρμόδιος για κάθε έργο ή δράση.
- Την ευθύνη και παρακολούθηση για την υλοποίηση των 21 δράσεων και έργων έχει η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με πρόεδρο τον Γ.Γ. Π.Κ. Μακεδονίας.
- Τα ουσιαστικά προβλήματα της Κορώνειας είναι η έλλειψη νερού και η μόλυνση.
- Η έλλειψη – εξοικονόμηση του νερού αντιμετωπίζεται από το πρόγραμμα διάσωσης με:
 1. το έργο της Ενωτικής Τάφρου: έργο της Νομαρχίας που έχει υλοποιηθεί στο 95 % και ήδη λειτούργησε μεταφέροντας νερό στη λίμνη που μετά από πολλά χρόνια η στάθμη της ανέβηκε σε περίπου 2μ,
 2. το αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ (ειδικός όρος),

3. τη διαχείριση των νερών άρδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ (ΥΠΕΧΩΔΕ) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (γεωτρήσεις κ.λ.π.) (ειδικός όρος).

- Η μόλυνση των νερόν οφεύεται:

1. στις βιομηχανικές μονάδες: η Νομαρχία τακτοποίησε το πρόβλημα με τον καλλίτερο τρόπο (συντημμένο σημείωμα),
2. στα αστικά λύματα με αρμόδιους το Δήμο Λαγκαδά και τους άλλους παραλίμνιους δήμους (ειδικός όρος),
3. στα αγροτικά λύματα (λιπάσματα, φυτοφάρμακα) με αρμόδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των 7 υποέργων αρμοδιότητας της ΝΑΘ έχει ως εξής:

- το Υποέργο 1: Έργα δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων στη Λίμνη Κορώνεια. Δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η υλοποίηση του υποέργου. Λόγω μη καλών συνθηκών στη λίμνη το 2007 και το 2008, ζητήθηκε και απαιτήθηκε η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου. Το υποέργο πήρε έγκριση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων με την Απόφαση 138112/3-7-2009 και στις 18-08-09 υποβλήθηκαν στην ΕΥΔ - ΕΠΠΕΡ τα τεύχη δημοπράτησης για σύμφωνη γνώμη. Ζητήθηκαν διευκρινήσεις και διορθώσεις στο τεύχος διακήρυξης και την μελέτη από την ΕΥΔ - ΕΠΠΕΡ ώστε να δοθεί σύμφωνη γνώμη και να δημοπρατηθεί το έργο. Η δημοπράτηση του υποέργου ορίστηκε στις 19-10-2010

• το Υποέργο 2: Έργα βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών και αμφίδρομης λειτουργίας ενωτικής τάφρου. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και η εργολαβία εξελίσσεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ημερομηνία διαγωνισμού την 11-12-2007. Έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα λογαριασμοί ποσού 6.052.553,06 €. Έχει ολοκληρωθεί το 95% του φυσικού αντικείμενου του υποέργου. Λόγω ανακάλυψης στη θέση ανασκαφής, αρχαιολογικών ευρημάτων απαιτείται υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, που υποβλήθηκε στο ΕΠΠΕΡ στις 3-12-09 για σύμφωνη γνώμη που δόθηκε για χρηματοδότηση ύψους 340.000 € και θα τεθεί ως νέο υποέργο στο έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, με την προσθήκη υποέργου «Αρχαιολογία». Το μνημόνιο συνεργασίας έχει υπογραφεί στις 27/05/2010 και το τεχνικό δελτίο του νέου υποέργου «Αρχαιολογία» υποβλήθηκε στις 22/06/2010.

- Για το Υπόεργο 3: Έργα λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης. (σύστημα: Μελέτη κατασκευή 2.450.000,00 ευρώ)

Είχε δημοπρατηθεί αρχικά την 28-09-2007, κηρύχθηκε άγονος και επαναδημοπρατήθηκε στις 04/12/2007.

Εκδόθηκε η 215/09 απόφαση της επιτροπής αναστολών του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία διατάσσεται η αναστολή της περαιτέρω προόδου διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι της οριστικής εξέτασης της προσφυγής που αφού αναβλήθηκε τέσσερις (4) φορές, αναμένεται να εκδικαστεί στις 19/10/2010

Το Υποέργο 4α. Μελέτη διαχείρισης καλαμώνων στο υδροτοπικό σύστημα της λίμνης Κορώνειας (119.877,03 €). Έχει διενεργηθεί ο σχετικός διαγωνισμός στις 17-07-08. Επί του 2^{ου} πρακτικού έχουν υποβληθεί 2

ενστάσεις και από τους δύο υποψηφίους. Η ένσταση απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το Δεκέμβριο του 2009. Η μία εκ των εταιριών προσέφυγε στο ΣτΕ με την 1012/09 αίτηση αναστολής, που μας κοινοποιήθηκε στις 31/08/09 και αφού αναβλήθηκε δύο (2) φορές, αναμένεται να εκδικαστεί στις 08/03/2011

- **Το Υπόεργο 4β. Προμήθεια εξοπλισμού κοπής καλαμώνων στην λίμνη Κορώνεια** (328.613,44 € χωρίς ΦΠΑ). Η δημοπράτηση του υποέργου διενεργήθηκε στις 30/01/2009. Ανακηρύχθηκε ανάδοχος αντί του ποσού των 391.050,72 € με το ΦΠΑ. Στις 27/07/09 υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο. Στις 19/2/10 έγινε η οριστική παραλαβή (το μηχάνημα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη). Το υπόεργο έχει αποπληρωθεί.

Το Υπόεργο 5α. Υπηρεσίες δημιουργίας βάσης δεδομένων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και σύστημα λήψης αποφάσεων (203.650,23€ χωρίς ΦΠΑ). Η δημοπράτηση του υποέργου διενεργήθηκε στις 15/07/2008. Έχει υπογραφεί της σύμβαση με τον ανάδοχο (Α.Π.Θ.) στις 10/03/2009. Η υλοποίηση του φυσικού Αντικειμένου είναι 100 % και έγινε μόνο η 1^η πληρωμή ποσού 72.703.13€, που εγκρίθηκε από το ΕΠΕΡΑΑ με το 175809/09-02-10.

Το Υπόεργο 5β. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παρακολούθησης (535.073,98€). Έχει διενεργηθεί και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός αντί του ποσού των 449.642,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στις 23/07/2009 και αποπληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009. Έχει εγκατασταθεί και ήδη είναι σε λειτουργία. Η ΝΑΘ από ίδιους πόρους έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το ΑΠΘ για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του εξοπλισμού μέχρι 31/12/2010.

- **Το Υπόεργο 6. Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού** (400.000,00 €). Στις 25-02-2009 διαβιβάστηκαν τα τεύχη δημοπράτησης στην ΕΥΔ ΕΠΕΡΑΑ για παροχή προέγκρισης. Ζητήθηκαν στις 02/06/2009 διορθώσεις του τεύχους διακήρυξης που υποβλήθηκαν άμεσα ηλεκτρονικά και στις 09/06/2009 σε έντυπη μορφή από τη ΝΑΘ. Στις 21/7/2010 δόθηκε τελικά η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΕΡΑΑ και την ίδια μέρα ζητήθηκαν διευκρινήσεις από την ΝΑΘ σχετικά με τον χρόνο της σύμβασης και την αύξηση του ΦΠΑ από 18% σε 23 %. Μετά την λήψη των σχετικών διευκρινήσεων αναμένεται η διακήρυξη του έργου.
- **Το υπόεργο 7. Σύμβουλος Διαχείρισης (Υποχρεωτικά η πρόσληψή του έπρεπε να γίνει πριν ξεκινήσουν τα υπόλοιπα έργα)** (684.241,73). Το έργο υλοποιήθηκε κανονικά. Η σύμβαση και η παράταση που δόθηκε έληξε στις 6/10/2010. Στις 25-9-09 ζητήσαμε εγγράφως (απ 2996/25-9-09) από το ΕΠΕΡΑΑ τον τρόπο συνέχισης του έργου. Ακόμη δεν πήραμε καμία απάντηση. Έχουν εγκριθεί και εκκρεμούν δύο πληρωμές συνολικού ποσού 472.126,80 € (1^{ος} λογαριασμός 213.472,14 € στην ΥΔΕ Θεσσαλονίκης και 2^{ος} λογαριασμός 258.654,66 € με βάση την εγκριτική της ΕΥΔ ΕΠΕΡΑΑ στις 09-02-10 επιστολής). Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου δεν ενέκρινε το ένταλμα της 1^{ης} πληρωμής και μαζί με τις αντιρρήσεις μας το παρέπεμψε στην Δ26 του Υπουργείου Οικονομικών για την τελική διευθέτηση της πληρωμής.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑ (ειδικός όρος)
(Ενέργειες των Υπηρεσιών της ΝΑΘ)

- Μέχρι το 2006 λειτουργούσαν στην περιοχή είκοσι οκτώ (28) επιχειρήσεις, από τις οποίες οι δεκαπέντε (15) ήταν επιχειρήσεις επεξεργασίας υφασμάτων (βαφεία – πλυντήρια). Για τις περισσότερες από αυτές είχαν γίνει συστάσεις και επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις. Από τις αρχές του 2007 και μέχρι σήμερα: 1) εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι στην περιοχή με την σύσταση μεικτών κλιμακίων ελέγχου της Νομαρχίας και του Φορέα διαχείρισης των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας και 2) επεκτάθηκαν οι έλεγχοι σε σαράντα δύο (42) μεταποιητικές επιχειρήσεις και στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κορώνειας
- Σήμερα από τις 28 επιχειρήσεις:
 - έχουν διακόψει την λειτουργία τους οι δεκατρείς (13),
 - έχουν εκδοθεί αποφάσεις παύσης για έξι (6). Τρεις (3) από αυτές προσέφυγαν το Συμβούλιο της Επικρατείας (η απόφαση αναμένεται εντός του μηνός Οκτωβρίου). Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προσφυγή τους μέχρι και σήμερα οι δύο (2) από τις (3) διέκοψαν την λειτουργία τους.
 - Και νόμιμα λειτουργούν εννέα (9).

Πιο ειδικά για δεκαπέντε (15) ήταν επιχειρήσεις επεξεργασίας υφασμάτων (βαφεία – πλυντήρια), λειτουργούν σήμερα νόμιμα δύο (2) που είναι μικρής δυναμικότητας. Οι υπόλοιπες έχουν διακόψει την λειτουργία τους, εκτός της (1) μίας εκ των (3) όπου εκκρεμεί η εκτέλεση τους μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας επί των αιτημάτων για προσωρινή διαταγή, πράξη που αναμένεται εντός του μηνός Οκτωβρίου.

Μια σημαντική παράμετρος της διακοπής της λειτουργίας των ανωτέρω επιχειρήσεων, είναι ότι έχουν διακόψει την λειτουργία τους και 31 γεωτρήσεις με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού 7.500 κυβικών μέτρων ημερησίως, ενώ αναμένεται να διακόψουν την λειτουργίας τους άλλες 9 γεωτρήσεις με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού 5.500 κυβικών μέτρων ημερησίως μετά τις αποφάσεις του Συμβούλιο της Επικρατείας για τις (3) τρεις επιχειρήσεις που εκκρεμεί η απόφαση παύσης.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε σταδιακά, με στοχευόμενη, συστηματική και συνεχή παρακολούθηση των επιχειρήσεων της περιοχής, λαμβάνοντας παράλληλα κάθε πρόνοια, ώστε η διακοπή της λειτουργίας όσων επιχειρήσεων δεν συμμορφώθηκαν να γίνει χωρίς αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία.

Αναλυτικά όλες τις ενέργειες που έγιναν ειδικά από το 2006 έως σήμερα για κάθε μία από τις 28 επιχειρήσεις της περιοχής της Κορώνειας αποτυπώνονται στο έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης της ΝΑΘ με Α.Π 15/12868/29-7-2009.

Με Ε.Ν.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Απόστολος Γιάντσης

Εσωτ. Διανομή:

Αρχείο για Φ17



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη

Δ/κου - Οικον/κου Μηχαν/σής

Κ.Α.Α.

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ

Υ.Π.Σ.Κ.Α.



**ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΙΜΝΩΝ
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ**

Λαγκαδάς, 18 Οκτωβρίου 2010

Αρ. Πρωτ. οικ. 1019

Σ. Τσακάλη 21, 57200 Λαγκαδάς
Τηλ.: 23940/24553
FAX: 23940/26160
e-mail: foreaskv@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.foreaskv.gr

ΠΡΟΣ :**ΥΠΕΚΑ**

Γραφείο Υπουργού
Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου
Αμαλιάδος 17-Αρπελόκηποι
115 23 – Αθήνα
Fax 210 64 61525

ΚΟΙΝ:

1.Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
FAX: 2106429137
2.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
FAX: 23133309448

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση που υποβλήθηκε από τους Βουλευτές κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη και Κυριάκο Βελόπουλο.

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθ. 3446/β/511/14-10-2010 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού.

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας έχει αναλάβει την εκπόνηση του πενταετούς διαχειριστικού σχεδίου της προστατευόμενης περιοχής, την υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης και τη συμμετοχή σε κοινά κλιμάκια για την επανεξέταση των ρυπογόνων βιομηχανιών της περιοχής Λαγκαδά.

1) Εκπόνηση πενταετούς διαχειριστικού σχεδίου

α) Έως σήμερα εξέλιξη

1. Ο Φορέας Διαχείρισης εκπόνησε το πενταετές διαχειριστικό σχέδιο και τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής. Η οριστική παραλαβή έγινε στις 14/12/2009 από τη ΔΙΠΕΧΩ της ΠΚΜ η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 290/2009 του Δ.Σ. του Φορέα. Το σχέδιο έχει



αποσταλεί στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ στις 10/3/2010 προκειμένου να λάβει τη σχετική έγκριση.

Το σχέδιο διευθετεί τις υφιστάμενες χρήσεις γης, ρυθμίζει τις δραστηριότητες της γεωργίας, της βόσκησης, της αλιείας, της θήρας, της δασοπονίας, του οικοτουρισμού, των ναυταθλημάτων κλπ. Παράλληλα, μεριμνά για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και την αποκατάσταση της υδρολογικής - οικολογικής ισορροπίας στη λεκάνη της Μυγδονίας. Επίσης, στην Α' Φάση του διαχειριστικού σχεδίου που περιλαμβάνει την καταγραφή γενικών στοιχείων, περιγραφή της προστατευόμενης περιοχής (φυσικό περιβάλλον, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνήθειες, κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα) και την αξιολόγηση της περιοχής, παρατίθενται συγκεντρωτικά και επικαιροποιημένα δεδομένα για είδη και πληθυσμούς ορνιθοπανίδας της περιοχής.

β) Προγραμματισμός επόμενου διαστήματος

Λόγω του περιορισμού της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ έγινε αρχικά μια προκαταρκτική ιεράρχηση των δράσεων του διαχειριστικού σχεδίου. Οι τελικές δράσεις που θα συμπεριληφθούν στο νέο τεχνικό δελτίο του Φορέα Διαχείρισης θα επιλεγούν ύστερα από σχετική εισήγηση και της Επιστημονικής Επιτροπής και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2010. Παράλληλα, ο Φορέας προγραμματίζει συναντήσεις με τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στο σχέδιο.

2) Πρόγραμμα παρακολούθησης

α) Έως σήμερα εξέλιξη


Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση είναι ένα αναπόσπαστο και σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία της διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, ο Φορέας για την περίοδο 2008-2009 προέβη στις ακόλουθες δράσεις:

- Παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων:



Τον Ιούνιο του 2008 μετά από διαγωνισμό που διενήργησε ο Φορέας Διαχείρισης έγινε η προμήθεια ενός πολύμετρου (πολυαισθητήρα) για την καταγραφή των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού. Στη συνέχεια εκπονήθηκε ένα πρόγραμμα μετρήσεων και έκτοτε ο Φορέας πραγματοποιεί βάσει του προγράμματος μετρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία στο σύνολο του Εθνικού Πάρκου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2008 και θα συνεχιστεί μέχρι τις 31-12-2015. Τα πρώτα αποτελέσματα, έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση στις τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων που παρακολουθούνται, ενώ σημειακά παρατηρούνται υψηλές τιμές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην αγωγιμότητα.

- Δημιουργία οδηγού συλλογής και επικαιροποίησης περιβαλλοντικών δεδομένων παρακολούθησης, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης της πανίδας, της ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων της προστατευόμενης περιοχής. Τον Οδηγό συνοδεύει και ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων, η οποία αποτελεί το μέσο αποθήκευσης, ανάλυσης και προσπέλασης των δεδομένων και πληροφοριών που προκύπτουν κατά την παρακολούθηση των παραμέτρων, τόσο του συγκεκριμένου Προγράμματος Παρακολούθησης, όσο και επιπλέον παραμέτρων που παρακολουθούνται στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και το καθεστώς προστασίας της περιοχής.
- Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων παρακολούθησης βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων, ώστε να δημιουργηθούν τα απαραίτητα δεδομένα για την πληθυσμωσή της βάσης δεδομένων του Φορέα. Τα δεδομένα παρακολούθησης που συλλέχθηκαν είναι συμπληρωματικά αυτών που συλλέγονται στο πλαίσιο παρακολούθησης των έργων του Master Plan για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας, συμβάλλοντας σε μια πληρέστερη εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση και την πορεία εξέλιξης των λιμνών.
- Παρακολούθηση με τηλεπισκοπικά – δορυφορικά μέσα και τεχνικές για τη δημιουργία επικαιροποιημένου χάρτη των ορίων των οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων προτεραιότητας στην περιοχή ευθύνης του Φορέα

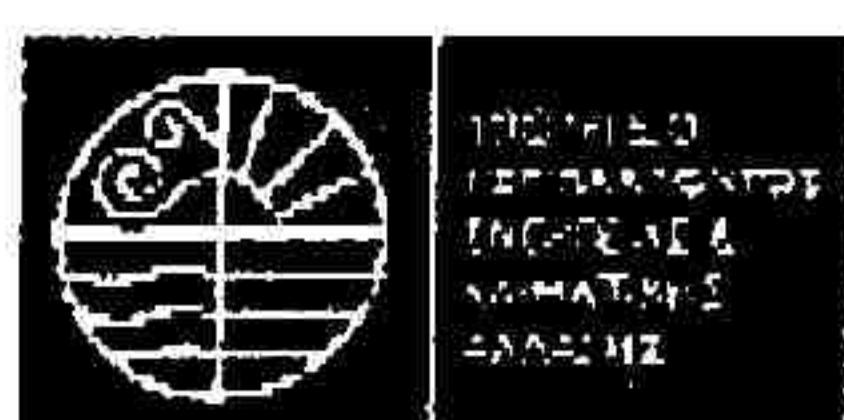

Διαχείρισης, καθώς και χάρτης διαχρονικής εξέλιξης των μεταβολών αυτών.

- Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας:

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Οδηγού συλλογής και επικαιροποίησης περιβαλλοντικών δεδομένων παρακολούθησης και του Σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής, ο Φορέας Διαχείρισης με τον εξοπλισμό και το προσωπικό που διαθέτει κατάφερε να συλλέξει δεδομένα για την ορνιθοπανίδα της περιοχής αρμοδιότητάς του για τα έτη 2008-2009.

β) Προγραμματισμός επόμενου διαστήματος

Το πρόγραμμα παρακολούθησης για την περίοδο 2010 -2015 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

- Παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των φυσικοχημικών παραμέτρων το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2008 θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος προγράμματος χρηματοδότησης (31-12-2015).

- Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας

Το πρόγραμμα παρακολούθησης ορνιθοπανίδας το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του 2008 θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος προγράμματος χρηματοδότησης (31-12-2015).

- Καταγραφή ανθρωπογενών πιέσεων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου.

Η καταγραφή θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2010 και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος προγράμματος χρηματοδότησης (31-12-2015).

Συνολικά το πρόγραμμα δράσης που πρέπει να υλοποιηθεί στη λεκάνη απορροής των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης σε εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 79/409/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ εξειδικεύεται στο Διαχειριστικό Σχέδιο, ενώ οι συμπληρωματικές δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Φ.Δ. θα συμπεριληφθούν στο νέο Τεχνικό Δελτίο που θα υποβάλλει ως τις 30/9/2010 και θα έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τις 31-12-2015.



3) Επανεξέταση περιβαλλοντικών όρων ρυπογόνων βιομηχανιών

Ο Φορέας συμμετέχει σε κλιμάκια ελέγχου για την επανεξέταση των περιβαλλοντικών όρων των ρυπογόνων μονάδων της περιοχής. Το 2009 ολοκλήρωσε μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΝΑΘ τους απαραίτητους ελέγχους και στην παρούσα χρονική στιγμή προγραμματίζει νέα συνάντηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, προκειμένου να οργανωθεί η διαδικασία για τη φετινή περίοδο.

4) Συμπληρωματικές δράσεις Φορέα Διαχείρισης

4.1) Παροχή γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Ο Φορέας Διαχείρισης γνωμοδοτεί για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Έως σήμερα έχουν δοθεί 1.100 γνωμοδοτήσεις ενώ πλέον καμία δραστηριότητα δε λαμβάνει χώρα χωρίς την απαραίτητη έγκριση του Φορέα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πριν από την εγκατάσταση οποιασδήποτε δραστηριότητας και την εκκίνηση της διαδικασίας έκδοσης περιβαλλοντικών όρων, ο υποψήφιος επενδυτής αρχικά απευθύνεται στο Φορέα για τη διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου.

4.2) Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των κοινωνικών εταίρων

α) Έως σήμερα εξέλιξη

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα διαχειριστικά μέτρα πρέπει να υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από τον τοπικό πληθυσμό, γίνεται συστηματική προσπάθεια ευαισθητοποίησής του μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, οργανώνονται επισκέψεις σε παραγωγικές ομάδες της περιοχής και σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Το 2009 - ο Φορέας οργάνωσε ανοιχτές συναντήσεις σε δήμους της περιοχής όπου συζητήθηκαν θέματα ορθολογικής χρήσης του αρδευτικού νερού. Παράλληλα, έγιναν μεμονωμένες συναντήσεις και ενημερώσεις σε υπηρεσιακούς παράγοντες. - Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η έκδοση ενός πλήρους πακέτου ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και διοργανώθηκε



επιστημονική ημερίδα με θέμα Άνθρωπος – Αειφορία – Ανάπτυξη με τη συμμετοχή 250 ατόμων. Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις και στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, διοργανώνονται από το Κέντρο Πληροφόρησης (που τελεί υπό την αρμοδιότητα του Φορέα) ξεναγήσεις σχολικών και ανεξάρτητων ομάδων στην περιοχή των λιμνών. Το 2009 έγινε ενημέρωση σε 3.000 μαθητές και άλλους ενδιαφερόμενους.

β) Προγραμματισμός επόμενου διαστήματος

Για το επόμενο διάστημα σχεδιάζονται συναντήσεις με υπηρεσίες της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης προκειμένου να συζητηθούν θέματα αναφορικά με παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή (αμμοληψίες, γεωργία, διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων κλπ.), με στόχο τη σύναψη πρωτόκολλου συνεργασίας. Παράλληλα, σχεδιάζονται συναντήσεις με τους δήμους της περιοχής με σκοπό την πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο διάθεσης των αστικών λυμάτων τους, την καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών επεξεργασίας τους (όπου αυτές υπάρχουν), τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και την ενημέρωση για την ΚΥΑ 6919/2004.

4.3) Πρόγραμμα επόπτευσης προστατευόμενης περιοχής

α) Έως σήμερα εξέλιξη

Στο πλαίσιο του προγράμματος επόπτευσης ο Φορέας υλοποιεί το σχέδιο φύλαξης που έχει εκπονήσει. Έως σήμερα έχει καταγράψει και αναφέρει στις αρμόδιες υπηρεσίες πλήθος παράνομων δραστηριοτήτων που υποβαθμίζουν το οικοσύστημα. Αναφορικά με την ανόρυξη παράνομων γεωτρήσεων έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες στη Διεύθυνση Υδάτων ενώ έχει αποτραπεί η συνέχιση εργασιών σε πολλές περιπτώσεις. Παράλληλα, η ομάδα της επόπτευσης, με τη συνεχή παρουσία στην περιοχή, ενημερώνει τους κατοίκους για τη νομιμότητα ή μη διάφορων δραστηριοτήτων, ενώ έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό στην περιοχή ότι υπάρχει συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας που πρέπει να τηρείται. Τέλος, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα καταγραφής των καταπατημένων εκτάσεων στην Α' Ζώνη Προστασίας του



Εθνικού Πάρκου και στην παρούσα χρονική στιγμή αξιολογούνται τα αποτελέσματά του προκειμένου να αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

β) Προγραμματισμός επόμενου διαστήματος

Για το επόμενο διάστημα ο Φορέας συνεχίζει την υλοποίηση του σχεδίου φύλαξης ενώ συμμετέχει, με τη Δ/νση υδάτων της Π.Κ.Μ., σε κοινά κλιμάκια για τη διασφάλιση της τήρησης των περιοριστικών όρων στη χρήση του αρδευτικού νερού. Παράλληλα, συμμετέχει στην εκστρατεία ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού, που διενεργείται από τη Δ/νση- Υδάτων και στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

4.4) Εκπόνηση ειδικού διαχειριστικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης

Ο Φορέας εκπόνησε το ειδικό διαχειριστικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, κύριος στόχος του οποίου είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός μέτρων και πολιτικών στην κατεύθυνση της δημιουργίας ολοκληρωμένων πακέτων οικοτουριστικών προγραμμάτων- και υποδομών φιλοξενίας καθώς και ανάπτυξης δράσεων προβολής της περιοχής. Το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται η διενέργεια ημερίδας σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και με τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων για την προώθηση των δράσεων που -περιλαμβάνονται στο σχέδιο.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση είμαστε στην διάθεση σας.

Για το Φορέα Διαχείρισης
Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης

Δήμητρα Μπόμπρη
Πρόεδρος Δ.Σ.

