

2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

20 ΙΑΝ. 2011



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΝΙΑΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 20/01/2011

Αρ. Πρωτ.: **58255 /ΕΥΣ 7697**

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5-7  
Ταχ. Κώδικας : 10180  
Πληροφορίες : Α. Χατζοπούλου  
Τηλέφωνο : 210 333 2108  
Fax : 210 333 2428  
E-mail : achatzopoulou@mnec.gr

✓ **ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων**

**Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**

**Τμήμα Ερωτήσεων και Αίτησης  
Κατάθεσης Εγγράφων**

**Κοινοποίηση:**

- Βουλή των Ελλήνων Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Σέκερη 1Α, 10671 ΑΘΗΝΑ.
- Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γρ. Υπουργού, Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 101 87 ΑΘΗΝΑ
- Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γρ. Υπουργού, Χαρ. Τρικούπη 182, 10178 ΑΘΗΝΑ
- Βουλευτή κο Κ. Μουσουρούλη

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 7629/280/10-12-2010 του βουλευτή κου Κ. Μουσουρούλη**

Σε απάντηση της ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων με αρ. πρωτ. 7629/280/10-12-2010 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του

✓

Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Το έργο «Ολοκλήρωση και λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου Χίου» έχει να επιδείξει υστέρηση υλοποίησης, καθώς πέρα της καθυστερημένης έναρξής του στο φυσικό αντικείμενο, ήτοι την κατασκευή νέου κτιρίου, με εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής του Νοσοκομείου και την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού (ιατρικού και ξενοδοχειακού) για τη λειτουργία αυτών, προκλήθηκε νέα χρονική καθυστέρηση, καθώς προέκυψε και ανασκαφική έρευνα, μετά την ολοκλήρωση της οποίας, απαιτήθηκε η διατήρηση των αρχαίων ευρημάτων «ως ορατών εν υπογείω» με εκτέλεση βεβαίως και συμπληρωματικών εργασιών θεμελίωσης. Η Πράξη αποτελεί έργο γέφυρα, έκλεισε στο Γ'ΚΠΣ σε σύνολο περίπου 14.000.000 ευρώ και πέρασε στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό σήμερα περίπου 9.000.000 ευρώ.

Από τον Νοέμβριο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2010, λόγω μη πληρωμής πιστοποιήσεων, ο Ανάδοχος είχε προβεί σε διακοπή εργασιών. Από τον Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο 2010 εξετάσθηκε η δυνατότητα παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Νέου Κτιρίου & Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης κτιριακής υποδομής του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: Ολοκλήρωση της Α' Φάσης (κατασκευή νέου κτιρίου) συμπεριλαμβανομένου του Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, στις 31/12/2010. Επίσης η περαίωση του έργου Β' Φάσης (ανακαίνιση ορισμένων κτιρίων και τελική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου), προβλέπεται για τις 30-06-2011. Να σημειωθεί ότι οι φάσεις ακολουθούν η μία την άλλη ανά εξάμηνο και καθυστερήσεις σε μία, επηρεάζουν και τις υπόλοιπες. Στο σύνολο 22,5 εκ. ευρώ σύμβασης (που περιλαμβάνει οικοδομικά, Η/Μ, και εξοπλισμό) ο Φορέας Υλοποίησης δηλώνει μέχρι και σήμερα, υλοποίηση των οικοδομικών εργασιών σε ποσοστό 70,5%, των Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σε ποσοστό 82% και του εξοπλισμού σε ποσοστό 65%. Η τρέχουσα δαπάνη του έργου κατά τον τελευταίο λογαριασμό βρίσκεται περίπου στα 18 εκ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή είχε άμεσα προβεί σε τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου με εισαγωγή Υποέργων ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής Ωφελείας), προκειμένου να μην υπάρξει ουδεμία καθυστέρηση και η δαπάνη σύνδεσης με τη ΔΕΗ δηλώθηκε στην Διαχειριστική Αρχή στις 8-11-1010.

Σήμερα η Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να εξετάσει το τελευταίο αίτημα παράτασης έχει ζητήσει και αναμένει το νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα καθώς και την Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιο να σας απαντήσει είναι τα συνεργαζόμενα Υπουργεία.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ**

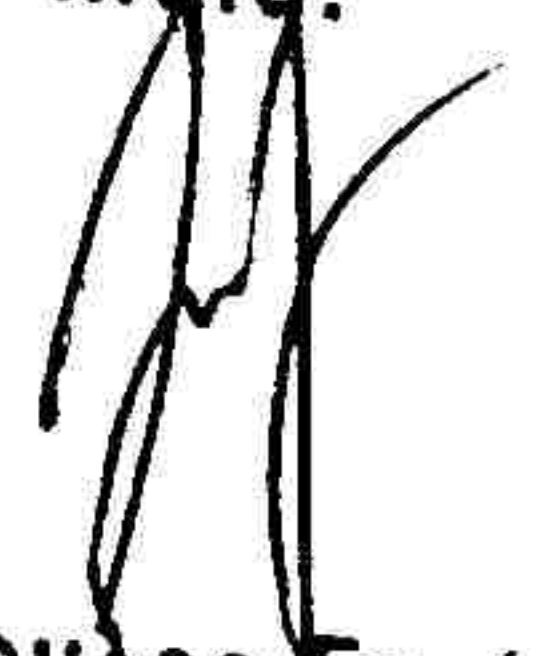
**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Υπουργού, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη
- Γραφείο Υφυπουργού, κ. Π. Ρήγα
- Γραφείο Γεν. Γραμμ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης, κ. Γ. Πετράκου
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων
- Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε. Π. (2)
- Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού ελέγχου



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ**

κ.ρ.ρ.

  
**Αλεξόπουλος Σταύρος**
