




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

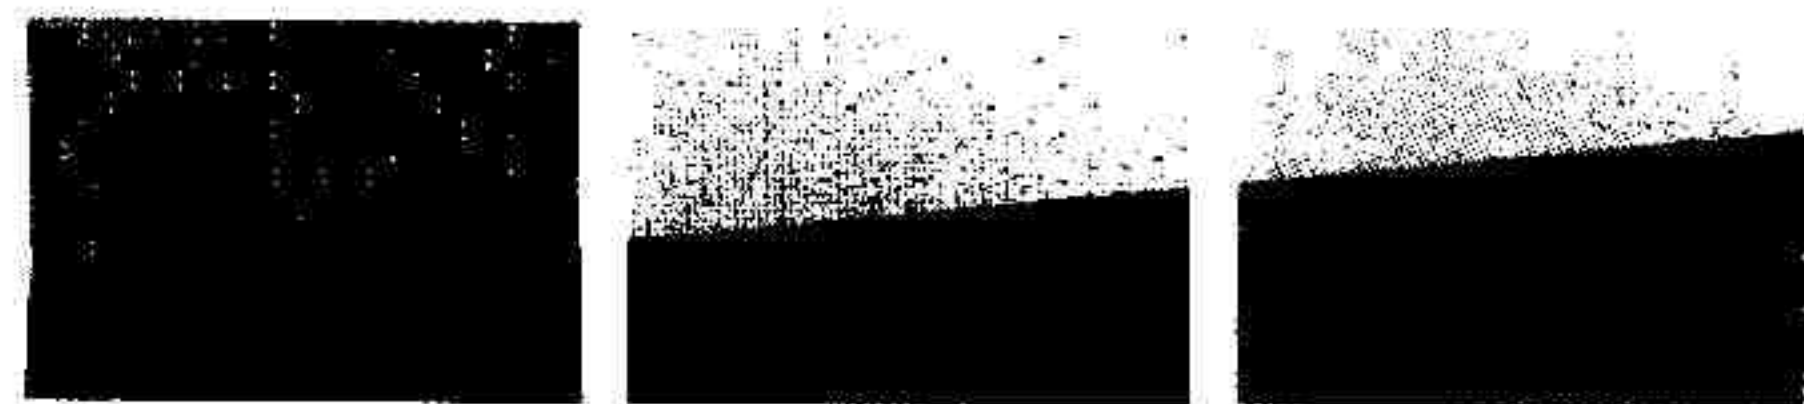

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΝΙΑΣ**

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10 (6^{ος} όροφος)

Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα

Πληροφορίες : Γ. Αξάοπουλος

Τηλ. : 210 3377834

Fax : 210 3377865

E-mail : gaaxopoulos@mnec.gr

Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.:

29 Μαρτίου 2011
12218/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ716

ΠΡΟΣ:

**Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:

Βουλευτή κ. Αθανάσιο Μπούρα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθ. πρωτ. 13332/17-03-2011 ερώτηση του βουλευτή κου Αθανασίου Μπούρα

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης του βουλευτή κου Αθανασίου Μπούρα και σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωστοποιούμε τα εξής :

Για την κατασκευή των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Θριασίου Πεδίου, που περιλαμβάνει τους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας μετά από την υποβολή σχετικών αιτημάτων από τις ελληνικές αρχές, εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι παρακάτω αποφάσεις συγχρηματοδότησης των έργων από το Ταμείο Συνοχής:

- Η Ε(2004) 5719/27-12-2004 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο «Βασικοί συλλεκτές και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο», με προϋπολογισμό 54.500.000 ευρώ, κοινοτική συνδρομή 24.525.000 ευρώ, προθεσμία ολοκλήρωσης τις 31-12-2010 και φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
- Η Ε(2004) 5718/27-12-2004 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και Δυτικού τομέα Θριασίου Πεδίου (δευτερεύον δίκτυο)», με προϋπολογισμό 53.200.000 ευρώ, κοινοτική συνδρομή 39.900.000 ευρώ, προθεσμία ολοκλήρωσης τις 31-12-2010 και φορέα υλοποίησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής (νυν Περιφέρεια Αττικής).

Για τα έργα έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτήματα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους μέχρι τις 31-12-2011. Έχουν υπογραφεί όλες οι συμβάσεις για την κατασκευή του αρχικά εγκεκριμένου έργου και εκκρεμεί η δημοπράτηση του πρόσθετου φυσικού αντικειμένου η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Το συνολικό μήκος του Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης που έχει κατασκευασθεί ανέρχεται σε 145.000 μέτρα και το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Θριασίου είναι έτοιμο να υποδεχθεί λύματα. Το Δευτερεύον Δίκτυο Αποχέτευσης του Ασπροπύργου που έχει κατασκευασθεί έχει συνδεθεί με το ΚΕΛ Θριασίου, μέσω του Ανατολικού Κλάδου των Βασικών Συλλεκτών.

Εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους θα επιτευχθεί και η σύνδεση των δήμων Ελευσίνας και Μάνδρας με το ΚΕΛ Θριασίου, μέσω του Δυτικού Κλάδου των Βασικών Συλλεκτών.

Το συνολικό μήκος του δικτύου αποχέτευσης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011 με πιθανή εξαίρεση μικρά τμήματα στην περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΡΗΜ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

**Ο Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας**

Παναγιώτης Ρήγας

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφ. Υφυπουργού κ. Π. Ρήγα
- ΕΥΔ&ΠΛΑΠ

- Αυτ. Γραφ. κοινοβουλευτικού ελέγχου
