


11 ΜΑΙ. 2011

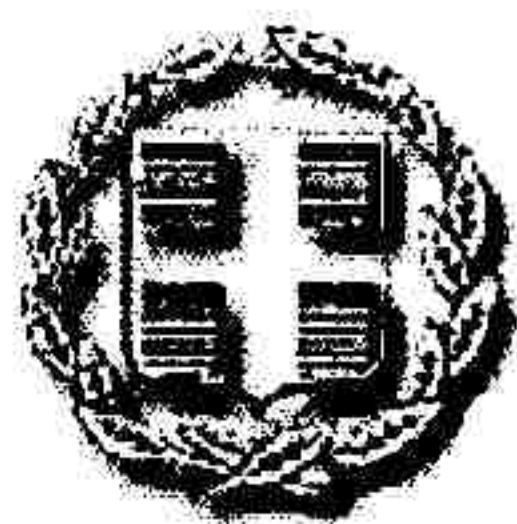

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 06.05.2011

Αρ. Πρωτ.: 32986
(σχετ.: 32990)

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών

Απαντώντας στις με αρ. 13345/18-3-2011 και 13372/18-3-2011 ερωτήσεις, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κκ. Σ. Κεδίκογλου και Κ. Μαρκόπουλο, σχετικά με την παύση των εργασιών κατασκευής του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία και σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στις 17-3-2011 ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής ληξιπρόθεσμου λογαριασμού.

Παρότι το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου 2007-2013») και οι πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες, λόγω διαδικαστικών θεμάτων υπήρξε η παραπάνω καθυστέρηση της πληρωμής.

Ήδη από τις 5-4-2011 ο ανάδοχος έχει πλήρως εξοφληθεί και από τις 6-4-2011 έχει επανεκκινήσει τις εργασίες του.

Ο χρόνος παράδοσης του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προσδιορίζεται στις 29-5-2011.

Η ΔΕΠΑΝΟΜ μετά την επανέναρξη του έργου αναμένει από τον ανάδοχο αίτημα παράτασης, προκειμένου να προσδιορίσει τη νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κκ. Σ. Κεδίκογλου, Κ. Μαρκόπουλο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Δ/ση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
4. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

