


12 JAN. 2012

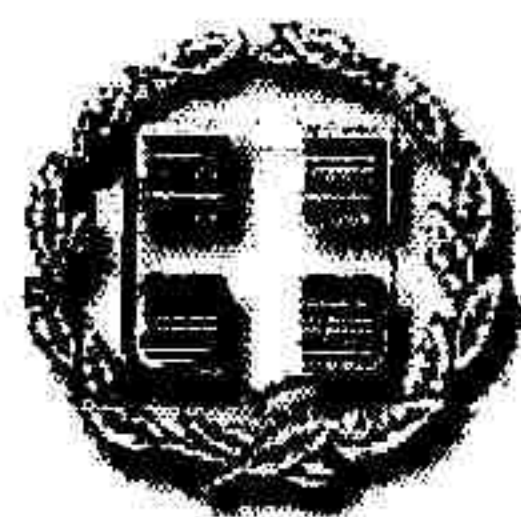

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 5/1/2012

Αρ. Πρωτ.: 128332

**ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 1664/18-11-11 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη, σχετικά με την ολοκλήρωση του Νέου Νοσοκομείου Σαντορίνης, όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Μελέτη-Κατασκευή Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Θήρας» εκτελείται σύμφωνα με την αρ. Υ4β/ΓΠ 100923/28.07.08 Υπουργική Απόφαση και την από 21.11.2008 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με την αρ. 3164/315/29.09.2001 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 08^η.12.2011. Λόγω καθυστερήσεων στη σύνδεση του έργου με τη ΔΕΗ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων του έργου και ως εκ τούτου η ημερομηνία περαίωσης δεν αναμένεται πριν το Φεβρουάριο του 2012.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ.Υπουργού
2. Γρ.Υφυπουργού
3. Δ/ση ΑΜΥ
4. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

