


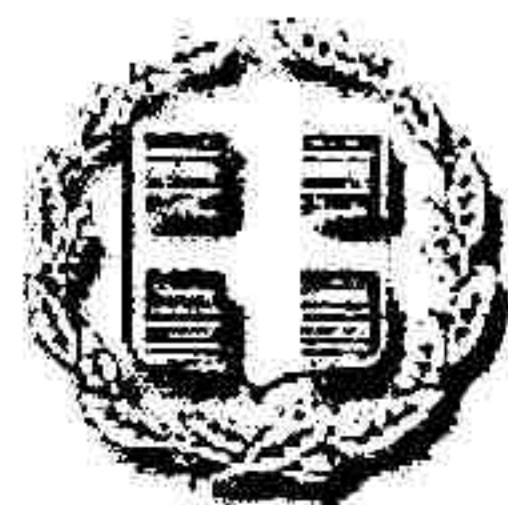

23 ΙΑΝ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 22/1/13

Αρ. Πρωτ.: 119893

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. **5110/13-12-2012** ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Τριαντάφυλλου με θέμα « Γενικό 'Σκυλίτσειο' Νοσοκομείο Χίου», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 31.10.2012 και προκειμένου να προχωρήσει ο ανάδοχος στη Β' Φάση των εργασιών, ήτοι στον εκσυγχρονισμό των υπολοίπων υφισταμένων κτιρίων του Νοσοκομείου, σε κάθε περίπτωση, απαιτείται παράταση της εν λόγω προθεσμίας. Όμως, όπως εξηγείται και στα επόμενα εδάφια, απαιτούνται πρόσθετες εργασίες, πέραν των συμβατικά προβλεπομένων. Επειδή για τις εργασίες αυτές, είναι αδύνατη η εξεύρεση εθνικών πόρων, έχει επιλεγεί ο τρόπος υπό τον όρο έγκρισης από το Υπουργείο μας, του άμεσου κλεισίματος - παραλαβής τρέχουσας εργολαβίας, με απομείωση του αντίστοιχου αντικειμένου. Μετά από την επεξεργασία και την επικαιροποίηση των στοιχείων διαλογής, η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, θα προχωρήσει στην επικαιροποίηση της μελέτης των υπολοίπων εκ των υφισταμένων κτιρίων του Νοσοκομείου. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την έναρξη των εργασιών εκτιμάται ότι θα υπερβεί τους 12 μήνες (εκπόνηση μελέτης δημοπράτησης, διαδικασία διαγωνισμού, ενδεχόμενος προσυμβατικός έλεγχος), η δε διάρκεια τους θα είναι περίπου 12 μήνες.

2. Η επικαιροποίηση της μελέτης είναι σκόπιμη και απαραίτητη, διότι λόγω των ανασκαφικών ερευνών και προβλημάτων με την Αρχαιολογία στη διαμόρφωση της υφιστάμενης εσωτερικής αυλής, αλλαγής θεμελίωσης, κλπ., προκλήθηκε στο έργο πολύχρονη καθυστέρηση λόγω τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου. Σήμερα, πλέον, 10 έτη μετά τη σύνταξη της δημοπρασιακής μελέτης (2002), απαιτείται επικαιροποίηση αυτής, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις λειτουργίας, σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση των κτιρίων λόγω χρήσης και παλαιότητας, ώστε οι επεμβάσεις που θα γίνουν να οδηγήσουν στην ανακαίνιση αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές και κανονισμούς των σύγχρονων νοσηλευτικών υποδομών.

3. Τα θέματα της επικαιροποίησης της μελέτης για τον εκσυγχρονισμό των υπολοίπων υφιστάμενων κτιρίων αφορούν στις ενισχύσεις αυτών, σχετικές και με την ακριβή εικόνα που η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ απέκτησε με τις μέχρι σήμερα παρόμοιες εργασίες, στις

λειτουργικές χρήσεις και στα τελειώματα-υλικά και στη συμμόρφωση στους κανονισμούς των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα θέματα αυτά, θεωρούνται απολύτως απαραίτητα προκειμένου να καταστεί το υφιστάμενο Νοσοκομείο άρτιο και λειτουργικό.

4. Ο πράγματι αυξημένος σήμερα προϋπολογισμός του έργου, σε σχέση με τον αρχικό, οφείλεται στις νέες δαπάνες των δύο συμπληρωματικών συμβάσεων που αναφέρονται σε συγκεκριμένες δαπάνες, λόγω αρχαιολογίας, αλλαγές θεμελίωσης, κλπ., αλλά και σε δαπάνες λόγω υπερβολικής αναθεώρησης τιμών και διαφοράς ΦΠΑ. Με τον προϋπολογισμό αυτό δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν οι παραπάνω ανάγκες για τις συγκεκριμένες υπερσυμβατικές εργασίες.

5. Στα πλαίσια εκτέλεσης νέας εργολαβίας θα εκπονηθεί νέα μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου αυτή να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου) και στη συνέχεια να δημοπρατηθεί. Ήδη, έχουν γίνει σχετικές προκαταρκτικές συζητήσεις με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

6. Το σύνολο του έργου, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω και επισημαίνεται εκ νέου, δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί διότι οι υπόλοιπες από τις σημερινές πιστώσεις του ΕΣΠΑ που είναι διαθέσιμες, δεν ανταποκρίνονται πλέον στις περιγραφείσες ανάγκες του Νοσοκομείου. Επισημαίνουμε δε ότι, σε περίπτωση, που το έργο, κλείσει στα προβλεπόμενα, σήμερα, χρηματοδοτικά πλαίσια, άποψη της ΔΕΠΤΑΝΟΜ ΑΕ είναι, ότι ορισμένα κτίρια, εκ των υφισταμένων, θα υστερούν αρκετά από τις σύγχρονες νοσηλευτικές υποδομές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Κ. Τριαντάφυλλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ.Υπουργού

2.Γρ. Αναπλ. Υπουργού

3.Γρ.Υφυπουργού

4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

