

25 ΦΕΒ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 24.02.2013

10^ο 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 385

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση έργου «Βελτίωση οδού Γυθείου-Αρεόπολης-Γερολιμένα»
κατά τμήματα

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 6591/01.02.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Αθανάσιος Δαβάκης

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Αθανάσιο Δαβάκη
2) Υπ. Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε
τον κύριο Βουλευτή, ότι τα θέματα της Ερώτησης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της οποίας
επ' συνάπτουμε το υπ' αρ.853/12.02.2013 σχετικό έγγραφο, για ενημέρωσή σας.

Συνημμένα
Το υπ' αρ.853/12.02.2013
έγγραφο


Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Στ. Χριστοφίδου



✓



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

Σπάρτη 12-02-2013

Αριθ. Πρωτ.: 853

ΠΡΟΣ :

Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Βασιλίσσης Σοφίας 2
10021 Αθήνα

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο ΠΕ
Λακωνίας 2^ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης
Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100 Σπάρτη
Πληροφορίες : Άγγελος Κολλιάκος
Τηλέφωνο : 27310-93800 εσωτ.1326
e-mail: a.kollakos@lakonia.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων για την υλοποίηση των Έργων

1. "Βελτίωση της οδού Γυθείου Αρεόπολης Γερολιμένα κατά τμήματα", και
2. Λιμάνι Γυθείου.

Σχετ.: Η από 01-02-2013 επερώτηση του Βουλευτή κ. Αθανάσιου Δαβάκη.

Σε συνέχεια της σχετικής επερώτησης για την εξέλιξη των ανωτέρω έργων σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1α.) Όσον αφορά το 1^ο έργο το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του είναι 23 μήνες είτε από την ημερομηνία πληρωμής των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες με την διαδικασία των επιτάξεων και την παράδοση αυτοτελών ενιαίων τμημάτων, είτε από την ημερομηνία παρακατάθεσης των αποζημιώσεων όπως προβλέπει η οικία σύμβαση του έργου. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η συζήτηση για τον προσδιορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας στο Πρωτοδικείο Γυθείου έχει προσδιοριστεί ότι θα πραγματοποιηθεί στις 27/03/2013 (εξ αναβολής)

Όσον αφορά το περιεχόμενο του χρονοδιαγράμματος σας γνωρίζουμε ότι αυτό περιλαμβάνει τον επί μέρους χρονικό προγραμματισμό των προς εκτέλεση εργασιών του έργου οι οποίες είναι :

- Χωματουργικά
- Τεχνικά Έργα
- Έργα Αποχέτευσης –Αποστράγγισης
- Εργασίες Οδοστρώσης
- Ασφαλτικές Εργασίες
- Εργασίες Σήμανσης Ασφάλισης της Οδού.

1b) Η συμβατική δαπάνη εκτέλεσης του έργου, πλην απαλλοτριώσεων, ανέρχεται στο ποσό των 10.970.976,01€ με το ΦΠΑ. Η δε ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία απόκτησης της απαιτούμενης για την εκτέλεση του έργου εδαφικής λωρίδας.

2.Όσον αφορά το 2^ο έργο σας γνωρίζουμε ότι το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του περιλαμβάνει τον επί μέρους χρονικό προγραμματισμό των προς εκτέλεση εργασιών του έργου οι οποίες είναι :

- Εργασίες Βυθοκορήσεων, Επιχώσεων
- Εργασίες Κατασκευής Στραγγιστηρίων και Χαλικοπασσάλλων
- Εργασίες Λιθορριπών και Εξυγίανσης του πυθμένα
- Τεχνικά Έργα Κατασκευής τεχνητών Ογκολίθων και Ανοδομών
- Εργασίες Οδοστρώσεως
- Εργασίες Τοποθέτησης Σιδηρών και Χυτοσιδηρών Εξαρτημάτων
- Εργασίες Σήμανσης Ασφάλισης
- Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες

Το έργο σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15/01/2015.

Συνημμένα :

Ε.Π.

Ο Δ/της Τεχνικών Έργων της Π.Ε

Λακωνίας


Ε.Δ. :

1. κ. Ηλία Αλιμήση Λ/ντη σε μας.
2. κ. Παν/τη Παναγάκη Πρ/νο Σ.Ε σε μας.
3. Χρονολογικό Αρχείο.

Ηλίας Αλιμήσης

Π Ε 4 με Β' Βαθμό

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

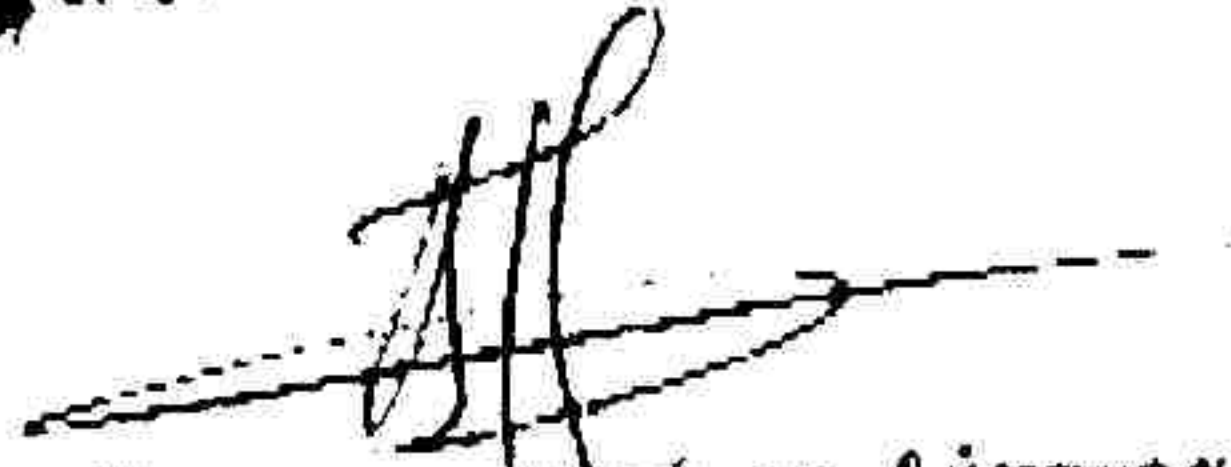
Παρασκευάκης του Δημήτρη
Υ.Ε. Εργαστηρίου με Α.β.
