


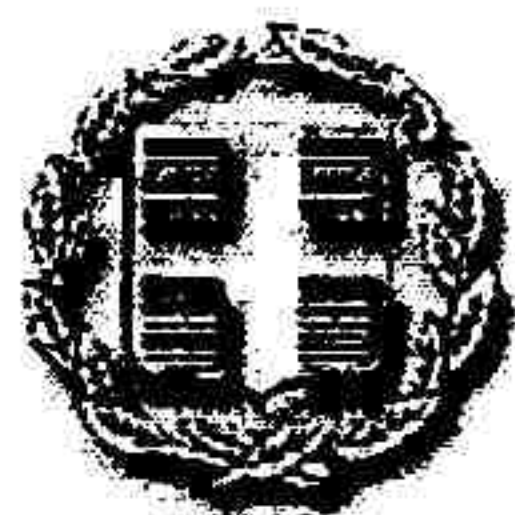

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21/2/2013

Αρ. Πρωτ.: 9117

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις και ΑΚΕ Βουλευτή

Απαντώντας στις με αρ. 6057/561/21-1-2013 και 6058/562/21-1-2013 ερώτηση ΑΚΕ, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο, σχετικά με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας του ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο με πλήρη τίτλο «Εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης του κεντρικού κτιρίου και Οικοδομικές - Η/Μ εργασίες αποκατάστασης του διώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» από τις επισκευές λόγω σεισμού»:

- Περιλαμβάνει εργασίες ενίσχυσης του Φέροντος Οργανισμού του 2^{ου} ορόφου και 9^{ου} ορόφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου, που αυτός υπέστη από τις ζημιές του Ιουνίου 2008, καθώς και πλήρους αποκατάστασης του 2^{ου} ορόφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου.
- Ανατέθηκε στην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Υ4β/155724/24.11.08 Υπουργική Απόφαση και με πηγή χρηματοδότησης την ΣΑΕ 091/5 (ΠΔΕ - Εθνικοί Πόροι), και εκτελείται με βάση:
 - α) την από 29.05.09 Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», ύψους 4.275.000,00 €, πλέον ποσοστού 10% για τυχόν νέες εργασίες, αναθεώρησης και ΦΠΑ,
 - β) την από 01.07.2011 Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 2.350.000 €, πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ.

Λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης αλλά και αλλαγής του κτιριολογικού προγράμματος του έργου και των χρονικών καθυστερήσεων που οι αιτίες αυτές επέβαλαν, οι εργασίες στις 10/01/2013 τελικά περαιώθηκαν, σύμφωνα με το από 21/01/2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα του επιβλέποντα Μηχανικού.

Εκτοτε η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ ζήτησε από τον ανάδοχο του έργου να αποκαταστήσει ορισμένες μη ουσιώδεις εκκρεμότητες που υπάρχουν στο έργο (σύμφωνα με το παραπάνω Υπηρεσιακό Σημείωμα του επιβλέποντα Μηχανικού), προκειμένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Περαιώσης.

Η ολοκλήρωση και ο έλεγχος αντιμετώπισης των εκκρεμοτήτων αυτών αναμένεται να συμβεί στις αρχές Μαρτίου. Θα ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία Διοικητικής Παραλαβής για χρήση προς το Νοσοκομείο, καθώς και οι διαδικασίες προσωρινής και οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα συμβατικά, προβλεπόμενα και οι οποίες δεν επηρεάζουν τη χρήση του έργου.

Εν τω μεταξύ η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ έχει ήδη προχωρήσει σε Διοικητική Παράδοση προς χρήση προς το Νοσοκομείο, τμήματος του υπογείου του διώροφου κτιρίου, όπου έχει εγκατασταθεί και ήδη λειτουργεί εξοπλισμός επιταχυντή - εξομοιωτή, καθώς και τμήματος του Α' ορόφου όπου αυτό το διάστημα εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού Γ' Κάμερας (Spect CT).

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι:

- Η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με τα Υπουργεία Υγείας και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξασφάλισε τις απαραίτητες πιστώσεις και μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί όλες οι πιστοποιημένες εργασίες .
- Υφίστανται διεκδικήσεις του αναδόχου οι οποίες έχουν εξετασθεί και απορριφθεί από την ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και έχει ακολουθηθεί εκ μέρους του η δικαστική οδός, η οποία όμως δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση και τη παράδοση του έργου.

Αναφορικά με την προμήθεια του ψυγείου που απαιτείται για την λειτουργία του νεκροτομείου, όπως και την εγκατάσταση του μηχανισμού αερίων για τις καρδιολογικές κλινικές, σας ενημερώνουμε ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η παραλαβή προς χρήση των σχετικών χώρων του διώροφου κτιρίου, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών του Δημοσίου για την ανάδειξη αναδόχων για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψυγείου νεκρών 6 θέσεων» και την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την διασύνδεση του διώροφου κτιρίου με το Κέντρο Αερίων της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των προσεχών δέκα ημερών.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ.Υπουργού

2.Γρ.Αναπλ. Υπουργού

3.Γρ.Υφυπουργού

4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Α. Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

