


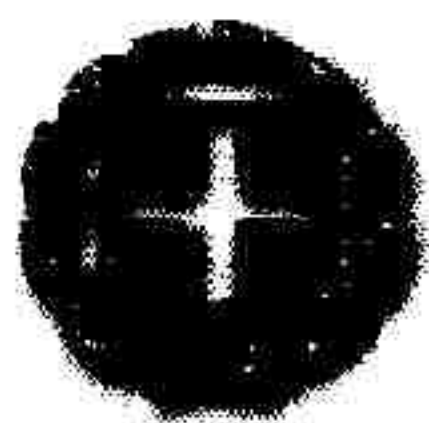

23 ΜΑΙ. 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 22 - 05 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 431/2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

✓ Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Νικόλαο Κούζηλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6560/25-02-2014 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 299/2014/18-03-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Κούζηλος, με θέμα «Εξέλιξη έργων ανάπτυξης στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. οικ. 56390/955/17-03-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

✓
✓



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Πειραιάς, 17 - 03- 2014

Αριθ. Πρωτ.οικ.56390/955

Ταχ.Δ/ση: Α.Ποσειδώνος 14-16
Ταχ.Κώδ. : 18531
Τηλέφωνο: 213-2073723
FAX: 210-4119802
E-mail: id.nison@patt.gov.gr

Προς:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων

Κοιν. :
Γραφείο Περιφερειάρχη

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση (6560/28-02-2014) του βουλευτού κ. Κούζηλου Νικολάου.

ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ.46630/05-3-2014 έγγραφο του Περιφερειάρχη Αττικής.

β) Το με αρ. πρωτ.8438/28-02-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και απαντώντας στην ερώτηση του θέματος, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Όσον αφορά την στήριξη στο πρόβλημα του βιολογικού και του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Πόρου, υπάρχει σε εξέλιξη, και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου» και, επιπλέον, εκπονείται μελέτη από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την αντιμετώπιση του συνόλου των προβλημάτων λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. και του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Πόρου.
2. Όσον αφορά το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ», το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχουν διαπιστωθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία κακοτεχνίες.
3. Όσον αφορά το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και ο έλεγχος του ε.σ. επιτυχώς, και εντός των επόμενων ημερών υπογράφεται η Σύμβαση.

4. Όσον αφορά το έργο: «ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΓΚΙΣΤΡΙ», σας γνωστοποιούμε ότι για το έργο έχει δοθεί άδεια εγκατάστασης και έχει γίνει η εγκατάσταση, χωρίς να έχουν διαπιστωθεί κακοτεχνίες σε αυτό.
5. Όσον αφορά το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ», σας γνωστοποιούμε ότι : α) έχει συνταχθεί πλήρως η προμελέτη όπως και τα τεύχη δημοπράτησης, β) επίκειται η θεώρησή της από το Υπουργείο Εσωτερικών, και γ) μετά την θεώρηση, η οποία πρέπει να γίνει πολύ σύντομα, θα ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου και θα ακολουθήσει η ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, προκειμένου να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.
6. Όσον αφορά το έργο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ - ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», σας γνωστοποιούμε ότι: α) το έργο της Λιμνοδεξαμενής έχει αποπερατωθεί πλήρως και επίκειται η παραλαβή του, β) υπάρχουν (2) έργα ύδρευσης που εκτελούνται παράλληλα από την ΔΕΚΕ και την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της πρώτης υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και είναι υπό ολοκλήρωση, γ) το έργο άρδευσης, προϋπολογισμού 642.000 €, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστών έργων της Περιφέρειας Αττικής και επίκειται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Τροιζηνίας.
7. Όσον αφορά το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ» σας γνωστοποιούμε ότι : α) πρόκειται για έργο που εκτελείται από την Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, β) το έργο αυτό έχει συνάφεια με το έργο «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», του οποίου η μελέτη έχει ολοκληρωθεί , γ) απαιτήθηκαν υποστηρικτικά έργα για τα οποία οι μελέτες έχουν ήδη συνταχθεί και τα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, και επίκειται η δημοπράτηση των υποστηρικτικών αυτών έργων προκειμένου να ολοκληρωθεί και το κυρίως έργο.
8. Όσον αφορά το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», σας γνωστοποιούμε ότι: α) το συμφωνητικό υπεγράφη την 11-9-2013, β) η προβλεπόμενη από την σύμβαση και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προθεσμία για την περαίωση του λήγει την 10-1-2015, γ) μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί αγωγοί συνολικού μήκους περίπου 2.300 μ. αγωγών, δηλαδή το 58% των αγωγών του έργου, δ) το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και ουδεμία καθυστέρηση παρατηρείται, ε) σε περίπτωση παράβασης των προθεσμιών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν3669/2008, περί ποινικών ρητρών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και στ) Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κακοτεχνίες. Σε περίπτωση κακοτεχνιών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του Ν3669/2008, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

9. Όσον αφορά το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», σας γνωστοποιούμε ότι : α) το συμφωνητικό υπεγράφη την 11-9-2013, β) η προβλεπόμενη από την σύμβαση και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προθεσμία για την περαίωση του λήγει την 10-11-2014, γ) μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί αγωγοί που αντιστοιχούν στο 25% περίπου, του συνολικού μήκους των αγωγών του έργου, δ) το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και ουδεμία καθυστέρηση παρατηρείται, ε) σε περίπτωση παράβασης των προθεσμιών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν3669/2008 περί ποινικών ρητρών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και στ) Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κακοτεχνίες. Σε περίπτωση κακοτεχνιών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του Ν3669/2008 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
10. Όσον αφορά το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», σας γνωστοποιούμε ότι έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός διότι έχει υποβληθεί αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, η οποία συζητήθηκε την 07/03/2014 και αναμένεται η απόφαση.
11. Όσον αφορά το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) - ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ», σας γνωστοποιούμε ότι : α) το συμφωνητικό υπεγράφη την 11/09/2013, β) η προβλεπόμενη από την σύμβαση ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 11-11-2015, γ) μέχρι σήμερα έχουν προχωρήσει αφενός θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου (απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων κλπ) και αφετέρου έχει κατασκευαστεί περίπου το 5% των συμβατικών εργασιών, δ) το έργο εκτελείται βάσει εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ε) σε περίπτωση παράβασης των προθεσμιών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν3669/2008 περί ποινικών ρητρών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ε) μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κακοτεχνίες. Σε περίπτωση κακοτεχνιών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του Ν3669/2008 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.



Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ
