

2995
17/6

14/6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 14/6/2010

Αρ. Πρωτ 972/300

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων/ΑΚΕ**
Αναφορών

- ΘΕΜΑ: Μικρή Περιμετρική Οδός Πατρών Ν. Αχαΐας
- ΣΧΕΤ.: 1. Η Ερώτηση/ΑΚΕ 10598/630/26.5.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος
2. Η ΠΑΒ 2995/20.5.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος
- ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Οικονομικών – Γρ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών (Ερώτηση/ΑΚΕ και Αναφορά), παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Η Μικρή Περιμετρική Οδός της Πάτρας είναι έργο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Δ.Δ.Ε.). Πρόκειται για έργο οδοποιίας εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Πάτρας, συνολικού μήκους 3,12 χλμ. Περιλαμβάνονταν στην κυκλοφοριακή μελέτη Πατρών, η οποία εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (Δ.Μ.Ε.Ο.) του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2000, με την εποπτεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το έργο της Μικρής Περιμετρικής Οδού Πατρών εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2000-2006 το έτος 2001, με συνολικό προϋπολογισμό 62,5 εκ. ευρώ περίπου. Αποτελείται από πέντε εργολαβίες, τρεις εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί, ενώ οι άλλες δύο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σχετικά με τη συγκεκριμένη εργολαβία στην οποία αναφέρεται ο κ. Βουλευτής, αφορά το τμήμα ΧΘ 1+650 έως 2+872,58 της Μικρής Περιμετρικής Οδού. Η ανάδοχος εταιρία «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.» υπέγραψε σύμβαση στις 15-9-2006 και ξεκίνησε η κατασκευή του έργου. Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου ανερχόταν σε 24 μήνες και έληγε στις 15-9-2008. Με την από 03-11-2008 Απόφαση της Περιφέρειας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15-05-2009 με αναθεώρηση (οριακή προθεσμία σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν.1418/84 χωρίς αίτηση του αναδόχου), ενώ στις 21-4-2009 ο τ. Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 31-12-2009, με αναθεώρηση, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Η εν λόγω προθεσμία παρήλθε χωρίς ουσιαστική πρόοδο των εργασιών, αλλά και χωρίς να γίνει καμία παρέμβαση από την απελθούσα ηγεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για επίλυση των προβλημάτων που προέβαλε ο ανάδοχος.

Στις αρχές Ιανουαρίου 2010, σε ευρεία σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων εξετάστηκαν όλες οι αιτιάσεις που προέβαλε η ανάδοχος εταιρία, η οποία μεταξύ των άλλων έθεσε το ζήτημα των εμποδίων από την αρχαιολογική υπηρεσία και επιπλέον ζήτησε ποσό 1,2 εκ.



ευρώ (με Φ.Π.Α.) για θετικές ζημιές από τις καθυστερήσεις του έργου αλλά και Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 3,8 εκ. ευρώ.

Αμέσως ξεκίνησε σειρά επαφών της Περιφέρειας με εκπροσώπους του αναδόχου προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που προέβαλε ο ανάδοχος. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κλιμάκιο από το Υπουργείο Πολιτισμού με επικεφαλής την Γενική Γραμματέα μετέβη στην Πάτρα, στις 22-3-2010 και επισκέφτηκε το έργο. Ενώ αναζητούσε λύση, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν δυο Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες χρονολογούνταν από το 2003 και 2008 και οι οποίες επέτρεπαν να συνεχιστεί το έργο. Κι όμως το έργο δε συνεχίστηκε ούτε ζητήθηκε από τον τότε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας η διακοπή εργασιών. Μετά την επίσκεψη του κλιμακίου, το Υπουργείο Πολιτισμού συγκρότησε επιτροπή που εξέτασε διεξοδικά το ζήτημα και απάντησε εγγράφως στις 9-4-2010 ότι μπορεί να συνεχιστούν οι εργασίες κατασκευής του έργου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απέρριψε την απαίτηση του αναδόχου για καταβολή θετικών ζημιών και η ανάδοχος εταιρία έχει υποβάλλει σχετικά αίτηση θεραπείας στο Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Επιπλέον, δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για Συμπληρωματική Σύμβαση. Στην πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να υποβάλλει η εταιρία αίτηση παράτασης εργασιών και να συνεχίσει τις εργασίες που απορρέουν από τη σύμβασή της στο φυσικό αντικείμενο έργου, αυτή αρνήθηκε και υπέβαλε αίτηση διάλυσης της σύμβασης και δήλωσε διακοπή εργασιών. Τελικά η εργολαβία διαλύθηκε με την από 17-5-2010 Απόφαση της ΔΕΚΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επειδή είχε υπερβεί την οριακή προθεσμία.

Σημειώνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν ευθύνες και παραλείψεις υπαλλήλων ή υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προκηρύξει νέα εργολαβία προκειμένου να ολοκληρωθεί το εν λόγω τμήμα της Μικρής Περιμετρικής Οδού, ενώ το έργο δεν πρόκειται να πληρωθεί από εθνικούς πόρους καθώς ήδη έχει μεταφερθεί ως έργο γέφυρα από το Γ' ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ.


Επιπλέον, δεν έχει γίνει καμιά πληρωμή από τον Οκτώβριο του 2009 και μετά στον συγκεκριμένο ανάδοχο για το έργο της Μικρής Περιμετρικής.

Τέλος, επειδή τα ζητούμενα προς κατάθεση έγγραφα είναι πολλά και ογκώδη, ο κ. Βουλευτής μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας όπου και φυλάσσονται, προκειμένου να ενημερωθεί.

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

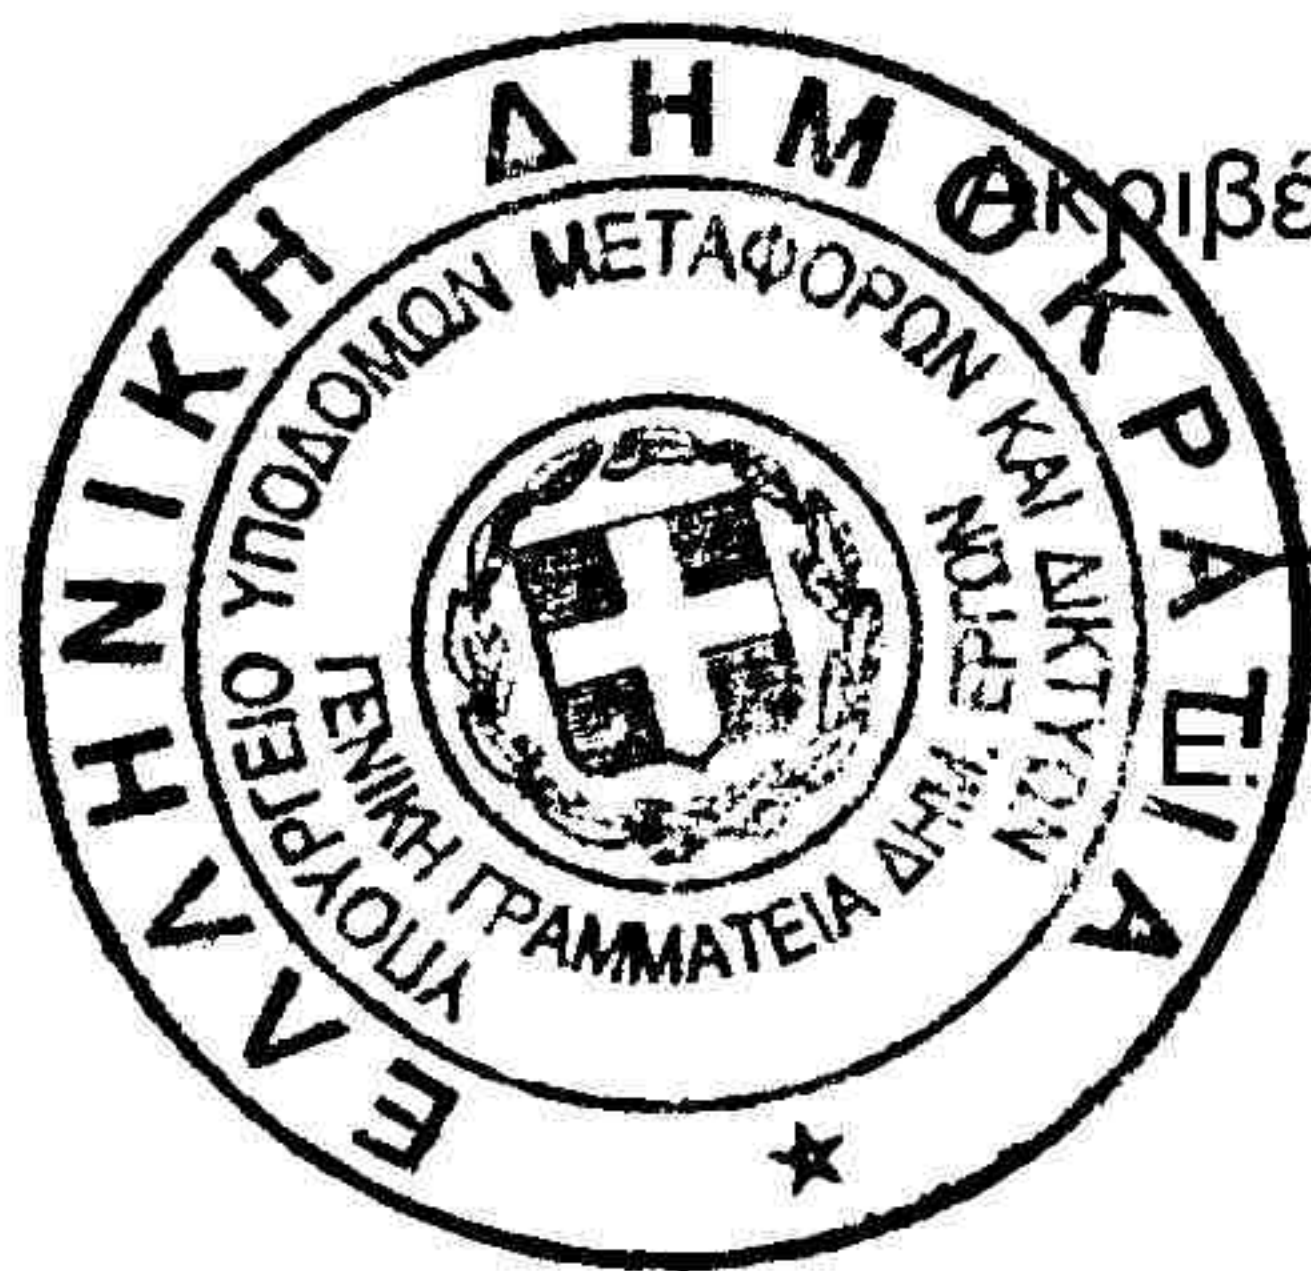

Ακριβές Αντίγραφο

Σταμάτη
