

13 JUL 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 13/7/2010
Αρ. Πρωτ. 1054

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Λειτουργία του έργου «Νέο κτίριο αεροσταθμού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου».

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 12136/24-6-2010 που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Βουλευτές κ.κ. Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός

ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Φώτη Κουβέλη
2. Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη
3. Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη
4. Βουλευτή κ. Γρηγόρη Ψαριανό

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους κ.κ. Βουλευτές τα εξής :

Το έργο «Νέο κτίριο αεροσταθμού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου» δημοπρατήθηκε στις 21-11-2005, με προϋπολογισμό μελέτης 23.258.000 ευρώ.


Σημειώνεται ότι το έργο σύμφωνα με τη μελέτη της ΥΠΑ είχε προϋπολογισμό 29.382.000 ευρώ αλλά λόγω έλλειψης πιστώσεων ο προϋπολογισμός του μειώθηκε κατά 20% περίπου, με αποτέλεσμα το έργο που δημοπρατήθηκε να μην είναι άρτιο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 23.8.2006 με συμβατικό ποσό 13.195.000 ευρώ περίπου και συμβατική ημερομηνία περαίωσης στις 3.11.2008, η οποία με απόφαση της προηγούμενης Κυβέρνησης παρατάθηκε μέχρι 30.4.2010.

Στις 2/10/2009 εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου σύμφωνα με τον οποίο η δαπάνη του ανέρχεται σε 17.360.457 ευρώ (αύξηση 24,26%).

Το έργο έχει εκτελεστεί κατά 95% και οι ως τώρα υποβληθείσες από τον ανάδοχο πιστοποιήσεις ύψους 16.046.274 ευρώ έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους και δεν υφίσταται οικονομική εκκρεμότητα. Παράλληλα δε έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για την ολοκλήρωση του έργου.

Handwritten signature or mark.

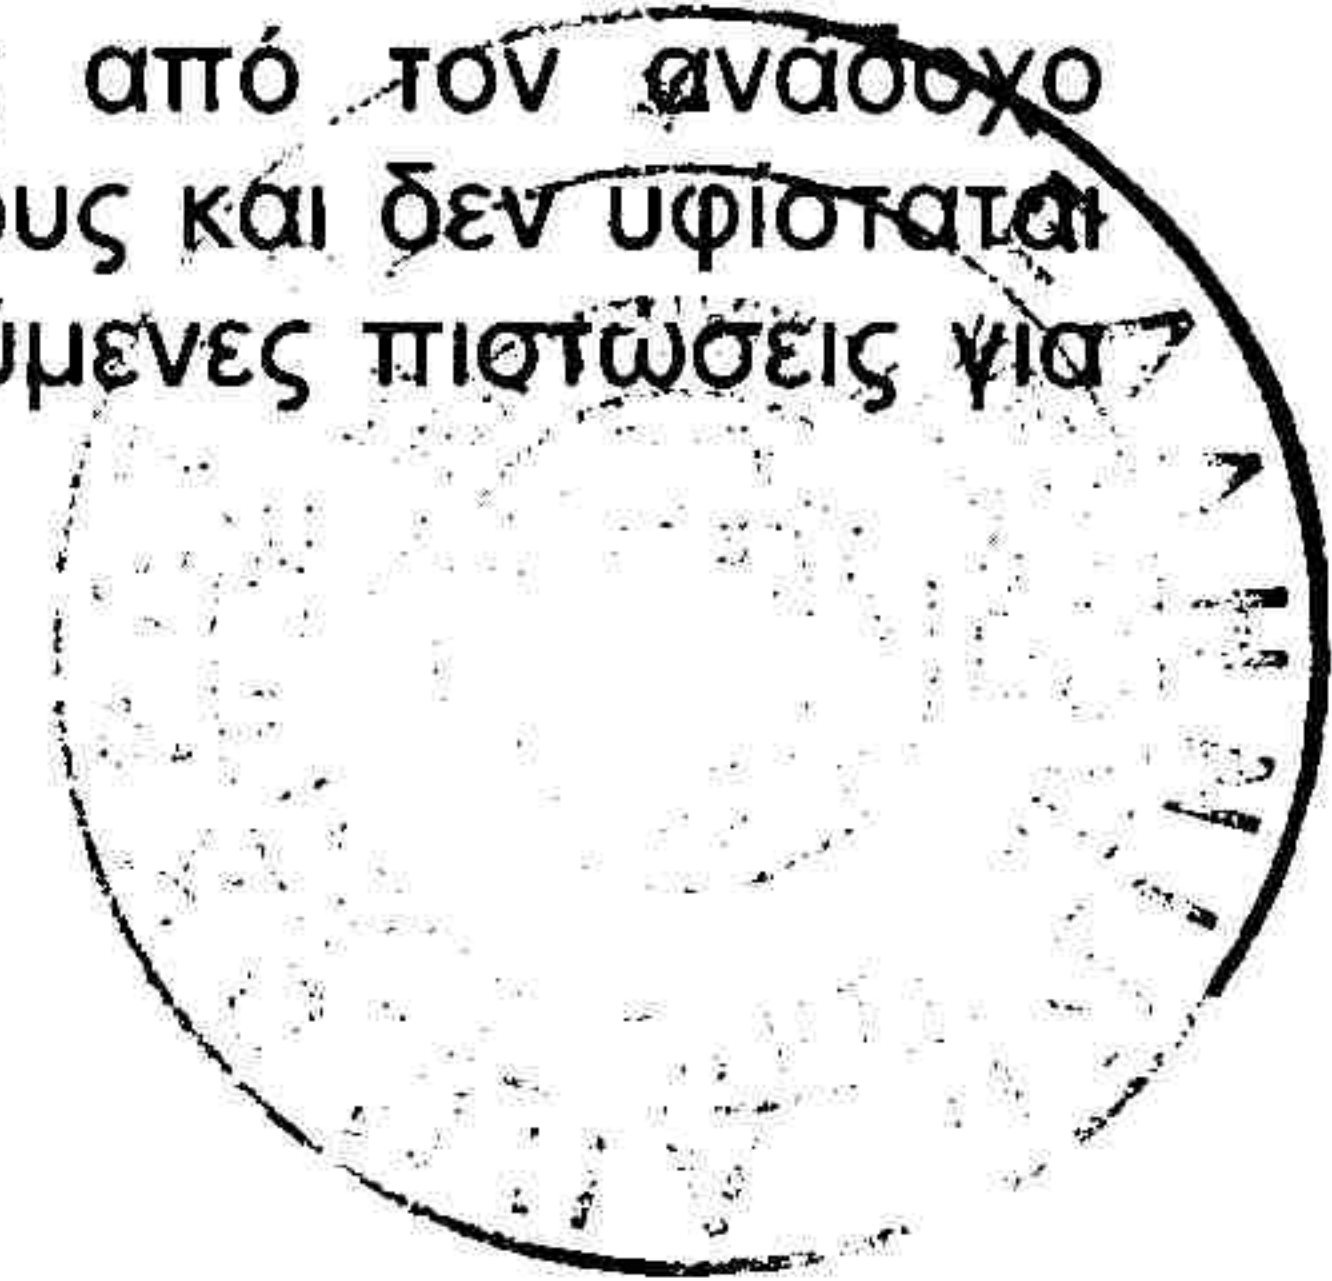


Το έργο θα δοθεί προς λειτουργία και χρήση εντός της τρέχουσας τουριστικής περιόδου. Όσον αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση του έργου, που αναφέρονται στην Ερώτηση και οι οποίες οφείλονται στην μείωση του προϋπολογισμού κατά το χρόνο δημοπράτησης καθώς και σε μεταγενέστερες οδηγίες της ΥΠΑ, σας πληροφορούμε ότι αυτές θα δημοπρατηθούν άμεσα με νέο έργο σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΥΠΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

**Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου**

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

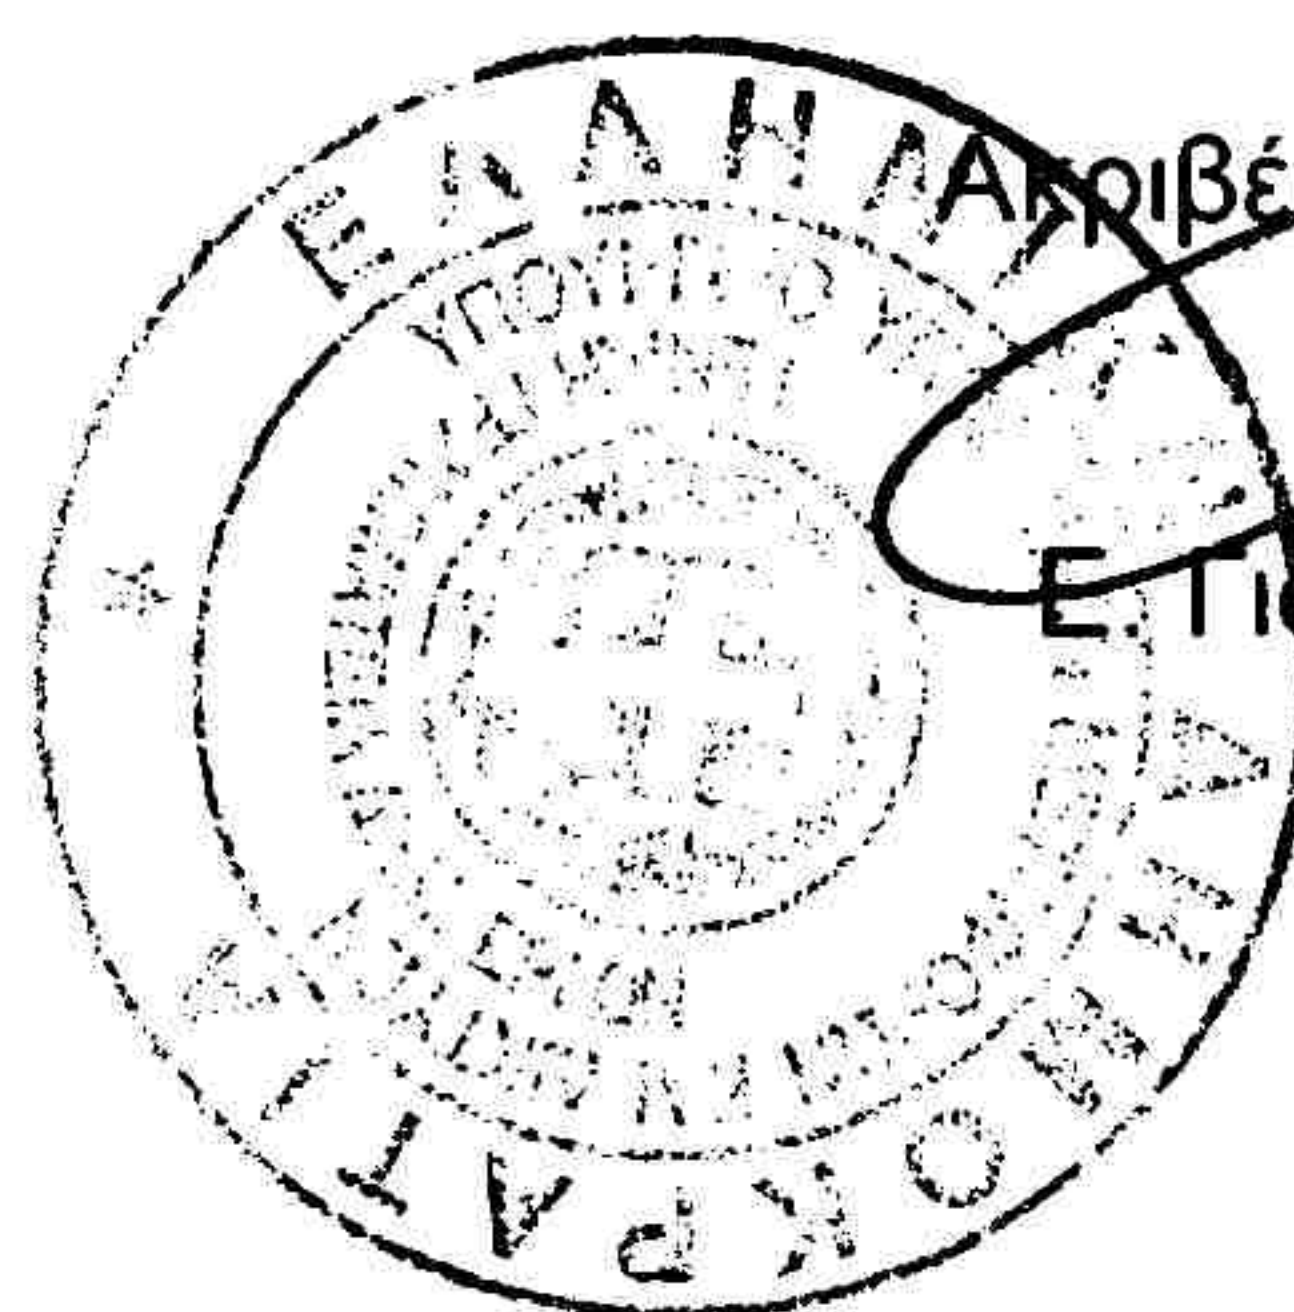Ακριβές αντίγραφο

Ε. Γιοβάνογλου
