

3751
22.7

21/7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 21/7/2010

Αρ. Πρωτ 351/352/360/362

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

✓ Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την κατασκευή του έργου του χειμάρρου Διακονιάρη στο Ν. Αχαΐας

ΣΧΕΤ.: Οι ΠΑΒ 3658/28.6.2010, 3638/28.6.2010, 3751/1.7.2010, & 3806/5.7.2010 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Μπεκίρης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Αναφορών, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή ότι η ίδια ερώτηση έχει απαντηθεί στον ίδιο Βουλευτή, με το αρ.πρωτ.330/6.7.10 έγγραφό μας, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε.


Συνημμένο
Το από 6.7.10
εγγράφο μας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

Ακριβές αντίγραφο
Ε. Γιοβάννιου

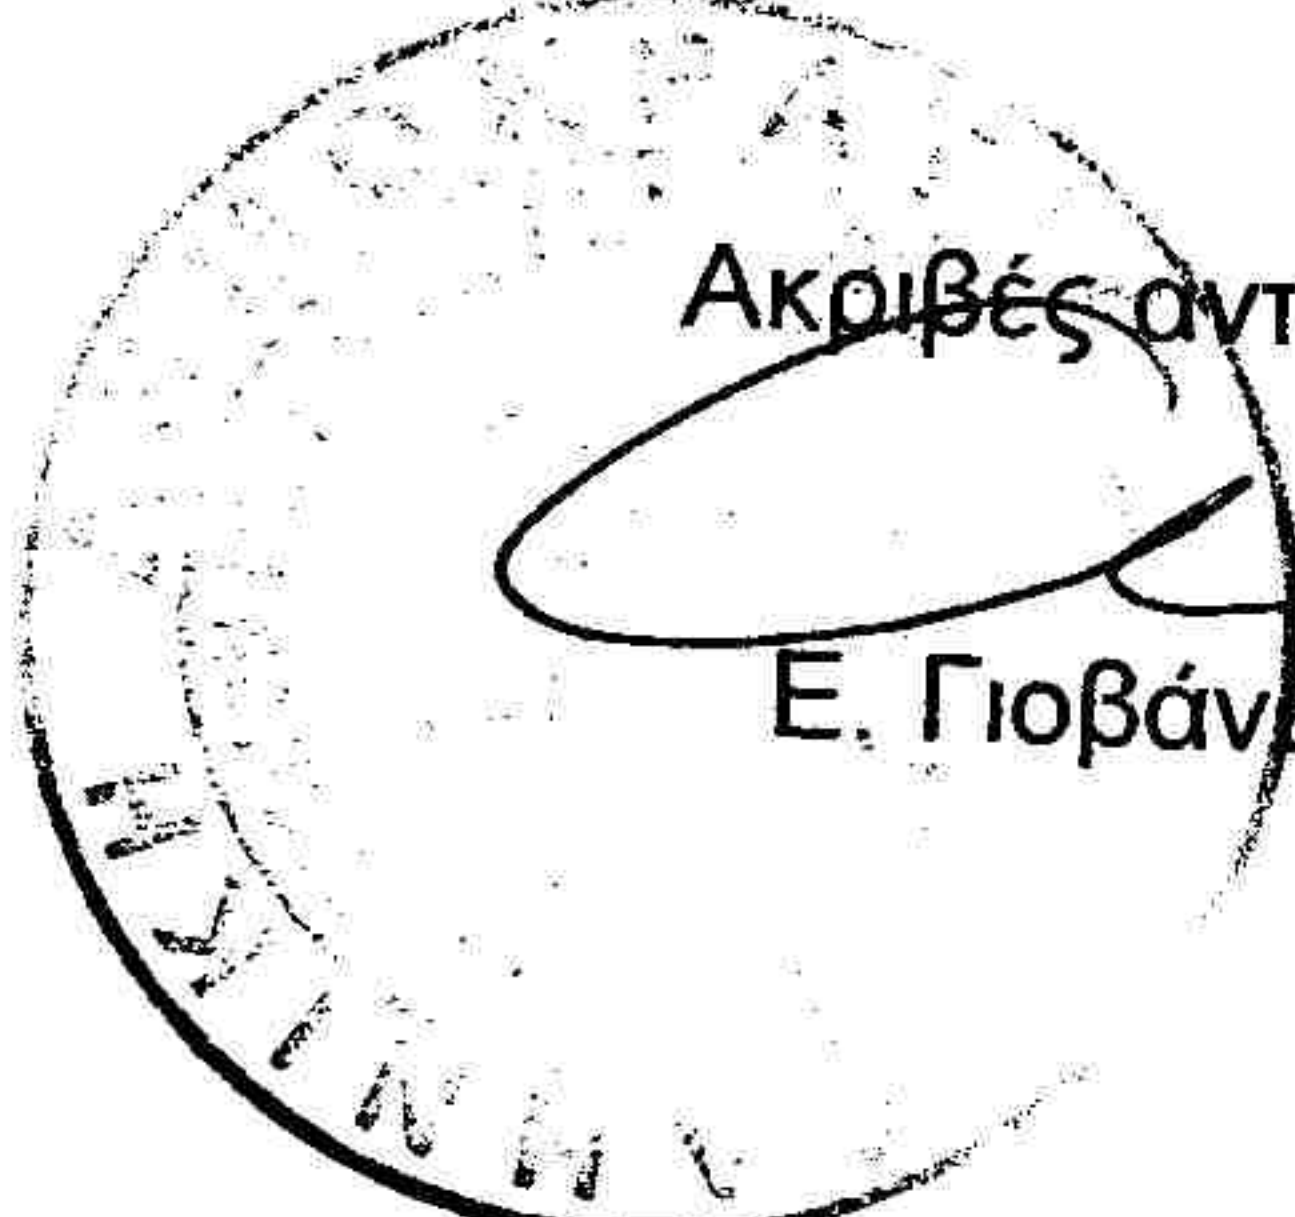

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 6/7/2010

Αρ. Πρωτ 330

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις από τη στασιμότητα της κατασκευής του έργου του χειμάρρου Διακονιάρη στο Ν. Αχαΐας

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 3394/11.6.2010 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Μπεκίρης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Η υπογραφή της σύμβασης για το έργο του Διακονιάρη υπεγράφη στις 05-07-2005 για ποσό 50.842.350,36 ευρώ και ημερομηνία περαίωσης 10-01-2008. Στις 16-07-2009 υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση εργασιών ποσού 5.884.550 ευρώ και εκδόθηκε 4^η Απόφαση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-05-2010.

Τα προβλήματα στο έργο ξεκίνησαν από την υπογραφή της σύμβασης και κορυφώθηκαν το 2008. Τούτο προκύπτει από τις απορροφήσεις του έτους 2009, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 2.167.000 ευρώ εκ των οποίων τα 1.627.000 ευρώ αφορούσαν εργασίες της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης. Επομένως υπήρχαν συσσωρευμένα προβλήματα στο έργο για τα οποία δεν είχε ληφθεί καμία μέριμνα.

Στους πρώτους 6 μήνες του έτους 2010 κατεβλήθη προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων στο έργο, με αποτέλεσμα η απορρόφηση στους πρώτους 6 μήνες του έτους 2010 να είναι όση ήταν ολόκληρο το 2009.

Παρά την καταβληθείσα προσπάθεια, προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται οφειλόμενα στην Ανάδοχο Εταιρεία και για τα οποία από δω και στο εξής θα εφαρμοστούν όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων.

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

