

11 FEB. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 11/2/2011

101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αρ. Πρωτ : 2159/2208/620

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων- Αναφορών

ΘΕΜΑ : Πορεία εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Νέας Χάραξης Βελτίωσης της Επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι»

ΣΧΕΤ : 1) Η Ερώτηση 9965/27.1.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καντερές.
2) Η Ερώτηση 10467/4.2.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Θανάσης Λεβέντης.
3) Η ΠΑΒ 2952/31.1.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη-Γραφείο Υπουργού
2) Βουλευτή κ. Νικόλαο Καντερέ
3) Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη
4) Βουλευτή κ. Αθανάσιο Μπούρα

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών (Ερωτήσεων-Αναφοράς), παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ.κ. Βουλευτές ότι το έργο του θέματος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αλλά της οικείας Περιφέρειας Αττικής.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε το υπ'αρ. 3134/1331/8.2.2011 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Συνημμένα

Το υπ'αρ. 3134/1331/8.2.2011
έγγραφο με τα συνημμένα του
(σελ.4)

Εσωτ.Διανομή

Γρ.Κοιν.Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ε. Γιόβανογλου

✓



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

2159 21/2
Αθήνα, 8 -02-2011
Αρ.Πρ.: 3134/1331

Ταχ. Διεύθυνση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας: 115 25
TELEFAX: 210 6709700
Πληροφορίες: Δ. Μπελντέκος
Τηλέφωνο: 210 6709687
210 6709602-3

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ : Η υπ' αριθμ. 9965/27.01.2011 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Νικόλαος Καντέρης και η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας με fax στις 01.02.2011, σας αποστέλλουμε το υπ' αρ. 337/03.02.2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

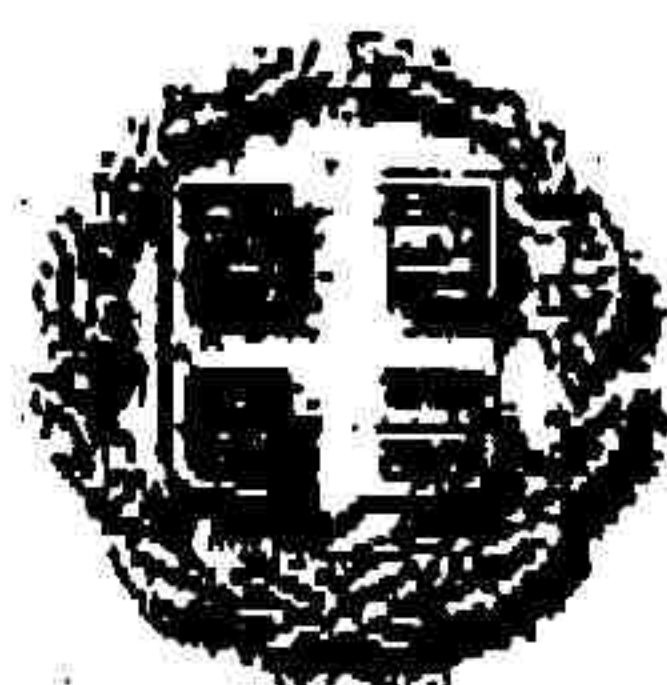

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ. 3382/1409
Ημερ. Εισόδου: 3/2/11

Αθήνα 03-02-2011

Α.Π.: 337

Β'
2/2/11
Σ

Πληροφορίες : Τάκης Καραπαναγιώτης
Τηλέφωνο : 2131501519
FAX : 2131501501
e-mail : pkarapanagiotis@mou.gr

Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
FAX: 210-6709712

ΘΕΜΑ : Προβλήματα στην υλοποίηση του έργου «Κατασκευή νέας
χάραξης βελτίωσης επαρχιακού οδού από Μέγαρο μέχρι
Αλεποχώρι –πεδινό τμήμα».

ΣΧΕΤΙΚΟ : Το με αριθμό 2159/01-02-2011 έγγραφο του Γραφείου
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠ.ΜΕΤ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, που αφορά ερώτηση προς τον κ. Υπουργό
ΥΠ.ΜΕΤ. , σας στέλνουμε φωτοαντίγραφο του Δελτίου τύπου της Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, που μας κοινοποίησε η Διεύθυνση Τεχνικών
Εργών, προκειμένου να ενημερώσετε αρμόδια.



ΔΚΡ:ΒΕΣ ΑΝΤ.Π.Α.ΔΕ




Μαρίνα Μπετέρη

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΑΣ

Κ.Λ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΣ



ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. Συγγρού 98 - 100, 11741 Αθήνα Τηλ: 210 9287000 Fax: 210 9287001
email: attika@mou.gr ιστοσελίδα: <http://www.peraa.gr>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ελευσίνα 28 Ιανουαρίου 2011

Ταχ. Δ/ση: Μουσίων Πολυτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας: 192 00 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 213 2047060
FAX: 210 5560807
Πληροφορίες: Μαρούγκα Μαρία
Ηλεκτρ. Δ/ση: antipad@otenet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**«Πορεία εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή Νέας Χάραξης Βελτίωσης
Επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι"»**

Το έργο «Κατασκευή Νέας Χάραξης Βελτίωσης Επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι» δημοπρατήθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής και μετά την ανάδειξη Αναδόχου υπεγράφη Σύμβαση ποσού 6.996.353,17 € στις 25 Ιουλίου 2006. Το έργο ξεκίνησε και στην εξέλιξη των εργασιών ανέκυψε η αναγκαιότητα σύναψης δύο Συμπληρωματικών Συμβάσεων, η πρώτη εξ αυτών ύψους 2.490.954,98 € στις 03 Φεβρουαρίου 2010 και η δεύτερη ύψους 1.386.196,40 € στις 11 Ιουνίου 2010.

Από την Αρχική Σύμβαση και από την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση έχει πιστοποιηθεί συνολικά ποσό 5.257.675,11 €.

Όταν στις 20 Ιουλίου 2010 ο Ανάδοχος του έργου κατέθεσε την 7^η εντολή πληρωμής, με πιστοποιούμενο αντικείμενο 1^η και 2^η Συμπληρωματικής, ποσού 1.384.412,95 €, η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής, η οποία ήταν αρμόδια για το έλεγχο των δαπανών της Ν.Α.Δ.Α., επέστρεψε τον λογαριασμό και ζήτησε να υποβληθούν και οι δύο Συμπληρωματικές Συμβάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, παρότι είχε ήδη εγκρίνει την 6^η Εντολή Πληρωμής που αφορούσε εργασίες για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση. Την απαίτησή της αυτή τη στήριξε σε νεότερη Απόφαση του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που άλλαζε τα μέχρι πρότινος δεδομένα στους προσυμβατικούς ελέγχους. Πιο συγκεκριμένα η προαναφερόμενη Απόφαση όριζε ότι, εφεξής θα γίνεται προσυμβατικός έλεγχος για οποιοδήποτε ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης, εν αντιθέση με τα μέχρι τότε ισχύοντα που προέβλεπαν προσυμβατικό έλεγχο για ποσά άνω των 5.000.000,00 €. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ως άνω Απόφαση εκδόθηκε μετά την ημερομηνία υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και άρα δεν έπρεπε να γίνει εφαρμογή της για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μετά την υπογραφή της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η Ν.Α.Δ.Α. (υπηρεσία μας) απευθύνθηκε στο 5^ο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο απείχε του σχετικού ελέγχου, με την αιτιολογία ότι δεν είναι δυνατό να γίνει

ΗΜΕΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 27-01-2011

03 Feb 2011 12:59PM ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΑΔΑ

πρόσυμβατικός έλεγχος των Συμπληρωματικών Συμβάσεων, αφού ήδη είχαν υπογραφεί οι εν λόγω δύο Συμπληρωματικές Συμβάσεις.

Για την υπόθεση αυτή υπεβλήθη Αίτηση Ανάκλησης από τη Ν.Α.Δ.Α., η οποία εξετάστηκε τελικά στις 14 Ιανουαρίου 2011 από το αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά την εκδίκαση ο Επίτροπος κατέθεσε θετική γνώμη και αναμένεται ότι η Απόφασή θα δικαιώσει την πλέον Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Μέχρι να λήξει όμως η υπόψη διαδικασία, ο Ανάδοχος δεν μπορεί να πληρωθεί, όχι μόνο για την 7^η εντολή πληρωμής, αλλά και για όσες εργασίες έχει ήδη εκτελέσει από τις 20 Ιουλίου 2010 έως και σήμερα, με αποτέλεσμα αυτή η εκκρεμότητα να περιορίσει προσωρινά τη δραστηριότητά του, γιατί δεν μπορεί να πληρωθεί και ήδη έχει συγκεντρωθεί ένα μεγάλο οφειλόμενο ποσό.

Πάραυτα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) είναι σε διαρκή επικοινωνία τόσο με την Τροχαία Μεγάρων όσο και με τον Ανάδοχο προκειμένου να αντιμετωπίζονται από κοινού τρέχουσες ανάγκες για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Συγκεκριμένα, η σήμανση του έργου χαρακτηρίζεται πλήρης και επαρκής, η δε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α. και ο Ανάδοχος βρίσκονται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με την Τροχαία Μεγάρων, η οποία περιοδεύει τακτικότερα το έργο και υποδεικνύει άμεσα τις όποιες παρατηρήσεις της, τις οποίες εγκαίρως ο Ανάδοχος εκπληρώνει και η Τροχαία Μεγάρων επιβεβαιώνει.

Σημειώνουμε ότι κανένα τμήμα του έργου δεν έχει αποπερατωθεί πλήρως, η εργασία προχωρεί ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα και φάσεις, το δε οδόστρωμα σε τελική στρώση θα κατασκευαστεί ενιαίο (σεντόνι), για την αποφυγή κατασκευαστικών σπλειών. Στην παρούσα φάση έχει εκτελεστεί η πρώτη στρώση του οδοστρώματος.

Το έργο έχει προθεσμία αποπεράτωσης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011, αλλά λόγω των προαναφερόμενων συνθηκών προβλέπεται ότι θα χρειαστεί να δοθεί παράταση της προθεσμίας παράδοσης του έργου, καθώς εκκρεμούν και διαδικασίες απαλλοτρίωσης.

Η Αντιπεριφερειάρχης κα Σταυρούλα Δήμου επιβλέπει τις διαδικασίες και έχει δώσει σαφείς οδηγίες στους επιβλέποντες μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α. για άμεση και απρόσκοπτη αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την αναστολή εργασιών του έργου. Επιπλέον σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία ασκεί κάθε δυνατή πίεση για επίλυση της έκδοσης Απόφασης από το αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να πληρωθούν τα οφειλόμενα ποσά των πιστοποιήσεων και να ολοκληρωθεί το έργο.
