



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416



Αθήνα, 13-03-2012
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/49/5842

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:


- 1) Βουλευτή κ. Σ. Κεδίκογλου
- 2) ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 10432, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 5592/09-02-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5592/09-02-2012 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Σ. Κεδίκογλου, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/715/20-02-2012 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Ι. Μανιάτης

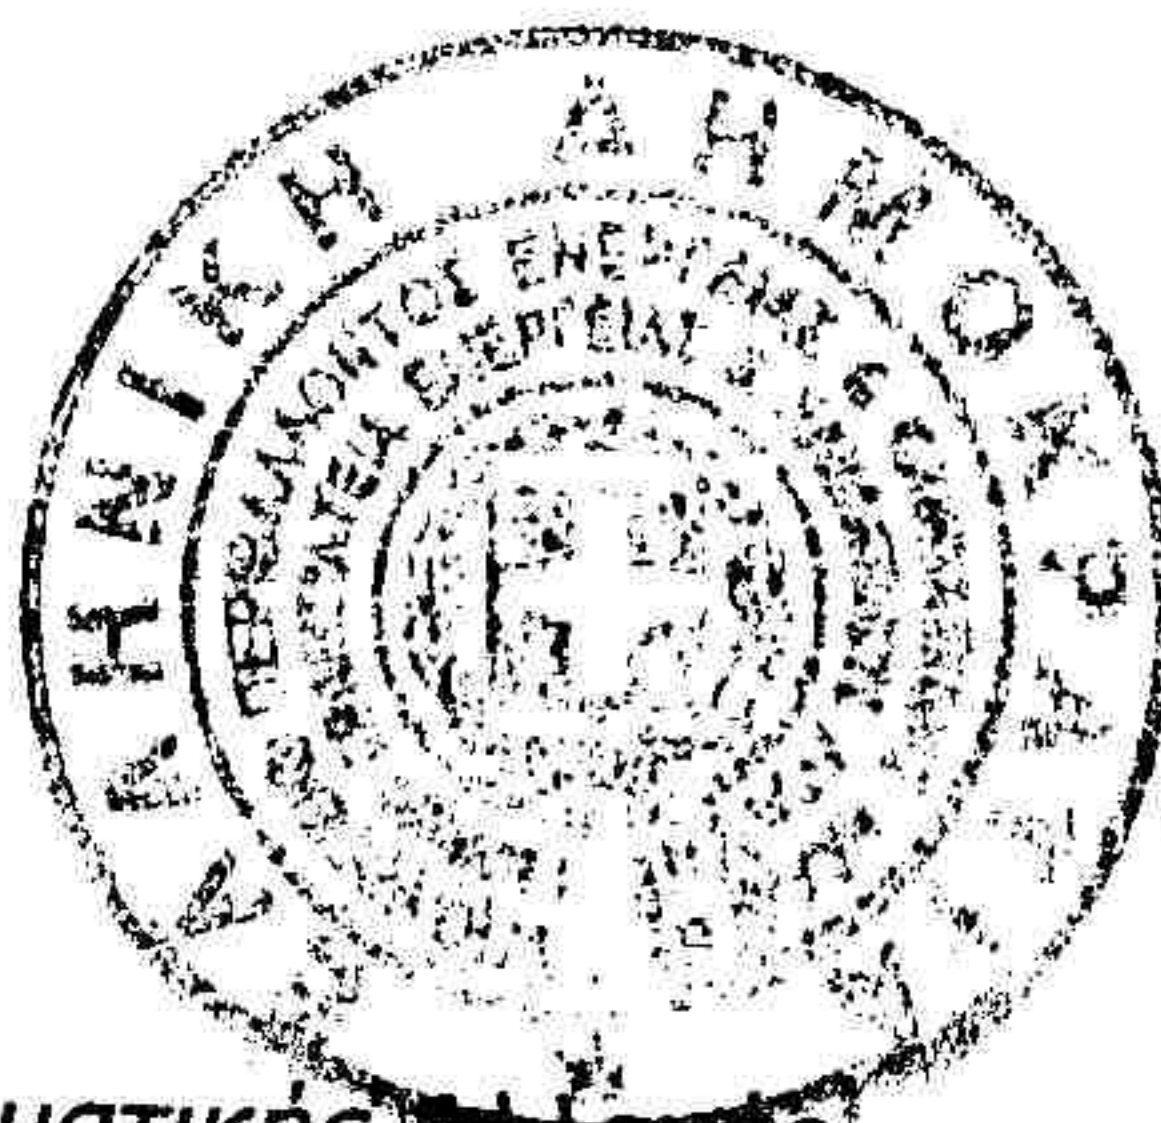

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΡΤΥΡΟΠΟΝΤΟΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής

1/2



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ. : ΓρΔ/715/20-2-12

ΠΡΟΣ : κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή.

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 5592/9.2.12 ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής Συμεών Κεδίκογλου.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 5592/9.2.12 ερώτησης του Βουλευτή κ. Συμεών Κεδίκογλου, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Με τη Σύμβαση ΔΜΚΘ-1161701, που υπογράφηκε στις 17.10.2007, ανατέθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό, στην εταιρία ΜΕΤΚΑ Α.Ε., η μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο 5 στον ΑΗΣ Αλιβερίου, συνδυασμένου κύκλου, καθαρής ισχύος 416,95 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο, έναντι συμβατικού τιμήματος 219,16 εκ. €. Έκτοτε, έχουν εκδοθεί τέσσερα (4) Συμπληρώματα της Σύμβασης στα οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν :

α. Συμπλήρωμα Νο 1 :

- η τροποποίηση του τρόπου πληρωμής του ως άνω συμβατικού τιμήματος, έτσι ώστε οι πληρωμές, αντί με ποσοστιαίες δόσεις που αντιστοιχούν στο χρόνο υλοποίησης σταδίων του Έργου, να γίνονται βάσει του Πίνακα Υλικών και Τιμών της Σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτοτελώς και κατά προτεραιότητα το θέμα της ομαλής χρηματοδότησης του υπόψη Έργου.

β. Συμπλήρωμα Νο 2 :

- η καταβολή στον Ανάδοχο του ποσού των 21,978 εκ. € για την κάλυψη των επιβαρύνσεων που υπέστη λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση του Έργου μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του υπόψη Συμπληρώματος, ήτοι 06.05.2010



- η καταβολή στον Ανάδοχο του ποσού των €150.000, για τις πρόσθετες δαπάνες του, για τη διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού, για την αρχαιολογική έρευνα, για τη μεταφορά και αποθήκευση εξοπλισμού του έργου σε νέες αποθήκες, την αποξήλωση και επανεγκατάσταση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων απομάκρυνσης των αποθηκών εξοπλισμού καθώς και των νέων απαιτήσεων κατεδαφίσεων και αλλαγών για την όδευση του αγωγού ψύξεως και το κανάλι εκβολής,
- η καταβολή στον Ανάδοχο του ποσού των 9,022 εκ. € για την προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού, λόγω αλλαγής της γενικής διάταξης του έργου και λόγω τροποποιήσεων του συστήματος ψύξης της νέας Μονάδας.

γ. Συμπληρώματα 3 & 4 :

- η καταβολή στον Ανάδοχο του ποσού των 9 εκ. € για την επέκταση της συμβατικής περιόδου εγγύησης του Έργου, η οποία έληγε στις 17.09.2011, κατά 10 μήνες.


Σημειώνεται ότι η κατασκευή της εν λόγω Μονάδας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και προκειμένου να ξεκινήσουν οι δοκιμές λειτουργίας της και να τεθεί σε Εμπορική Λειτουργία απαιτείται η ολοκλήρωση κατασκευής από τον ΑΔΜΗΕ του νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 150/400 KV, η οποία αναμένεται εντός του Μαΐου 2012 και η ολοκλήρωση κατασκευής από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. του αγωγού φυσικού αερίου, η οποία αναμένεται εντός του Νοεμβρίου 2012.

Διεξάγονται εντατικές συζητήσεις μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ώστε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου προς το Αλιβέρι με στόχο αυτή να επιτευχθεί εντός του Αυγούστου 2012.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στα επενδυτικά πλάνα της Επιχείρησης δεν προβλέπεται η κατασκευή νέας Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο Φ/Α για το αμέσως προσεχές διάστημα.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα εξετασθεί από την εταιρεία στο μέλλον σε συνάρτηση με την ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας και την εξέλιξη της ζήτησης Η/Ε στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

Με τιμή


Αρθούρος Ζερβός



Κοινοποιήσεις:

- Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ
κου Γ. Μανιάτη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ
κου Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ
Γενική Δ/ση Ενέργειας
Δ/ση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
