

- 9 ΑΥΓ. 2012



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522**

**Αθήνα 8-8- 2012
Αριθμ. Πρωτ.:43**

Προς:

✓ Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Φράγματα Περιφερειακής Ενότητας Χίου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 309/23-7-2012

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Κ. Τριαντάφυλλος**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής :

Αναφορικά με το έργο “Αγωγοί μεταφοράς νερού φράγματος Καλαμωτής Ν. Χίου”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 –2013, με συνολικό προϋπολογισμό 4.700.000 €, σημειώνεται ότι το έργο αφορά στην κατασκευή των αγωγών μεταφοράς και διανομής του αρδευτικού νερού από τον ταμιευτήρα του Φράγματος Καλαμωτής στις περιοχές Καλαμωτής και Αρμολίων και συναφή έργα.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 31-3-2011, για το ποσό των 2.088.725,38 € και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίσθηκε σε είκοσι μήνες. Ωστόσο, επειδή η εντολή έναρξης των εργασιών δόθηκε στις 31/8/2011, μετά την εξασφάλιση των απαιτούμενων χώρων, η περαίωση του έργου προβλέπεται έως τις 30/4/2013.

Επιπρόσθετα, στην απόφαση ένταξης της πράξης «Κατασκευή δικτύου άρδευσης φράγματος Καλαμωτής Νήσου Χίου» στο ΠΑΑ της Ελλάδας 2007 – 2013, συμπεριλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Δρόμος παράκαμψης και πρόσβασης σε στέψη φράγματος Καλαμωτής» με προϋπολογισμό 600.000 €. Στην παρούσα φάση, η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, εκπονεί σχετική μελέτη και στη συνέχεια πρόκειται να προωθηθεί για δημοπράτηση.

Σε ό,τι αφορά στο έργο “Κατασκευή Φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου”, διευκρινίζεται ότι το έργο είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (ΕΠ-ΑΑΑΥ) και η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 8-7-2005 για το ποσό των 14.512.201,23 €.

Στη συνέχεια υπεγράφησαν η 1^η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών (1^η ΣΣΕ) στις 12-9-2007 για το ποσό των 6.734.093,37 € και η 2^η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών (2^η ΣΣΕ) στις 2-7-2009 για το ποσό των 600.828,22 €. Η αναγκαιότητα των ΣΣΕ προήλθε κυρίως, λόγω προβλημάτων στη θεμελίωση του φράγματος και στην αλλαγή του τρόπου εκσκαφής για την προστασία ιστορικών μνημείων.

Το συνολικό συμβατικό αντικείμενο της Κυρίας Σύμβασης, 1^{ης} ΣΣΕ και 2^{ης} ΣΣΕ διαμορφώθηκε με τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) στο ποσό των 23.275.163,98€.


Ωστόσο, λόγω της παρέλευσης 4,5 χρόνων στη διάρκεια των οποίων δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου του φράγματος στο πλαίσιο της αρχικής Κυρίας Σύμβασης και των εγκεκριμένων δύο Συμβάσεων Συμπληρωματικών Εργασιών (1^η και 2^η ΣΣΕ), με εξάντληση του μέγιστου ορίου 50%, εγκρίθηκε η οριστική διακοπή εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου και η διάλυση της υπόψη σύμβασης δημοσίου έργου (ΥΑ 11552/20Β2/434/26-07-2010).

Ακολούθως, το ΥΠΑΑΤ προχώρησε στη σύνταξη και έγκριση μελέτης, για τον καθορισμό του υπολειπομένου αντικειμένου για την ολοκλήρωση του φράγματος, με εθνικούς πλέον πόρους.

Η δημοπράτηση του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής Φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου», προϋπολογισμού 4.950.000€ (με ΦΠΑ), πραγματοποιήθηκε στις 8-11-2011 και με σχετική απόφαση εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού (ΥΑ 17/1968/14-2-2012). Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού θα ακολουθήσει μετά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων, λόγω προσφυγών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου αυτού, είναι 12 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 27 εκατ. € περίπου (το σύνολο των δύο εργολαβιών).

Τέλος, σημειώνεται ότι, με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργείται ένα φράγμα ύψους 37 μέτρων, χωρητικότητας περίπου 3.000.000 κυβικών μέτρων, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 2.800 στρεμμάτων.

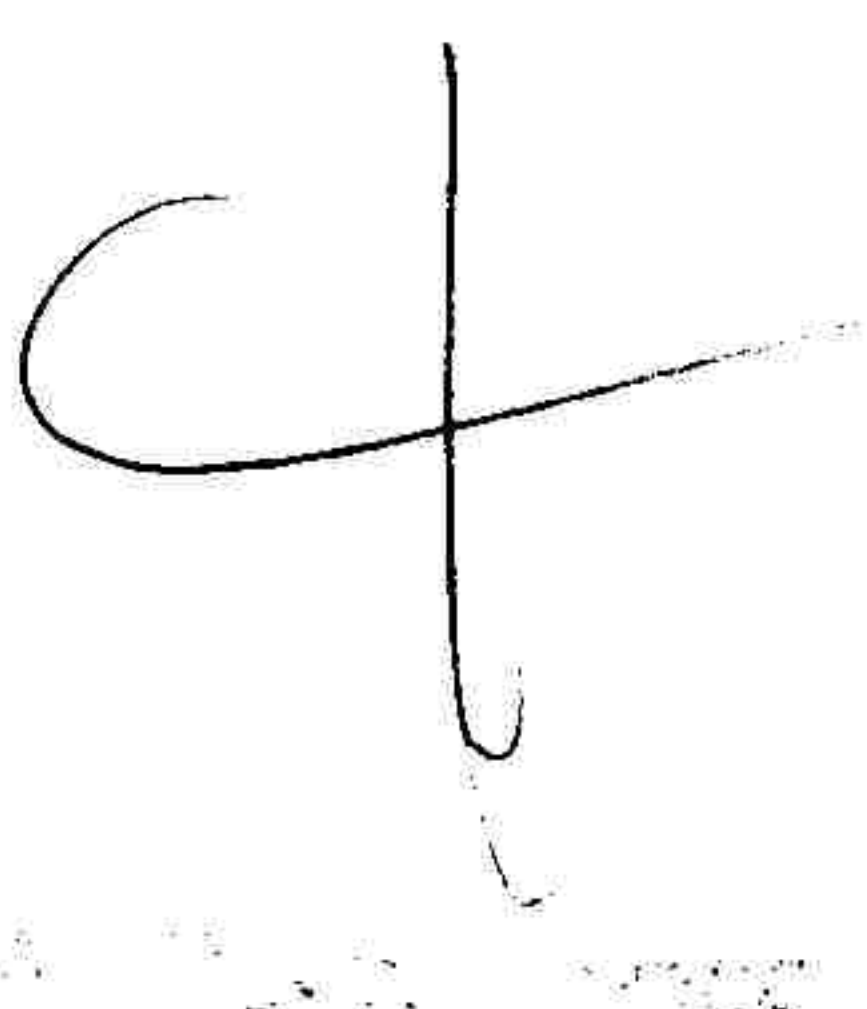

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Εσωτερικών – Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Κ. Τριαντάφυλλο
