


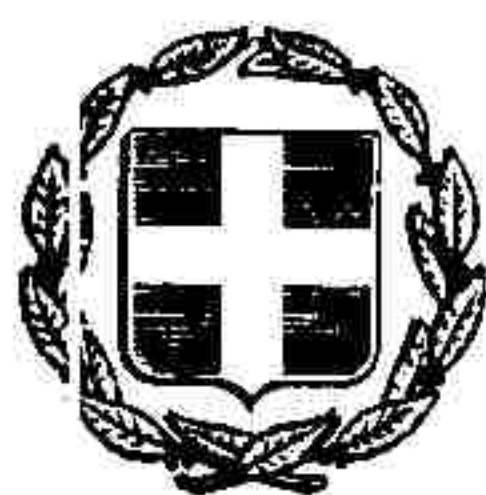

11 ΟΚΤ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 10/10/2012

Οικ: 23267

Πληροφορίες: Β. Πολυχρόνη
Τηλ.: 213-1317084
Φαξ: 210-64.62.590

ΠΡΟΣ
✓ Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων
Κοινοποίηση:
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αρ. Ερώτησης: 32

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2064/24-9-2012 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Β.Χατζηλάμπρου, κας Γεωργοπούλου-Σαλτάρη και κας Κανελλοπούλου.
Σχετικά: Το από 26-9-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Σε απάντηση της Ερώτησης των Βουλευτών κ. Β.Χατζηλάμπρου, κας Γεωργοπούλου-Σαλτάρη και κας Κανελλοπούλου, όσον αφορά στην ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στο Εθνικό Στάδιο Κάτω Αχαΐας, *-σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις τεχνικές υπηρεσίες μας-* σας γνωρίζουμε ότι, η Γ.Γ.Α. για την κατασκευή του εν λόγω κτιρίου, έχει πραγματοποιήσει συνολικά μέχρι σήμερα τρεις (3) εργολαβίες.

Η πρώτη εργολαβία έγινε τη δεκαετία του '90, δεν παρήγαγε έργο και διαλύθηκε, επειδή το οικόπεδο που παραχώρησε ο Δήμος Κάτω Αχαΐας- για την ανέγερση κτιρίου τέτοιων διαστάσεων- δεν πληρούσε τους νόμιμους όρους δόμησης και απαιτείτο τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης, διαδικασία που είναι πολύ χρονοβόρα.

Η δεύτερη εργολαβία έγινε μεταξύ Νοεμβρίου 2003 και Ιουλίου 2007, οπότε και σύμφωνα με το νόμο οριστικοποιήθηκε η διάλυσή της λόγω καθυστερήσεων πληρωμών του Δημοσίου προς τον ανάδοχο του έργου. Η ανωτέρω δεύτερη εργολαβία εκτέλεσε το 80% του τεχνικού αντικειμένου της, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α., που αφορούν τέτοιου τύπου Γυμναστήρια και το συνολικό κόστος ανήλθε στο ποσό των **665.862,47 €**.

Η τρίτη εργολαβία, που είναι σε εξέλιξη, ανέλαβε να ολοκληρώσει το κτίριο και να το παραδώσει για χρήση. Μεταξύ των άλλων, βασικές εργασίες, που προβλέπονται να γίνουν με την εργολαβία αυτή είναι : **α.** το ξύλινο δάπεδο της αίθουσας αθλοπαιδιών, **β.** τα πλαστικά καθίσματα θεατών στις κερκίδες και **γ.** οι μπασκέτες.

Σημειώνεται δε ότι οι ανωτέρω εργασίες είναι και οι κρισιμότερες για να γίνει το Γυμναστήριο χρηστικό στο αθλούμενο κοινό.

Η συνολική δαπάνη της τρίτης εργολαβίας, προβλέπεται στο ποσό των 322.751,00 € (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων ο ανάδοχος έχει μέχρι τώρα εισπράξει 65.600,00 € (με Φ.Π.Α.) καθώς εκκρεμεί πρόσθετη πληρωμή του ποσού 56.703,00 € (με Φ.Π.Α.), για εκτελούμενες εργασίες η οποία αναμένει νόμιμες εγκρίσεις, βάσει των ισχυουσών δημοσιονομικών διαδικασιών και συγκεκριμένα αναμένεται η έγκριση της ως άνω πληρωμής του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Όσον αφορά στις καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν, στην πορεία της τρίτης εργολαβίας, διαπιστώθηκαν προβλήματα στεγάνωσης του κτιρίου, επειδή αυτό ήταν εκτεθειμένο στη φθορά του χρόνου μεταξύ δεύτερης και τρίτης εργολαβίας και επειδή έπρεπε να επισκευασθούν πριν την τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου, προκειμένου να μην καταστραφεί από την έντονη υγρασία. Η στεγάνωση του κτιρίου αποκαταστάθηκε με μέριμνα και δαπάνη (24.600,00 €) του Δήμου Κάτω Αχαΐας και ολοκληρώθηκε προσφάτως.

Επιπλέον καθυστερήσεις έγιναν λόγω καθυστέρησης πληρωμών με συνέπεια το έργο να βρίσκεται νομίμως σε διακοπή.

Τέλος, μετά την πληρωμή στον ανάδοχο του εγκεκριμένου ποσού των 65.600,00 €, προβλέπεται η οικονομική δυνατότητα του να παραγγείλει και να τοποθετήσει το ξύλινο δάπεδο στο γυμναστήριο εντός 45 ημερών από το ανωτέρω γεγονός και η σταδιακή ολοκλήρωση του έργου.


**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
2. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

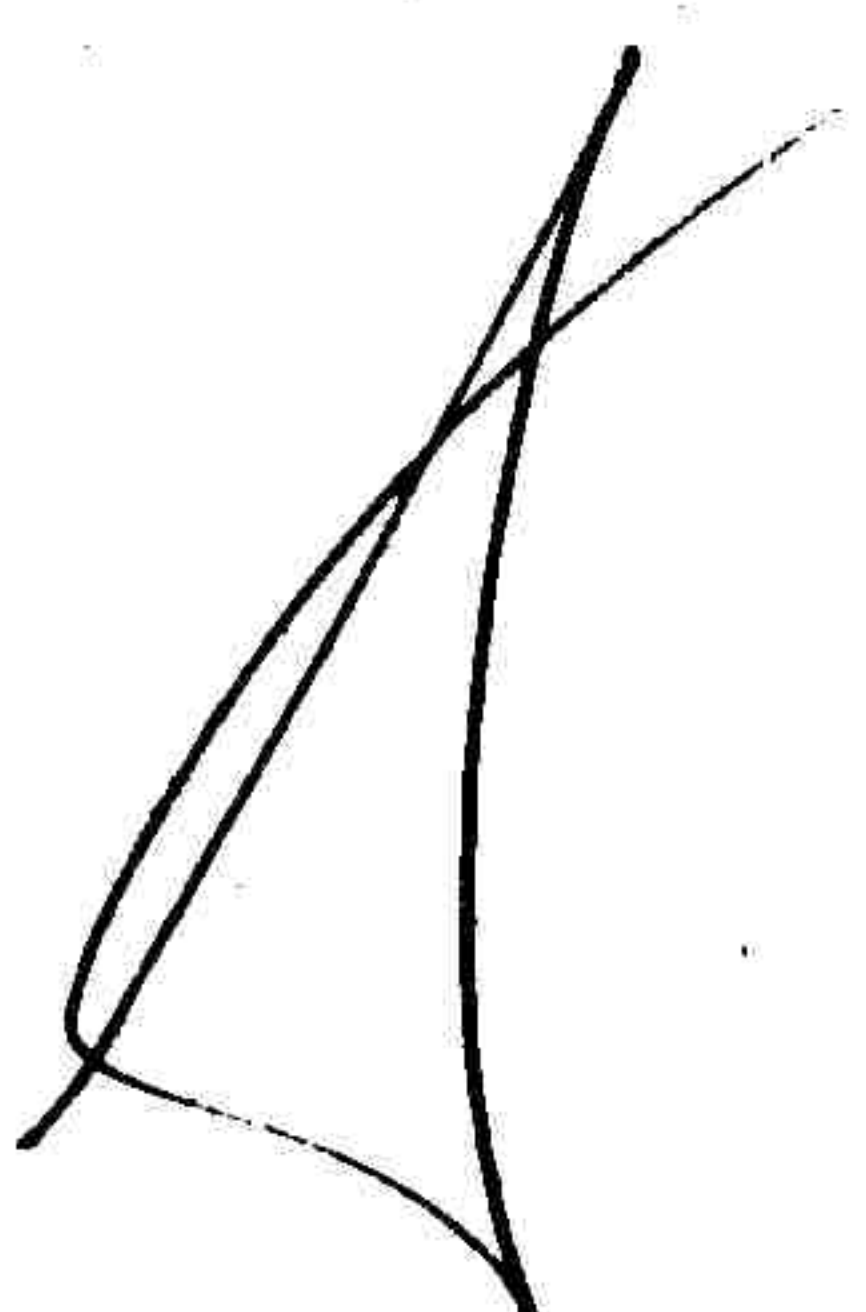

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
