



30 ΑΠΡ. 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 29 - 04 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 374/2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Δ. - Θ. Αυγερινοπούλου
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5576/21-01-2014 Ερώτηση


Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 83/2014/14-02-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, με θέμα «Καθυστερεί η ολοκλήρωση του Βιολογικού Καθαρισμού στον Δήμο Πηνειού Ν. Ηλείας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε ότι στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και, ειδικότερα στις οριζόντιες δράσεις αυτού, έχει ενταχθεί το έργο «Αποπεράτωση αποχέτευσης Γαστούνης - Βαρθολομιού», προϋπολογισμού 2.193.110 ευρώ, εκ του οποίου έχει εκπληρωθεί ποσό ύψους 2.000.000 ευρώ.

Περαιτέρω, για ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε τα ακόλουθα απαντητικά έγγραφα που περιήλθαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως εξής:

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 28963/1222/05-03-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 184/9421/24-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22373/285/28-01-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1765/05-02-2014 έγγραφο του Δήμου Πηνειού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

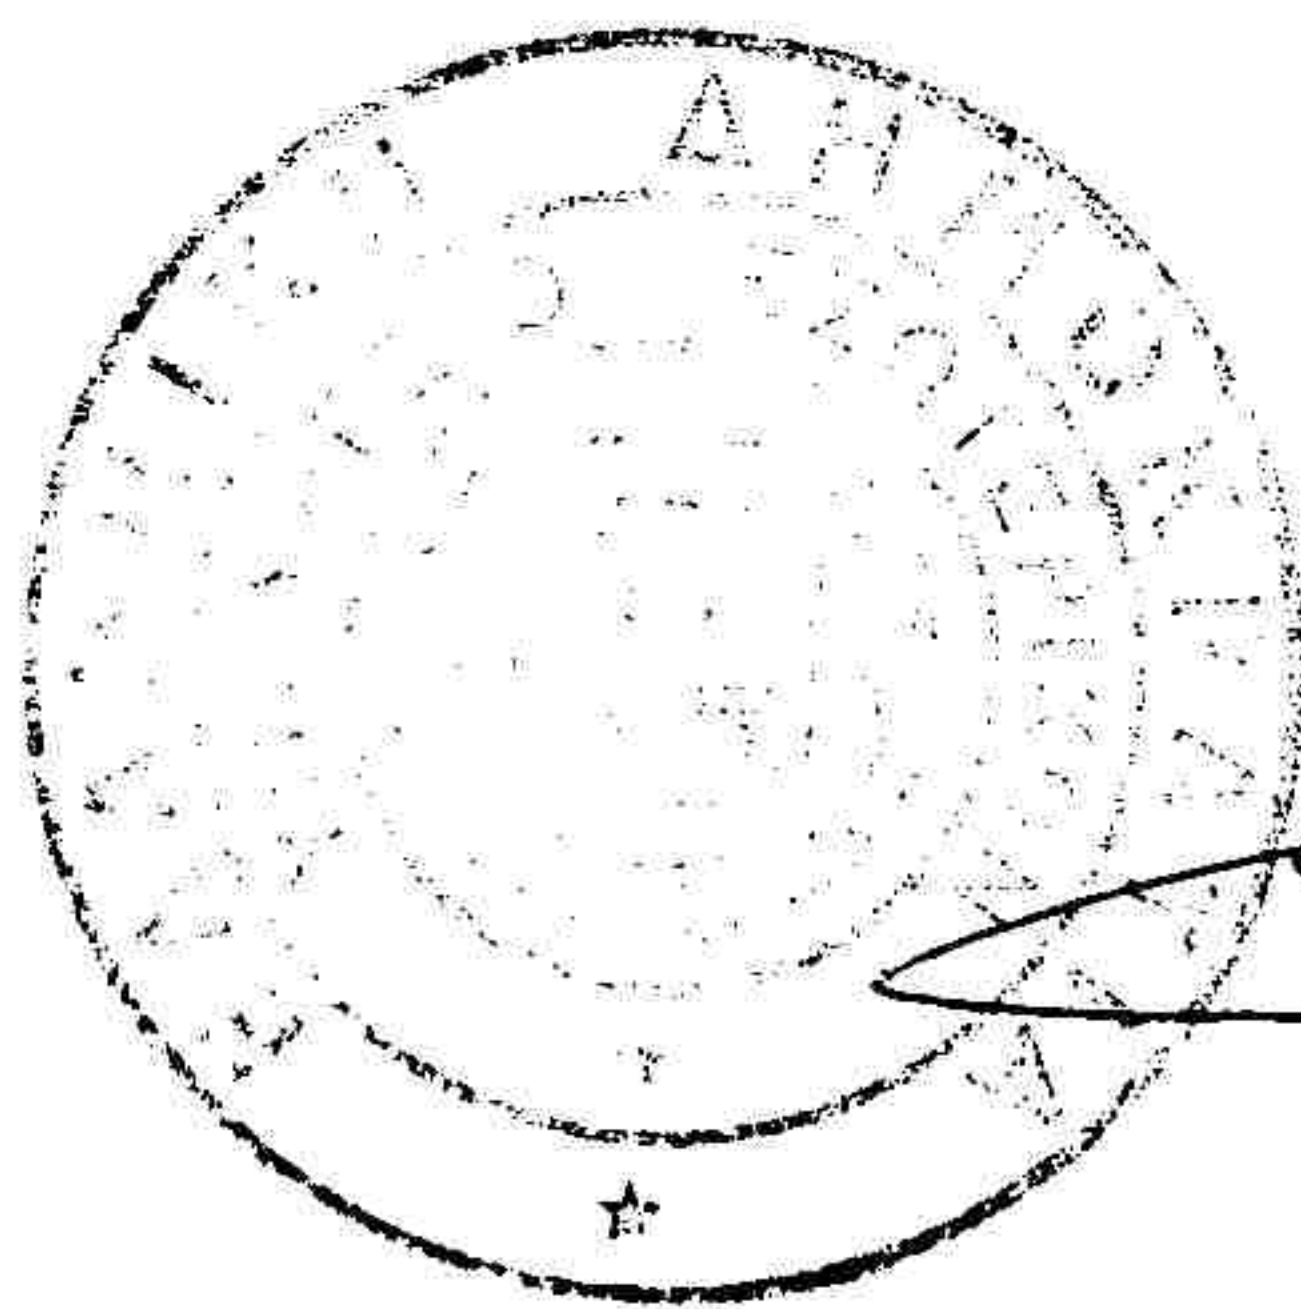

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες


Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ : - 6 ΜΑΡ. 2014

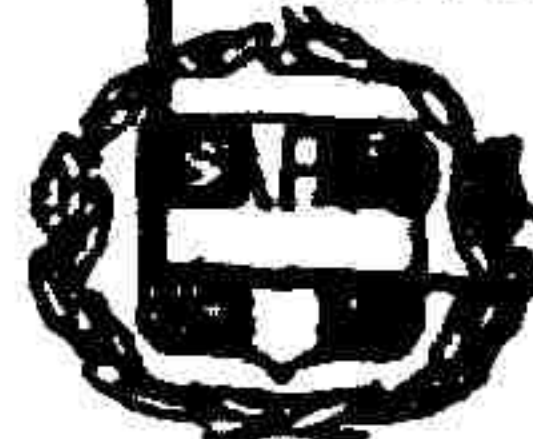

ΠΡΩΤ.:

9226

Κ. Μπερβίση

10/3

Μουρατά
210/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
Πάτρα, 5 - 3 - 2014

Αριθ. Πρωτ. οικ 28963/1222

ΠΡΟΣ: 1. Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)
210-6429137
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Οικον. & Αναπτ. Πολιτ. Τ.Α.
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)
2131364813

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Ανδρέας Κάτσενος
Τηλέφωνο : (2610) 490-330
FAX : (2610) 490-356 / 59
e-mail : diafaneia@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Καθυστερεί η ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού στο Δήμο Πηνειού Ν. Ηλείας».

ΣΧΕΤ: (α) Το με αρ. πρωτ. 2581/24-1-14 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

(β) Το με αρ. πρωτ. 2584/Β/142 έγγραφο του ΥΠ.ΕΚΑ

(γ) Το με αρ. πρωτ. 184/9421/24-1-14 έγγραφο της Δ/σης Περιβ. &
Χωρικού Σχεδιασμού

(δ) Το με αρ. πρωτ. 1765/5-2-14 έγγραφο του Δήμου Πηνειού

(ε) Το με αρ. πρωτ. 22373/285/28-1-14 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ.
Ελλάδας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 5576/21-1-14 Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα. «Καθυστερεί η ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού στο Δήμο Πηνειού Ν. Ηλείας» σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (β) (γ) κ' (δ) σχετικές απαντήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Διδασκάλου

Συνημμένα: Το (γ) (δ) κ' (ε) σχετικά

ΑΚΤΙΒΕΣ ΑΝΤΙΠΡΑΞΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού

Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33
Ταχ.Δ/ση: Τ.Θ. 5036
Ταχ. Κώδικας: 261-10
Πληροφορίες: Δ. Μαρίνος
Τηλέφωνο: 2610-461369 (εσωτ. 133)
FAX: 2610-454986
e-mail: marinosi@apd-depin.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Πάτρα, 24 / 1 / 2014
Αρ.πρωτ. 184/9421

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Απ. Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι
(Υπόψη κου Κάτσηνου)
26110 Πάτρα
FAX 2610490356

Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 9204/423/23-1-14 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκ. Διοικ. ΔΕΠΙΝ (αρ. πρωτ. υπηρ. 184/9421/23-1-14) με το οποίο μας διαβίβασε την 5576/21-1-14 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση του άνω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, δεν έχει αρμοδιότητα ούτε για την χρηματοδότηση, ούτε για την αποπεράτωση του Βιολογικού Καθαρισμού στον Δήμο Πηνειού ΠΕ Ηλείας.

Ε.Δ.
1.ΧΑ
2.Δ.Μαρίνος


Ε.Γ.Γ.
Ο Δ/ντής
α/α

ΑΡΧΙΒΕΣ ΑΝΤΙΤΕΛΟΥΣ

Πάτρα 12/03/2014

Φ. Θεοφανοπούλου
Αρχ/κτων Μηχ/κός

Δι-ηγερα Μαζδαίου

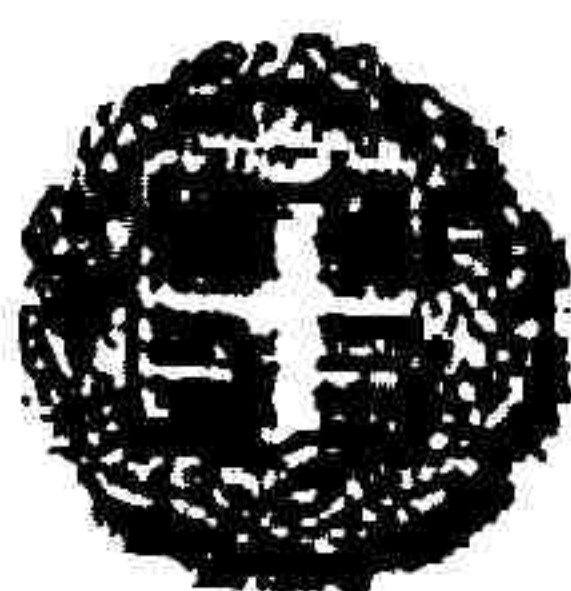

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Πάτρα 28.01.2014

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα

Πληροφορίες: Βλάσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

Αρ. πρωτ: 22373/285

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελ/νήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΚΟΙΝ : α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών κ. Νικολάου Υφαντή
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
κ. Χαράλαμπα Καφύρα
γ. Γεν. Δνση Αναπτύξ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ
δ. Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Καθυστερεί η ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού στον Δήμο
Πηνειού Ν. Ηλείας».

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 5576/21.01.2014 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Διονυσίας-
Θεοδώρας Αυγερινούπουλου.
β. Το υπ' αριθ. 9204/423/23.01.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ' αριθ. 22737/309/27.01.2014 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5576/21.01.2014 Ερώτησης της Βουλευτού κ. Διονυσίας-
Θεοδώρας Αυγερινούπουλου, με θέμα «Καθυστερεί η ολοκλήρωση του Βιολογικού
Καθαρισμού στον Δήμο Πηνειού Ν. Ηλείας», σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /Π.Ε. Ηλείας, σθεδμία εμπλοκή επί του θέματος έχουν έως
σήμερα.

Ο
Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας



Εντάξει

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΛΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γαστούνη 05-2-2014

Αριθ. Πρωτ: 1765

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Γραφείο Δημάρχου

Δ/ση: Κτίριο Σισίνη

27300 Γαστούνη

Πληροφορίες: κ. Δήμαρχο

Τηλ: 2623360751

FAX: 2623032839

Email: dimosplneiou@1312.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΥΤ. Ελλάδας & Ιονίου

Αριθ. Πρωτ: 2212/957 Γραφείο Γ. Γραμματέα

Ημερομηνία: 18/2/14

Ν.Ε.Ο Πατρών - Αθηνών 158

ΘΕΜΑ: «Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Πηνειού»

ΣΧΕΤ: το υπ' αριθμ. 9204/423/23-01-2014 έγγραφό σας

Κοινοδ. Ν. Πηνειού

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Αποπεράτωση αποχέτευσης Γαστούνης-Βαρθολομιού» δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το 2006 και όχι από τους πρώην δήμους Γαστούνης-Βαρθολομιού με προϋπολογισμό 8.000.000,00 €.

Για το λόγο αυτό στις 1-9-2006 υπογράφηκε η 1^η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Συνδέσμου Αποχέτευσης Γαστούνης-Βαρθολομιού «ΣΤΡΕΜΕΝΟΣ» με σκοπό να εκτελεί (ο Σύνδεσμος) όλες τις βεβαιωμένες δαπάνες από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στα πλαίσια της σχετικής σύμβασης (10-12-2007) που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΕΚΕ και του αναδόχου.

Δυστυχώς το έργο δεν ολοκληρώθηκε με την ανωτέρω σύμβαση και σύμφωνα με τον 4ο Α.Π.Ε που συνέταξε η Δ/σα Υπηρεσία (ΔΕΚΕ) απαιτήθηκε επιπλέον το ποσό των 3.570.000,00 € το οποίο και ζητήθηκε αλλά εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» μόνο 2.000.000,00 €.

Στη συνέχεια στις 29/9/2009 υπαγράφη η 2^η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Συνδέσμου Αποχέτευσης Γαστούνης-Βαρθολομιού «ΣΤΡΕΜΕΝΟΣ» για την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση αποχέτευσης Γαστούνης-Βαρθολομιού» συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ ύψους 2.000.000,00 € η οποία ήταν και η εξασφαλισμένη πίστωση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Προϊσταμένη Αρχή ορίστηκε η Δ/ση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/ση Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο Δήμος Πηνειού -καθολικός διάδοχος του Συνδέσμου «ΣΤΡΕΜΕΝΟΣ»- είχε αναλάβει να εκτελεί όλες τις βεβαιωμένες δαπάνες από την Διευθύνουσα Υπηρεσία ως το ποσό της 2^{ης} προγραμματικής σύμβασης ύψους 2.000.000,00 € η οποία υποχρεούταν να λαμβάνει πάντα υπόψη τις εκάστοτε αναθεωρήσεις και μεταβολές του ΦΠΑ σε συνάρτηση με την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου δεδομένου ότι το διαθέσιμο ποσό ήταν εξ' αρχής ορισμένο.

Από την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών - με αποκλειστική ευθύνη της Δ/σης Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σύμφωνα με το

υπ' αριθμ. 246734/8864/17-9-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Έργων της ΠΔΕ – υπάρχει σε εκκρεμότητα η πληρωμή του 4^{ου} λογαριασμού του έργου ποσού 193.110,00 € (με ΦΠΑ). Το ποσό αυτό υπερβαίνει την εγκεκριμένη πίστωση της 2^{ης} Π.Σ και οφείλεται στην δαπάνη της πρόβλεψης αναθεώρησης και της δαπάνης ΦΠΑ της 1ης Σ.Σ(λόγω αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ). Επιπλέον με βάσει στα αναφερόμενα στο ανωτέρω σχετικό ο ανάδοχος δικαιούται τόκους λόγω καθυστέρησης πληρωμής των κάτωθι λογαριασμών:

- 2ος λογαριασμός 1ης Σ.Σ
- 3ος λογαριασμός 1ης Σ.Σ
- 4ος λογαριασμός 1ης Σ.Σ
- 17ος λογαριασμός της κύριας σύμβασης.

Με το υπ' αριθμ.51220/19-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών μας κοινοποιήθηκε ότι εγκρίθηκε πίστωση 193.000,00 € η οποία αφορούσε την αποπληρωμή οφειλών προς τον εργολάβο όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω. Το ποσό αυτό είχε ζητηθεί επανειλημμένως από την δημοτική αρχή με τελευταία προσπάθεια με το υπ' αριθμ. 15929/25-9-2013 μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών η οποία και ευοδώθηκε με το ανωτέρω αποτέλεσμα.

Τέλος σε πρόσφατο δελτίο τύπου του Περιφερειάρχη κ. Απόστολου Κατσιφάρα (Πέμπτη, 02 Ιανουάριος 2014 ώρα:12:11) ανακοινώθηκε πως : «...δύο σημαντικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι άκρως απαραίτητα προκειμένου να καταστούν λειτουργικοί οι δυο Βιολογικοί Καθαρισμοί της Ηλείας, δηλαδή ο κοινός Βιολογικός Καθαρισμός Ανδραβίδας – Λεχατινών – Τραγανού – Κάστρου Κυλλήνης και ο ΒΙΟ.ΚΑ. Γαστούνης Βαρθολομιού, εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας...». Ειδικότερα το έργο Γαστούνης Βαρθολομιού θα το αναλάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι το ανωτέρω ποσό προέκυψε από τις μελέτες (2) που είχε έγκαιρα καταφέρει να εκπονήσει ο Δήμος Πηνειού και τις είχε θέσει με το υπ' αριθμ. 21007/23-12-2013 έγγραφό του στη διάθεση του ΥΠΕΚΑ, του κ. Περιφερειάρχη και του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας.

Περιμένουμε πλέον την διάθεση της σχετικής πίστωσης στην ΠΔΕ ώστε άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την δημοπράτηση και ολοκλήρωση του έργου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

