


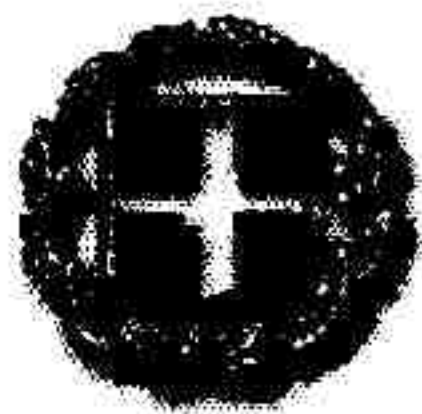

18 ΣΕΠ. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**Αθήνα, 17 - 09 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 756/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Φεβρωνία Πατριανάκου
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7512/04-04-2014 Ερώτηση ✓
Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7514/04-04-2014 Ερώτηση ✓
Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7515/04-04-2014 Ερώτηση ✓
Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7516/04-04-2014 Ερώτηση ✓

Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. πρωτ. 571/25-04-2014, 573/25-04-2014, 574/25-04-2014 και 575/25-04-2014 εγγράφων μας και σε απάντηση των ανωτέρω Ερωτήσεων, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Φεβρωνία Πατριανάκου, με θέματα «Ενίσχυση Υδροδότησης Οικισμών Πλατάνας & Σκούρας», «Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμών Συκαράκι, Αλεσία, Κόζι, Καλάμι, Γούναρη Δήμου Σπάρτης και Σύνδεση με το Υφιστάμενο Δίκτυο», «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αμυκλών» και «Προμήθεια - Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης» αντίστοιχα, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1344/05-05-2014 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

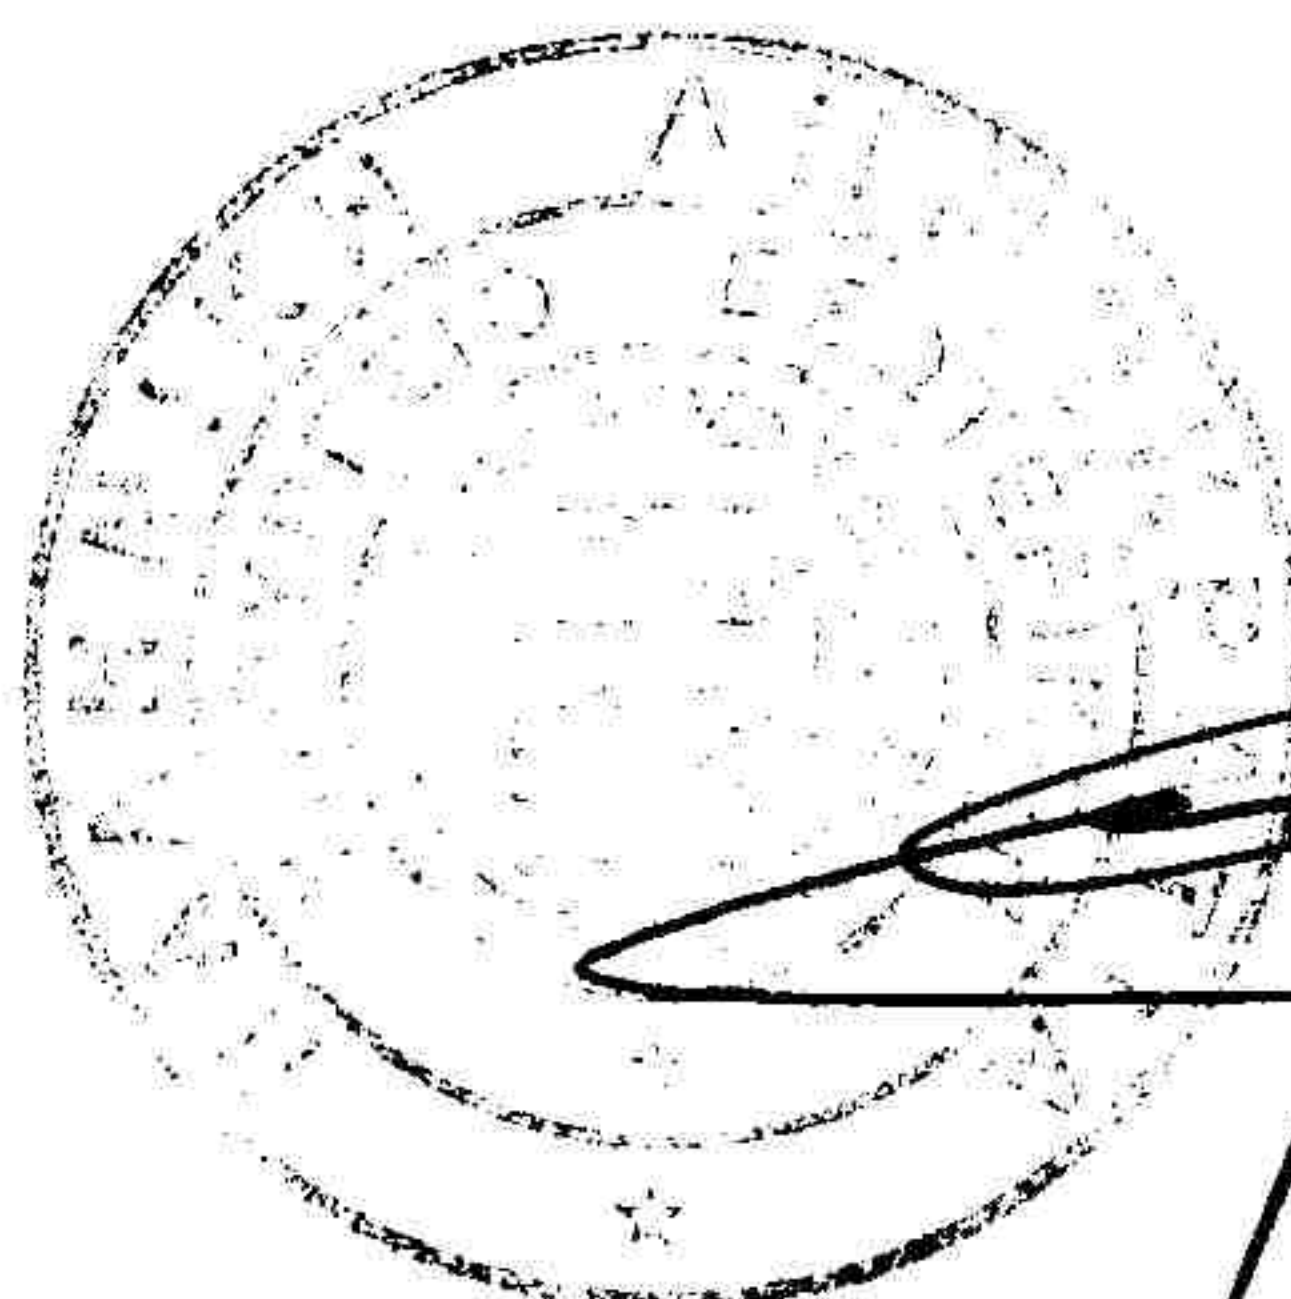

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
4. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

**Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ**

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Σπάρτη05-05-2014.....
Αρ. Πρωτ.1344.....

Διεύθυνση Ηλ. Γκορτσολόγου 52
Ταχ. Κώδικας 23100
Πληροφορίες
Τηλέφωνο (27310) 25331
Fax (27310) 28284
E-mail deyas@hol.gr

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2
105 63 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
3. Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

ΣΧΕΤ. : το υπ. Αρ. ~~3207/17-04-2014~~ έγγραφό σας

13887/7-4-14

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα κάτωθι για έργο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας :

1. Έργο : «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΑΤΑΝΑΣ & ΣΚΟΥΡΑΣ**»

7512

- 1.1. Το έργο εντάχθηκε με την υπ. Αρ. 1497/05-04-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
- 1.2. Η δημοπρασία έγινε την 13^η-08-2013
- 1.3. Επικύρωση πρακτικών διαγωνισμού την 04^η-10-2013 με την υπ. Αρ. 98/2013 ΑΔΣ, επικύρωση της απόφασης με το υπ. Αρ. 60092/2641/07-11-2013 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας /Τμήμα Διοικ/κού - Οικν/κού Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
- 1.4. Στις 15-11-2013 ζητούνται επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26, παρ. 2, Ν.36669/08, τα οποία υποβάλλονται την 29-11-2013
- 1.5. Την 03-01-2014 ζητείται η προσκόμιση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και πρόσθετων εγγυήσεων προκειμένου να ελεγχθούν πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.
- 1.6. Την 21-01-2014 υποβάλλονται από την ανάδοχο εταιρεία οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές
- 1.7. Την 24-01-2014 αποστέλλονται οι εγγυητικές επιστολές για έλεγχο.
- 1.8. Την 31-01-2014 ενημερώνεται η υπηρεσία για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών
- 1.9. Την 03-02-2014 αποστέλλεται η πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης.
- 1.10. Την 12-02-2014 υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 358.251,07 € (με Φ.Π.Α. 23%).
- 1.11. Την 17-02-2014 υποβάλλεται το χρονοδιάγραμμα έργου

- 1.12. Την 17-02-2014 υποβάλλεται ο 1^{ος} λογαριασμός-προκαταβολή
- 1.13. Την 26-02-2014 αποστέλλεται στην Διαχειριστική Αρχή για προέγκριση
- 1.14. Την 16-04-2014 υποβάλλεται από την εταιρεία φάκελος στον Δ. Σπάρτης για χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος
- 1.15. Την 16-04-2014 γνωστοποιείται η έναρξη εργασιών στην Ε' ΕΠΚΑ την 28-04-2014
- 1.16. Την 22/04/2014 μας γνωστοποιείται από την Ε' ΕΠΚΑ (1476/16-04-2014) ότι δεν είναι η έναρξη των εργασιών την ανωτέρω προθεσμία λόγω τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του υποέργου από το ΥΠ.ΠΟ.Α
- 1.17. Την 29-04-2014 προεγκρίνεται ο 1^{ος} λογαριασμός-προκαταβολή του υποέργου
- 1.18. Την 29-04-2014 αποστέλλεται έγγραφο στην Ε' ΕΠΚΑ με το οποίο ζητείται, για το διάστημα μέχρι την ενεργοποίηση του μνημονίου με την Υπηρεσία για το υποέργο της, να προταθεί ένας ειδικευμένος εργάτης για την παρακολούθηση των εκσκαφών για να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις και η δαπάνη θα καλυφθεί από τα απολογιστικά του έργου

2. Έργο : **«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΚΑΡΑΚΙ, ΑΛΕΣΙΑ, ΚΟΖΙ, ΚΑΛΑΜΙ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ»**

2.1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : **«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΚΑΡΑΚΙ, ΑΛΕΣΙΑ, ΚΟΖΙ, ΚΑΛΑΜΙ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ»**

2.1.1. Το έργο εντάχθηκε με την υπ. Αρ. 1461/03-04-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τροποποιήθηκε με την υπ. Αρ. 3669/12-08-2013 1^η Τροποποίηση της Πράξης **«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΚΑΡΑΚΙ, ΑΛΕΣΙΑ, ΚΟΖΙ, ΚΑΛΑΜΙ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ»** και την υπ. Αρ. 1306/14-03-2014 2^η Τροποποίηση της Πράξης **«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΚΑΡΑΚΙ, ΑΛΕΣΙΑ, ΚΟΖΙ, ΚΑΛΑΜΙ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ»**

2.1.2. Η δημοπρασία έγινε την 31^η-12-2013

2.1.3. Επικύρωση πρακτικών διαγωνισμού την 07^η-03-2014 με την υπ. Αρ. 24/2014 ΑΔΣ, επικύρωση της απόφασης με το υπ. Αρ. 19000/494/08-04-2014 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Εσωτ. Λειτουργίας /Τμήμα Διοικ/κού - Οικν/κού Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

2.1.4. Στις 24-04-2014 ζητούνται επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26, παρ. 2, Ν.36669/08, τα οποία αναμένεται να υποβληθούν την 12-05-2014 για έλεγχο.

2.2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**»

2.2.1. Το έργο εντάχθηκε με την υπ. Αρ. 1461/03-04-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τροποποιήθηκε με την υπ. Αρ. 3669/12-08-2013 1^η Τροποποίηση της Πράξης «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΚΑΡΑΚΙ, ΑΛΕΣΙΑ, ΚΟΖΙ, ΚΑΛΑΜΙ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ**» και την υπ. Αρ. 1306/14-03-2014 2^η Τροποποίηση της Πράξης «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΚΑΡΑΚΙ, ΑΛΕΣΙΑ, ΚΟΖΙ, ΚΑΛΑΜΙ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ**»

2.2.2. Η δημοπρασία ορίστηκε να γίνει την 10η-12-2013, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 100/4-10-2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 60086/2640/25-10-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου

2.2.3. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 3372/15-11-2013 ένσταση –προδικαστική προσφυγή ζητήθηκε η ακύρωση της Διακήρυξης

2.2.4. Με την υπ' αριθ. 119/29-11-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ έγινε δεκτή εν μέρει η παραπάνω ένσταση

2.2.5. Στις 9-12-2013 η ως άνω εταιρεία κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΥΑΣ (αριθ. κατάθεσης 65/2013) και εκδόθηκε προσωρινή διαταγή, χωρίς προηγούμενη κλήση της ΔΕΥΑΣ, δυνάμει της οποίας αναστέλλεται η εκτέλεση της με αριθ. Μελ. 19/2012 Διακήρυξης και της με αριθ. 86/2-8-2013 Απόφασης της ως άνω Προμήθειας

2.2.6. Την υπ. Αρ. 1/09-01-2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται ο διαγωνισμός

2.2.7. Την 17-01-2014 εγκρίνεται με την υπ. Αρ. 4/2014 ΑΔΣ η τροποποιημένη μελέτη

2.2.8. Την 08-04-2014 εγκρίνονται με την υπ. Αρ. 35/2014 ΑΔΣ οι όροι δημοπράτησης του έργου.

2.2.9. Την 14-04-2014 ζητείται η προέγκριση δημοπράτησης από την Διαχειριστική Αρχή.

3. Έργο : «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΥΚΛΩΝ**»

3.1. Το έργο εντάχθηκε με την υπ. Αρ. 1498/05-04-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τροποποιήθηκε με την υπ. Αρ. 1313/19-03-2014 1^η Τροποποίηση της Πράξης «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΥΚΛΩΝ**».

3.2. Η δημοπρασία έγινε την 20^η-08-2013

3.3. Επικύρωση πρακτικών διαγωνισμού την 04^η-10-2013 με την υπ. Αρ. 99/2013 ΑΔΣ, επικύρωση της απόφασης με το υπ. Αρ. 60092/2641/07-11-

- 2013 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Εσωτ. Λειτουργίας /Τμήμα Διοικ/κού - Οικν/κού Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
- 3.4. Την 30-10-2013 υποβλήθηκε προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
- 3.5. Την 15-01-2014 με την υπ. Αρ. 69884/3090/15-01-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης απορρίπτεται η ανωτέρω προσφυγή.
- 3.6. Την 21-01-2014 ζητούνται επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26, παρ. 2, Ν.36669/08, τα οποία υποβάλλονται την 07-02-2013.
- 3.7. Την 13-02-2014 ζητείται η προσκόμιση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και πρόσθετων εγγυήσεων προκειμένου να ελεγχθούν πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.
- 3.8. Την 24-02-2014 ζητείται η παράταση ισχύος της προσφοράς του μειοδότη, η οποία γίνεται αποδεκτή την 05-03-2014
- 3.9. Την 18-03-2014 αποστέλλεται πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού την 04-04-2014.
- 3.10. Η ανάδοχος εταιρεία δεν προσέρχεται την καθοριζόμενη ημερομηνία για υπογραφή συμφωνητικού και προσκόμιση εγγυητικών επιστολών με αποτέλεσμα η Διευθύνουσα Υπηρεσία να την κηρύξει έκπτωτη με την υπ. Αρ. 1238/11-04-2014 απόφασή της.
- 3.11. Την 16-04-2014 η ανάδοχος εταιρεία υποβάλλει ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εκκρεμεί η σύγκλιση απόφαση του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης.

4. Έργο : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ**»

- 4.1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ στις 18/6/2012, υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 1115 αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» προς την ενδιαμέση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου στο Ε.Π «Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007 - 2013».
- 4.2. Η προμήθεια εντάχθηκε στο Ε.Π «Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007 - 2013», με κωδικό MIS 380355, με την Α.Π 720/18-02-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
- 4.3. Στις 23/5/2013 εστάλη για δημοσίευση η προκήρυξη του διαγωνισμού, στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 16/7/2013 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός.
- 4.4. Στις 25 και 26/02/2014 η Δ.Ε.Υ.Α.Σ υπέγραψε τις συμβάσεις με τους αναδόχους και για τις επτά ομάδες εξοπλισμού. Ο συμβατικός χρόνος για την υλοποίηση της κάθε σύμβασης ήταν δύο (2) μήνες. Αυτή τη στιγμή έχει εγκατασταθεί στην Εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης το σύνολο του εξοπλισμού της 3^{ης} και 5^{ης} Ομάδας εξοπλισμού και έχει μάλιστα

τιμολογηθεί ενώ εγκαθίσταται και ο εξοπλισμός της 2^{ης} Ομάδας και σταδιακά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης, μέχρι τις 16/7/2014 θα έχει εγκατασταθεί και θα λειτουργεί το σύνολο του εξοπλισμού.

