


11 Νοε. 2014

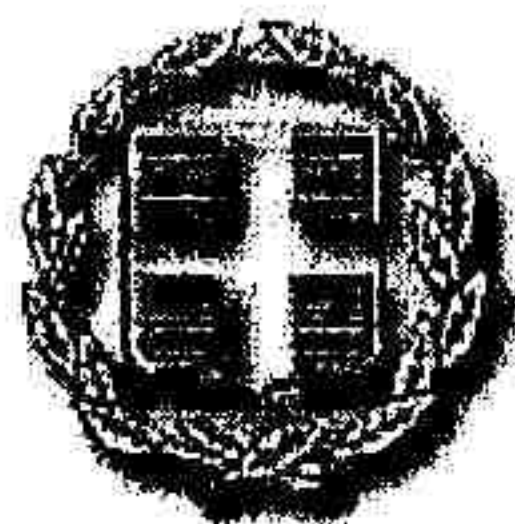

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 6- 11- 2014

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π 76564
(Σχ. 79858)

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 213.216.1433,
213.216.1427,
213.216.1426
- Fax : 210.5237254
- E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ

✓ **ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορές Βουλευτή

Απαντώντας στις με αρ. 1236/4-9-14 και 1348/11-9-14 αναφορές που κατατέθηκαν στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο σχετικά με το εργοστάσιο Κλασματοποίησης Πλάσματος, σας πληροφορούμε τα εξής :

Στις 26-1-1999 επεγράφη σύμβαση ανάμεσα στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και σε ανάδοχο κοινοπραξία με σκοπό τη μελέτη και κατασκευή του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας που, μεταξύ άλλων, αποτελείται από ένα πλήρες κτιριακό συγκρότημα με εξοπλισμό, για την παραγωγή προϊόντων πλάσματος, δυναμικότητας 100.000 λίτρων ετησίως, με συγχρηματοδότηση από το Β' ΚΠΣ. Οι εργασίες ξεκίνησαν μετά από 15 μήνες, τον Απρίλιο 2000, με συμβατική διάρκεια 24 μήνες.

Τα προϊόντα που θα παράγονταν στο πλαίσιο της εργολαβίας ήταν λευκωματίνη και ανοσοσφαιρίνες.

Σε επόμενη φάση που δεν αποτελούσε αντικείμενο της αρχικής εργολαβίας θα παράγονταν επίσης παράγοντας VIII, παράγοντας IX και αντιθρομβίνη (ATIII).

Ειδικότερα αντικείμενο της εργολαβίας ήταν:

- Η μελέτη, κατασκευή των κτιριακών –Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των γραμμών παραγωγής ως άνω και λοιπού εξοπλισμού (γραφειακού, εργαστηριακού, αυτοματισμού παραγωγής –ηλεκτρονικού).
- Η μελέτη, κατασκευή του Περιβάλλοντος Χώρου συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων βοηθητικών εγκαταστάσεων.
- Η εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών (Licenses) (στη χώρα προέλευσης των προϊόντων και όχι άδειες και εγκρίσεις και εγκρίσεις για τη διάθεση των προϊόντων στην Ελλάδα που αποτελεί θέμα προς εξέταση από το Φορέα Λειτουργίας του Κέντρου) και ο προσδιορισμός των προμηθειών (Royalties) για τα προϊόντα της παραγωγής.
- Η διασφάλιση της πιστοποίησης και διακρίβωσης (Qualification- Validation) της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγομένων προϊόντων.
- Η συντήρηση, λειτουργία, εποπτεία λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε την 30-9-2002 υπολείπονταν όμως η συντήρηση, λειτουργία, εποπτεία λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού. Οι εργασίες συντήρησης και λειτουργίας υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

Αριθμός Σελίδων απάντησης: 2
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων: 0
Συνολικός Αριθμός: 2

στην από 26-1-1999 Σύμβαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και ολοκληρώθηκαν την 31-8-2009.

Για την κατά τη σύμβαση ολοκλήρωση της εργολαβίας (στάδια εκπαίδευσης προσωπικού και ολοκλήρωσης της διαδικασίας διακρίβωσης – πιστοποίησης) ήταν απαραίτητη η διάθεση του απαιτούμενου από τη σύμβαση εξειδικευμένου προσωπικού (66 άτομα) για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής, κάτι το οποίο όμως δεν κατέστη δυνατό, μέχρι σήμερα, να πραγματοποιηθεί. Με την εν λόγω εκπαίδευση θα ολοκληρωνόταν ταυτόχρονα η διαδικασία διακρίβωσης και πιστοποίησης (Validation & Qualification) του εξοπλισμού, των γραμμών παραγωγής και του προσωπικού για την παραγωγή προϊόντων, από το πλάσμα, του αίματος.

Λόγω του μεγάλου διαστήματος που το έργο ήταν ανενεργό, η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε στο διάστημα από 2006-2008 σε επανελέγχους για το σύνολο του εξοπλισμού των γραμμών παραγωγής, παρουσία των αντίστοιχων προμηθευτών. Από τις αναφορές που έχουν υποβληθεί από την ανάδοχο εταιρεία στην ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (νυν ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.) προκύπτει ότι ο εξοπλισμός ήταν σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

Για το θέμα αυτό είναι εκπεφρασμένη η βούληση του Υπουργείου να πραγματοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό, όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καταστή δυνατή η παραλαβή του κέντρου και η μελλοντική, υπέρ δημοσίου συμφέροντος, αξιοποίησή του με τη χρήση των εκεί αποθηκευμένων μονάδων πλάσματος των υπηρεσιών αιμοδοσίας των νοσοκομείων της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή και δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τελευταίο έλεγχο του εξοπλισμού των γραμμών παραγωγής αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να κινηθούν οι διαδικασίες για την εκτίμηση της κατάστασης του εξοπλισμού των γραμμών παραγωγής του κέντρου και των κτιριακών του εγκαταστάσεων γενικότερα, ούτως ώστε να καθοριστούν επακριβώς οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες επί του θέματος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Δ/ση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
4. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

