



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

15 ΔΕΚ. 2014

**Αθήνα, 12 - 12 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 1643/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος


Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3897/22-10-2014 Ερώτηση
2. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3896/22-10-2014 (Συμπληρωματική απάντηση)

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1477/2014/14-11-2014 εγγράφου μας επί της υπ' αριθμ. πρωτ. 3896/22-10-2014 Ερώτησης και σε απάντηση της υπ' αριθμ. 3897/22-10-2014 σχετικής Ερώτησης, ομοίου περιεχομένου που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, εκ των οποίων η (υπό 1) μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 7017/4/18078/15-11-2014 έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και αφορούν σε προβλήματα στην οδό Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 163196/5302/04-11-2014 έγγραφο του Δημάρχου Πατρέων με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 4072/03-11-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής του οικείου Δήμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

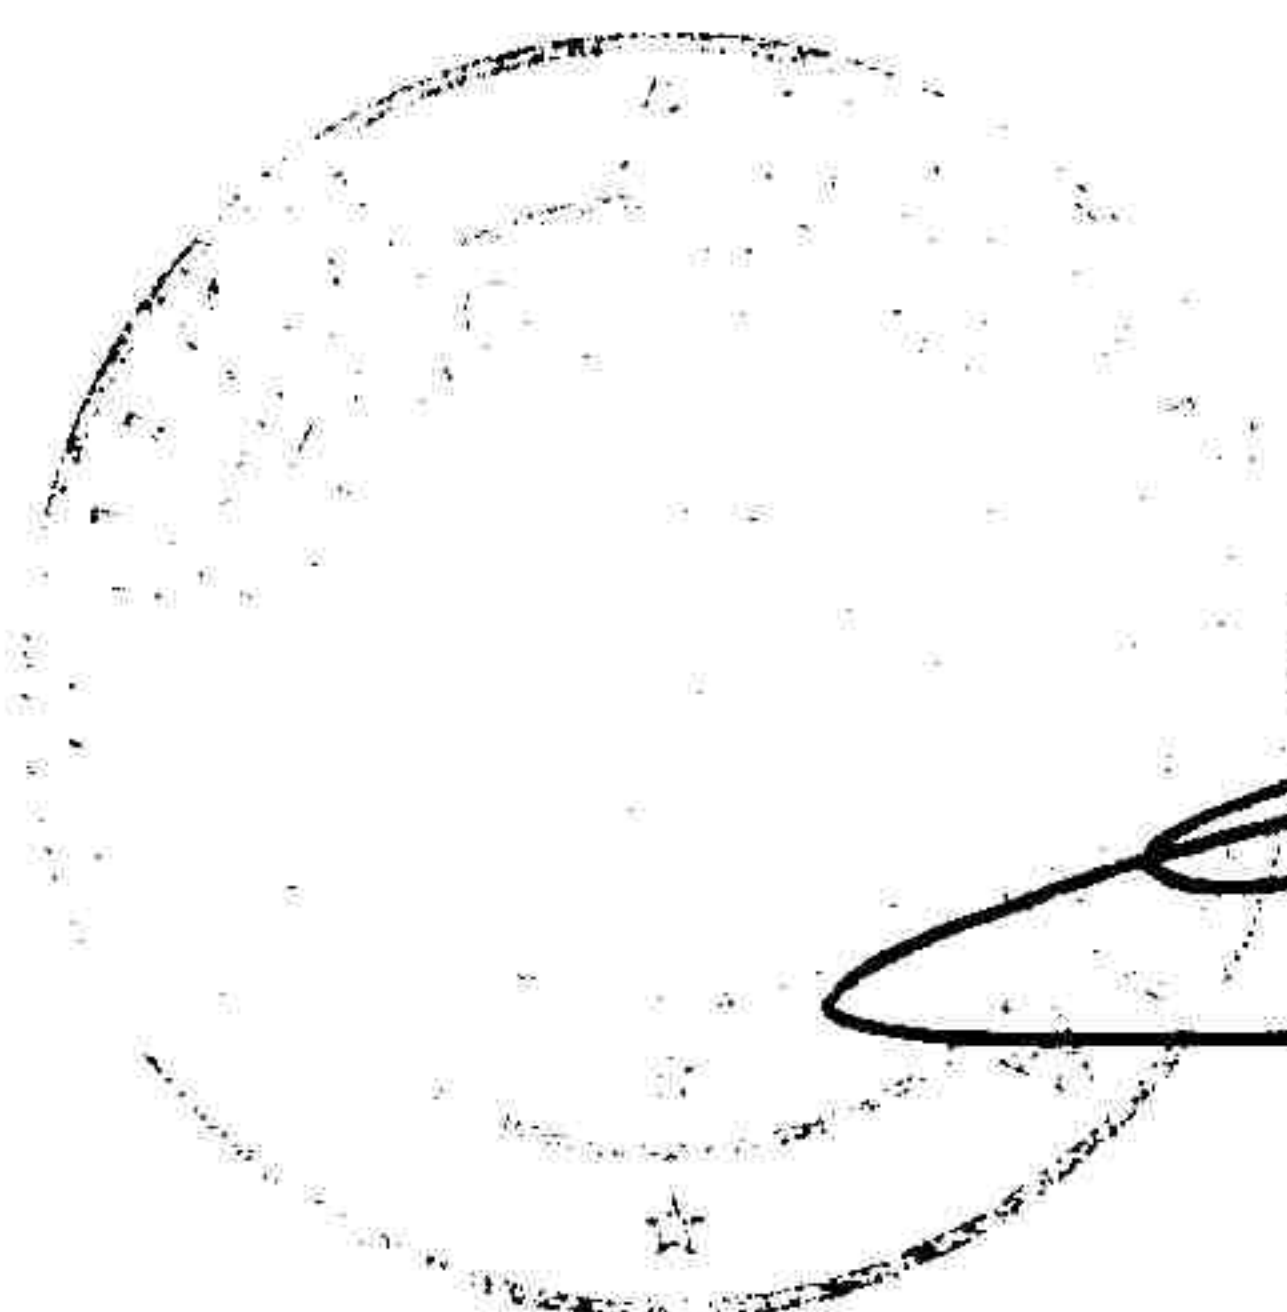


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓

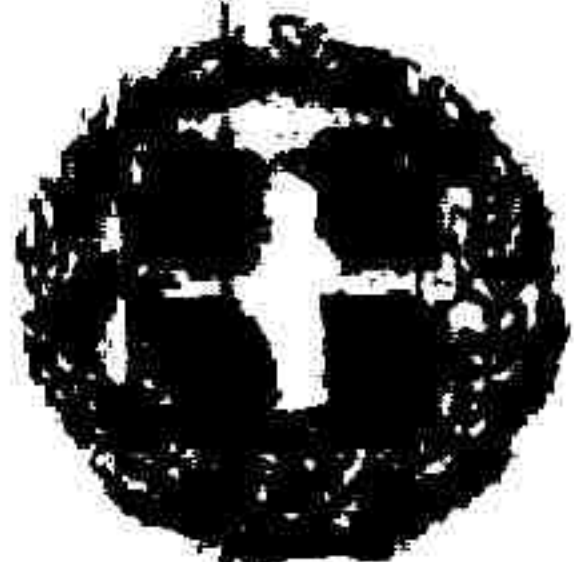

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2610 966-355
Fax: 2610 279-572
E-mail: patrasmayor@gmail.com

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πάτρα 4 Νοεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 163196/5302

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2
ΤΚ 105 63 ΑΘΗΝΑ

Υπόψη: κ.Μ.Κωνσταντέλλου
(αποστολή στο fax :213-1361150)

Θ Ε Μ Α : «Προβλήματα στην οδό Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα»

ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ.πρωτ.41385/24-10-2014 , έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου που αφορά την υπ.αριθμ.3896/22-10-2014 Ερώτηση του Βουλευτή κ.Ν.Νικολόπουλου, με θέμα: «Προβλήματα στην οδό Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα », σας διαβιβάζουμε την υπ.αριθμ.Ε4072/03-11-2014 σχετική απάντηση της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων (Δ/ση Έργων Υποδομής) και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ



Συνημμένα: Σελίδες πέντε (5)



Πάτρα 3/11/2014

Αρ. Πρωτ.:Ε4072

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Τμήμα Οδοποιίας
Πληροφ.: Βανταράκης Βασίλης
Τηλ: 2610-966268 Fax: 2610-966311
Ταχ. δ/ση: Παντανάσσης 30
Τ.Θ 3172 – Τ.Κ 26110

Προς: Γραφείο Δημάρχου

Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ α) Το με αρ. πρωτ. Ε4072/31-10-2014 έγγραφό σας
β) Το με αρ. πρωτ. 163196/29-10-2014 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών
γ) την με αρ. 3896/22-10-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών με την με αρ. 3896/22-10-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, για το έργο «Ανακατασκευή οδού Αγίου Ανδρέου» σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1. Η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 589/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμός μελέτης 83/2009)
2. Η δημοπρασία έγινε στις 15/09/2009, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 695/2009 απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου της Πάτρας και επικυρώθηκε με την υπ. αρ. 57138/16278/09 όμοια της Δνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «Τ.Ε.ΓΑ.ΚΑΤ. – Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε Ε» στην οποία ανετέθη το έργο με μ.τ.ε 57,23%
3. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 09/03/2010 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 8 μήνες ήτοι έως 09/11/2010.
4. Με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου έχουν δοθεί 4 παρατάσεις προθεσμίας του έργου με τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31/7/2012.
5. Ο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκε με την 535/2010 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.

Οι εργασίες της εργολαβίας «Αποκατάσταση οδού Αγίου Ανδρέου» προέβλεπαν δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα από οδό Παπαφλέσσα έως Γούναρη έγινε μόνον φρεζάρισμα του παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος και

κατασκευάστηκαν δύο στρώσεις ασφαλτικού με ενδιάμεσα τοποθετημένο γεωύφασμα σύμφωνα με την μελέτη.

Στο δεύτερο τμήμα του έργου, από οδό Γούναρη έως οδό Ζαΐμη έγινε γενική εκσκαφή της οδού σε βάθος περίπου ενός μέτρου αντικατάσταση του παλαιού δικτύου αποχέτευσης εξυγίανση του εδάφους, επίχωση, οδοστρωσία και τέλος δύο στρώσεις ασφαλτικών. Κατά την διάρκεια του χειμώνα 2010 - 2011 παρατηρήθηκαν στην στρώση κυκλοφορίας τοπικές ρηγματώσεις οι οποίες εξελίχθηκαν σε σοβαρά προβλήματα ερπυσμού της άνω στρώσης του ασφαλτικού από την αρχή του καλοκαιριού του 2011.

Μετά από δειγματοληψία από το Περιφερειακό Εργαστήριο Πατρών για λήψη δοκιμών (καρότα) και εργαστηριακό έλεγχο που έγινε την ίδια εποχή διαπιστώθηκε ότι το ασφαλτόμιγμα της άνω στρώσης δεν ανταποκρίνεται στην μελέτη σύνθεσης και βρίσκεται εκτός των ορίων και των επιτρεπομένων αποκλίσεων της ΠΤΠ Α265Β πλην ενός δοκιμίου που βρίσκεται εντός των ορίων της ΠΤΠ.

Μετά από εντολή της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος του έργου απεδέχθη την αστοχία υλικού η οποία παρουσιάστηκε και ανέλαβε να αποκαταστήσει τις βλάβες που παρουσιάστηκαν με δικές του δαπάνες κατά τα προβλεπόμενα τον Αύγουστο του 2011.

Το καλοκαίρι του 2012 παρουσιάστηκαν παρόμοια προβλήματα στο τμήμα της Αγίου Ανδρέου από Τριών Ναυάρχων έως Γούναρη.

Έτσι με την με αρ. πρωτ Υ 3702/173736/13-12-2012 ειδική διαταγή της Υπηρεσίας που στάλθηκε στον ανάδοχο εδόθη εντολή για τα εξής:

« ... Μετά τα παραπάνω σας καλούμε όπως άμεσα εντός 15 ημερών από της παρούσης:

- Να φροντίσετε ώστε να γίνει δειγματοληψία από το Περιφερειακό Εργαστήριο Πατρών για λήψη δοκιμών (καρότα) και εργαστηριακό έλεγχο τόσο στα σημεία που έχουν παρουσιαστεί βλάβες όσο και στο υπόλοιπο έργο από Τριών Ναυάρχων έως Γούναρη
- Επειδή τα ελαττώματα στην άνω στρώση του ασφαλοτάπητα από Τριών Ναυάρχων έως Γούναρη είναι ουσιώδη να αποκαταστήσετε άμεσα τον ασφαλοτάπητα από Τριών Ναυάρχων έως Γούναρη μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη του έργου»

Κατά της ανωτέρω ειδικής διαταγής ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση με αρ. πρωτ. 245/2-1-2013 σύμφωνα με την οποία θεωρεί ότι η φθορά που παρουσιάστηκε στο τμήμα της οδού Αγίου Ανδρέου από οδό Μιαούλη έως οδό Γούναρη οφείλεται στην λανθασμένη μελέτη τοποθέτησης γεωυφάσματος ανάμεσα στις δύο καινούργιες στρώσεις ασφαλτοτάπητα

Με το με αρ πρωτ 5576/10-1-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας ενημερώθηκε ο ανάδοχος ότι θα πρέπει να υποστηρίξει τα αναφερόμενα στην ένστασή του με τεχνική έκθεση αρμοδίου για αυτό οργάνου, και ο ανάδοχος με το με αρ. πρωτ 17119/30-1-2013 έγγραφό του ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι έχει κάνει αίτηση για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας.

Επειδή η Υπηρεσία δεν ενημερώθηκε από το ΤΕΕ για ορισμό πραγματογνώμονα έως τον Ιούλιο του 2013 και το πρόβλημα δεν είχε αντιμετωπιστεί με την με αρ. πρωτ E2167/18-7-2013 ειδική πρόσκληση που έγινε στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 4 του Ν 3669/2008 εδόθη εντολή όπως άμεσα εντός δεκά (10) ημερών προβεί στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών του ασφαλτοτάπητα της οδού Αγίου Ανδρέου από Τριών Ναυάρχων έως Γούναρη

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δεν είχε εκτελεστεί στην τασσόμενη προθεσμία καμία εργασία και με το με αρ. πρωτ. 92177/Υ2164/8-7-2011 έγγραφο και σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ 6 του Ν 3669/2008, η παραπάνω εταιρία κηρύχθηκε έκπτωτη από το έργο.

Κατά της ανωτέρω απόφασης έκπτωσης ο Ανάδοχος υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 142994/21-8-2013 ένσταση, με την οποία υποστηρίζει ότι οι φθορές που παρουσιάστηκαν στο οδόστρωμα οφείλονται σε αστοχία της επιλεχθείσας λύσης της τοποθέτησης γεωυφάσματος μεταξύ των νέων ασφαλτοταπήτων

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ορισμός πραγματογνώμονα από το ΤΕΕ, ο οποίος και ολοκλήρωσε την έκθεσή του στις 9/9/2013, στην οποία αναφέρει ότι υπάρχει απουσία εξειδικευμένης μελέτης για την επιλογή και τοποθέτηση γεωυφάσματος, καθότι υπάρχει μικρή εμπειρία στην χρήση γεωυφασμάτων για τον έλεγχο ανακλαστικής ρηγμάτωσης και στην ανάδοχο εταιρία καθώς και στην Διευθύνουσα Υπηρεσία

Με αρ. πρωτ. 197727/20-11-2013 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων μας διαβίβασε απόσπασμα 14^{ου} Πρακτικού της από 24-10-2013 συνεδρίασής του με το οποίο «γνωμοδοτεί ομόφωνα για την αποδοχή της ένστασης κατά της

απόφασης έκπτωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της γνωμοδότησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, τα αναφερόμενα στην ένσταση του αναδόχου καθώς και ειδικότερα το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ σύμφωνα με το οποίο οι παρατηρηθείσες βλάβες οφείλονται σε εσφαλμένη χρήση γεωυφάσματος μεταξύ των νέων ασφαλισοπατήτων, κυρίως λόγω απουσίας εξειδικευμένης μελέτης.»

Με την υπ' αριθμ. 26/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή η υπ.αριθμ. 142994/21-8-2013 ένσταση της εταιρίας ΤΕΓΑΚΑΤ - Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε κατά της απόφασης έκπτωσής σας από το έργο «Ανακατασκευή οδού Αγίου Ανδρέου».

Μετά τα παραπάνω και έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από τον ανάδοχο του έργου.

Για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου απομένει ακόμα το τμήμα της οδού Αγίου Ανδρέου από οδό Ζαΐμη έως οδό Καρόλου, το οποίο και δεν κατασκευάστηκε λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο υπόλοιπο έργο.

Όσον αφορά τα ερωτήματα του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου

1. Στην οδό Αγίου Ανδρέου και στο τμήμα από οδό Παπαφλέσσα έως Γούναρη έγινε μόνον φρεζάρισμα του παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος και κατασκευή νέου, ενώ στο τμήμα από οδό Γούναρη έως οδό Ζαΐμη, έγινε γενική εκσκαφή της οδού σε βάθος περίπου ενός μέτρου αντικατάσταση του παλαιού δικτύου αποχέτευσης εξυγίανση του εδάφους, επίχωση, οδοστρωσία και τέλος δύο στρώσεις ασφαλτικών. Δεν έχουν γίνει άλλες εργασίες την τελευταία δεκαετία.

2. Το έργο έχει έως σήμερα κοστίσει 362,205,16 €, ενώ η αποκατάσταση της βλάβης που παρουσιάστηκε έγινε με δαπάνες του Αναδόχου κατά τα προβλεπόμενα τον Αύγουστο του 2011. Ο Δήμος Πατρέων δεν επιβαρύνθηκε οικονομικά από την αποκατάσταση της αστοχίας που παρουσιάστηκε όπως άλλωστε προβλέπεται και από την σύμβαση και τον νόμο.

3. Το έργο δεν έχει παραληφθεί.

4. Το τμήμα της οδού που αποκαταστάθηκε δεν ξαναπαρουσίασε κανένα πρόβλημα, ενώ στο τμήμα της οδού από οδό Μιαούλη έως οδό Γούναρη παρουσιάζεται πρώτη φορά το πρόβλημα, γίνεται προσωρινή συντήρηση από τα συνεργεία του Δήμου Πατρέων και το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί οριστικά στο εγγύς μέλλον.

5. Η ποιότητα της ασφάλτου έχει ήδη ελεγχθεί με τα εργαστηριακά που έχουν έως σήμερα ληφθεί, ενώ η Υπηρεσία έχει ζητήσει από τον Ανάδοχο επί πλέον λήψη καρτών και έλεγχο του ασφαλικού στα υπόλοιπα τμήματα.

Ο Επιβλέπων

Β. Βαντιράκης
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Σ. Μανιλάρας
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Διευθυντής

Γ. Σηλιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός
