


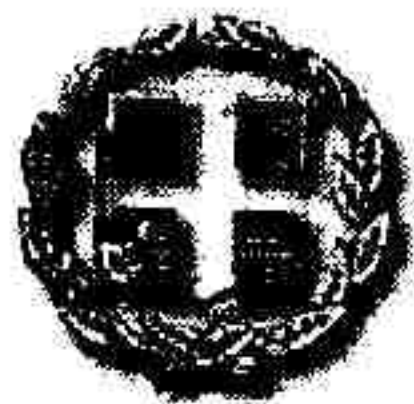

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

25 MAI. 2015

Αθήνα, 25 - 05 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 775

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Ευσταθία Γεωργοπούλου - Σαλτάρη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2147/29-04-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Ευσταθία Γεωργοπούλου - Σαλτάρη, με θέμα «Ενημέρωση για την Πράξη "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ" με κωδικό MIS 376631 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη"», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 11724/Δ4/1353/12-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που είναι συναποδέκτες της Ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:

Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

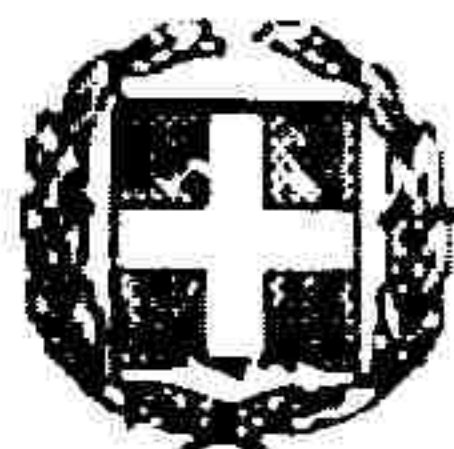

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Διεύθυνση : Ιπποκράτους 50
272 00 Αμαλιάδα
Πληροφορίες : Πίπιλα Μαργαρίτα
Τηλέφωνο : 2622.360.581, 2622.360.571
Τηλεομοιότυπο : 2622.038.373
Ηλεκτρ. Ταχυδρ. : pipila@amaliada.gr

Αμαλιάδα 12/ 05 / 2015
Αρ. Πρωτ.: 11724/Δ4 /1353

Προς:
ΥΠ.ΕΣ. Δ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Σταδίου 27
10183 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2131364033
Φαξ : 2131364354

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Απάντηση σε ερώτημα βουλευτού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 785/05-05-2015 έγγραφο σας

Αφού λάβαμε γνώση του υπ' αριθμ. πρωτ. 785/05-05-2015 εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάζετε ερώτηση της Γεωργοπούλου – Σαλάρη Ευσταθίας, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» που εκτελείται στο Δήμο Ηλιδας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

- Η εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την 27-8-2014 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 26-6-2015.
- Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της υπογραφείσας σύμβασης είναι 2.510.135,51 €

Απάντηση επί ερωτήματος 1

- Ο ανάδοχος έχει ξεκινήσει εργασίες στα τρία από τα πέντε τμήματα που προβλέπονται στο έργο και συγκεκριμένα στις πλατείες Μπελογιάννη, Λαζαράκη και Βάρναλη (εκοκαφές, καθαιρέσεις, χωματουργικά, δίκτυα Η/Μ και επιστρώσεις με ψυχρά υλικά)
- Το ποσό των πιστοποιημένων εκτελεσμένων εργασιών με ΦΠΑ είναι 216.779,25 € ήτοι ποσοστό 8,6% εκ του συνόλου.

Απάντηση επί ερωτήματος 2

- Για το έργο έχουν υποβληθεί από τον ανάδοχο και πιστοποιηθεί από την υπηρεσία μας έως σήμερα, τρεις (3) λογαριασμοί 100.000,00 (1^{ος} λογαριασμός ως προκαταβολή) 30.073,50€ (2^{ος} λογαριασμός) και 79.395, 61€ (3ος λογαριασμός).
- Στο χρονικό διάστημα των οκτώ (8) περίπου μηνών που εκτελείται το έργο, η καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών του έργου, οφείλεται:
 - Ι. Στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το χειμώνα 2014 -2015 (Σεπτέμβριος 2014: 9 ημέρες βροχή, Οκτώβριος 2014 : 19 ημέρες βροχή, Νοέμβριος 2014: 13 ημέρες βροχή, Δεκέμβριος 2014 : 24 ημέρες βροχή, Ιανουάριος 2015: 14 ημέρες βροχή, Φεβρουάριος 2015: 15 ημέρες βροχή.) δηλαδή βροχοπτώσεις για χρονικό διάστημα περίπου 2,5 μηνών.

- ii. Στη διακοπή οικοδομικών εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού Ο 2^{ος} Λογαριασμός υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 29-12-2014 και πιστοποιήθηκε εμπρόθεσμα από την υπηρεσία μας στις 22-1-2015. Η Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 3/3/2015 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6685/Δ4/798/17-3-2015 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ήλιδας. Η διακοπή εργασιών διήρκεσε 2 περίπου μήνες, από 3-3-2015 έως 29-4-2015 όπου και δόθηκε η εντολή για επανέναρξη των εργασιών του έργου.
- iii. Στο γεγονός ότι το έργο εκτελείται στο κέντρο της πόλης και υπάρχουν μια σειρά από διαμαρτυρίες - αιτήσεις πολιτών, (επαγγελματιών, ΚΤΕΛ, ταξί, ΕΛ ΤΑ κ.λπ.) σχετικά με θέματα που τους απασχολούν (ιδιοκτησιακά - κυκλοφορίας - στάθμευσης - πρόσβασης - όχλησης) και πρέπει, προκειμένου να επιλυθούν, να προηγηθεί συνεργασία της υπηρεσίας μας, με τους μελετητές και τους νομικούς συμβούλους των εμπλεκόμενων μερών.

Απάντηση επί ερωτήματος 3

- Η υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της πορείας του έργου και την πρόταση για απένταξή του ή μη. Η εκτίμηση μας είναι ότι **το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο υπό προϋποθέσεις** και συγκεκριμένα εφόσον:
 1. Η χρηματοδότηση και εξόφληση των λογαριασμών του αναδόχου γίνεται εμπρόθεσμα
 2. Ο ανάδοχος ενισχύσει σημαντικά τα συνεργεία του κατά τους θερινούς μήνες

Απάντηση επί ερωτήματος 4

- Οι επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία της πόλης είναι οι συνήθειες που παρατηρούνται κατά την εκτέλεση έργων εντός του οικιστικού ιστού μιας πόλης, τα οποία όμως θεωρούνται υποδεέστερα και παροδικά, σε σχέση με τα μόνιμα οφέλη που θα επέλθουν από την υλοποίηση του έργου.
- Κατά την εκτέλεση του έργου,
- Έχουν παρθεί τα προβλεπόμενα μέτρα σήμανσης και διευκόλυνσης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει απαιτηθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας σε κεντρική οδό, αλλά αυτό είναι αναπόφευκτο βάσει των σχεδίων της μελέτης.
- Με την ολοκλήρωση του έργου προβλέπονται σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή της πόλης, καθώς με την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αξιοποιούνται οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, το δυναμικό της ηλιακής ενέργειας, του ανέμου και της μορφολογίας της περιοχής με συνδυασμένα ευρύτερα οφέλη όπως:
 - α. Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.
 - β. Ανάδειξη της φυσιογνωμίας και των ιδιαίτερων πολιτισμικών και φυσικών χαρακτηριστικών του αστικού χώρου
 - γ. Πριμοδότηση της κυκλοφορίας των πεζών και της κυκλοφορίας των ποδηλάτων.
 - δ. Βελτίωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που οδηγούν τελικά στην μείωση των επιφανειών που αποδίδονται στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, προς όφελος των κοινοχρήστων επιφανειών
 - ε. Βελτίωση θερμικού ισοζυγίου της περιοχής ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο και δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος
 - ς. Οικολογική διαχείριση
 - ζ. Ορθολογική διαχείριση της ενέργειας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Στέφανος Ρουμελιώτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
