



24 Ιουλ. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

5102 'VXI 12

**Αθήνα, 24 - 07 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 1324**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3155/03-06-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, με θέμα «Άμεση άρση των εμποδίων για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του οδικού τμήματος Πατρίδα-Νάουσα που έχει σταματήσει», η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 271/24-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 342/03-07-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 303080/5446/03-07-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας.

Κατά τα λοιπά, το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει προβεί σε αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων επί των διαλαμβανόμενων της ανωτέρω Ερώτησης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1473/24-07-2015 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση θα ενημερώσουμε εκ νέου την Εθνική Αντιπροσωπεία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ




Σωτηρία Λιαυδάκη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

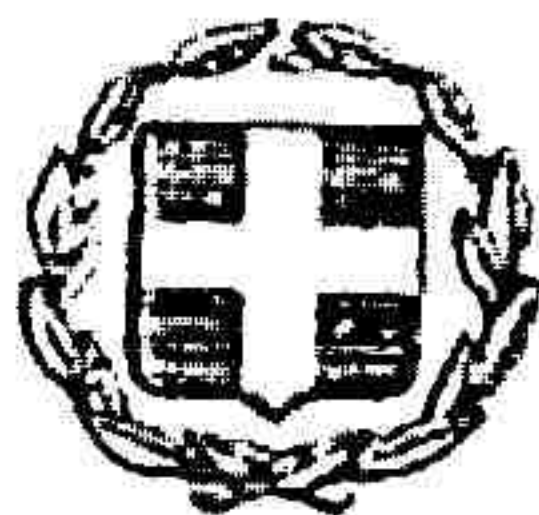

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 03/07/2015
Αριθμ. Πρωτ.: 342

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΣ: ✓ Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(fax: 2131361230)

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53
Τ.Κ.: 542 48
Τηλέφωνο: 2313 331191
2313 331188
FAX: 2313 331146
e-mail: E.Avramidis@pkm.gov.gr
M.Kastanidou@pkm.gov.gr

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφ. Περιφερειάρχη
2. Γραφ. Εκτελεστικού Γραμματέα
Π.Κ.Μ.
3. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ημαθίας

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο αρ. 21823/29-06-2015 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σχετικά με την αρ. 3155/03-06-2015 ερώτηση του βουλευτή του
Απόστολου Βεσυρόπουλου
Σχετ.: Το αρ. 303080/5446 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ.

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ.,
σε απάντηση της αρ. 3155/03-06-2015 ερώτησης του βουλευτή κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, με
θέμα: «Άμεση άρση των εμποδίων για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του οδικού
τμήματος Πατρίδα – Νάουσα, που έχει σταματήσει».
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Συνημμένα: 1



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

βαθμός ασφάλειας

ταχυδρομική διεύθυνση :
Στρωμνίτης 53
Ταχ. Κωδ 542 10, Τ.Θ. 17022
πληροφορίες : Χ. Κραβαρίτης
τηλέφωνο : 2313 331.159
F A X : 2310 331 115
email : c.Kravaritis@pkm.gov.gr

Θεσσαλονίκη,
αριθμός πρωτοκόλλου
303080/5446

03 Ιουλίου 2015
βαθμός προτεραιότητας

✓ Προς:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων

ΘΕΜΑ : Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 3155/3-6-2015 του Βουλευτή κ. Απόστολου Βεζυρόπουλου με θέμα την «Άμεση άρση των εμποδίων για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του έργου κατασκευής του οδικού τμήματος Πατρίδα-Νάουσα, που έχει σταματήσει»
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 337/2-7-2015 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Ε. Αβραμίδη.

Με το παραπάνω σχετικό μας διαβιβάσατε την ερώτηση του Βουλευτή κ. Απόστολου Βεζυρόπουλου αναφορικά με την «Άμεση άρση των εμποδίων για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του έργου κατασκευής του οδικού τμήματος Πατρίδα-Νάουσα, που έχει σταματήσει». Στο έγγραφό του ο Βουλευτής κ. Α. Βεζυρόπουλος αναφέρεται στην καθυστέρηση πληρωμών των λογαριασμών του έργου από τον Μάρτιο έως τον Μάιο. Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:

Στις 22-11-2013 υπογράφηκε από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 12-09-2015.

Στις 06-04-2015 ο ανάδοχος υπέβαλλε τον 15^ο Λογαριασμό που αφορούσε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Μάρτιο. Το ποσό του λογαριασμού ήταν 568.656,19€ και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία στις 08-04-2015. Στις 22-04-2015 ο ανάδοχος πληρώθηκε ως έναντι το ποσό των 97.505,14€ . Το σύνολο του λογαριασμού έπρεπε να έχει πληρωθεί εντός διμήνου από την υποβολή του ήτοι μέχρι και την 06-06-2015. Μέχρι και σήμερα, όπως ισχυρίζεται ο Ανάδοχος, δεν έχει εξοφληθεί το υπόλοιπο ποσό του συγκεκριμένου λογαριασμού.

Στη συνέχεια ο Ανάδοχος υπέβαλλε στις 07-05-2015 τον 16^ο λογαριασμό ποσού 491.701,71€ που αφορά εργασίες μηνός Απριλίου. Ο λογαριασμός (16^{ος}) διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Ταμείο στις 12-06-2015 και μέχρι σήμερα δεν έχει εξοφληθεί.

Επίσης στις 08-06-2015 ο Ανάδοχος υπέβαλλε τον 17^ο λογαριασμό ποσού 160.175,81€ που αφορά εργασίες μηνός Μαΐου. Για τον 17^ο λογαριασμό η Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 260238/4638 /26-6-2015 έγγραφό της ζήτησε από τον Ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά πληρωμής (κρατήσεις, έκδοση τιμολογίου κλπ) προκειμένου η Υπηρεσία μας να διαβιβάσει τον λογαριασμό στο Περιφερειακό Ταμείο Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να γίνει η πληρωμή του.

Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Κώδικας Δημοσίων έργων) και συγκεκριμένα την παραγρ. 9 του άρθρου 53 :

«Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003486 (ΦΕΚ 38 Α΄) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.»

Οπότε στη συνέχεια ο ανάδοχος έκανε χρήση του νόμιμου δικαιώματός του όπως αυτό διατυπώνεται στην παραγρ. 9 του άρθρου 53 και στην παραγρ.3 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008 (Κώδικας Δημοσίων Έργων) και υπέβαλλε, στις 30-06-2015, στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής των εργασιών του έργου αφού είχε υποβάλλει προηγούμενα την όχληση του με το αριθμ. πρωτ. ΠΝ-142/11-06-2015.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει πρόβλημα στην εξόφληση των λογαριασμών του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 298692/5376/02-07-2015 διαβίβασε φωτοαντίγραφο της ειδικής έγγραφης δήλωσης διακοπής των εργασιών του αναδόχου στο Περιφερειακό Ταμείο κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μας ενημερώσει σχετικά με τις εκκρεμότητες των ανωτέρω πληρωμών.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.
(χρον. αρχ. + ΦΕ)

Αλέξανδρος Μήλιος
Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ β.

