



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΡΙΠΟΛΗ 03-07-2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Ταχ. Διεύθυνση: *ΝΑΥΠΛΙΟΥ 57, 221 32 ΤΡΙΠΟΛΗ*

Πληροφορίες: *ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ*

Τηλέφωνο: 2713 610 254

Email: papadian@eppel.gov.gr, papadian@gmail.com

ΘΕΜΑ: *Απάντηση στην ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 5889/4/6/2025, της Βουλευτού Β'2 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Κας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ*

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Έδρας) Περιφέρειας Πελοποννήσου σύναψε την υπ' αρ. 223158/54271/οικ./22-09-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007368252) Σύμβαση Μελέτης, της οποίας το συμβατικό αντικείμενο αποτελούσε η άρση της επικινδυνότητας χρήσης της οδού σε τέσσερις (4) συγκεκριμένες θέσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στην επόμενη εικόνα.

Αναλυτικότερα, από τις συνολικά τέσσερις (4) εξεταζόμενες θέσεις του οδικού τμήματος, οι δύο πρώτες (Θέσεις 1 και 2) χωροθετούνται στην Περιφέρεια Αττικής (Δ. Κ. Μεγαρέων, Δήμος Μεγαρέων, Π.Ε. Δυτικής Αττικής) και οι άλλες δύο (Θέσεις 3 και 4) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Τ.Κ. Πισίων, Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας, Π.Ε. Κορινθίας).




Οι συγκεκριμένες θέσεις είναι τμήματα του οδικού δικτύου που συνδέει το Αλεποχώρι με το Σχίνο, το οποίο χωροθετείται στις απολήξεις των Γερανείων Ορέων. Για αυτό ακριβώς το λόγο τα πρανή της υφιστάμενης οδού παρουσιάζουν σημαντικά ύψη με μεγάλες κλίσεις εδαφών.

Το ανάγλυφο της περιοχής χαρακτηρίζεται από τα απότομα παράκτια πολύ μεγάλου ύψους, πρανή. Τα πρανή παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα ασταθειών, τα οποία σχετίζονται με τον έντονο τεκτονισμό της περιοχής, τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης και με τεχνικο-γεωλογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών. Τεμάχια από τα

υφιστάμενα πρανή καταπίπτουν στο υφιστάμενο οδόστρωμα και δημιουργούν σοβαρά θέματα ασφάλειας.

Σε συνέχεια του μελετητικού αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης και των επιτόπου εργασιών για τις ανάγκες εκπόνησης της, και προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο ασφαλείας της υφιστάμενης οδού, προέκυψε η αναγκαιότητα για επέκτασης των εργασιών μελέτης σε τρία (3) ακόμη τμήματα, **Θέση 2Α, Θέση 2Β (μεταξύ των αρχικών θέσεων 2 και 3) και Θέση 3Α (μεταξύ των αρχικών θέσεων 3 και 4)** όπου διαπιστώθηκαν βραχοπτώσεις κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών. Σημειώνεται ότι η περιοχή μελέτης έχει επηρεαστεί από τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τα Γεράνεια Όρη το 2021. από τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τα Γεράνεια Όρη το 2021. Οι θέσεις αυτές παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα.

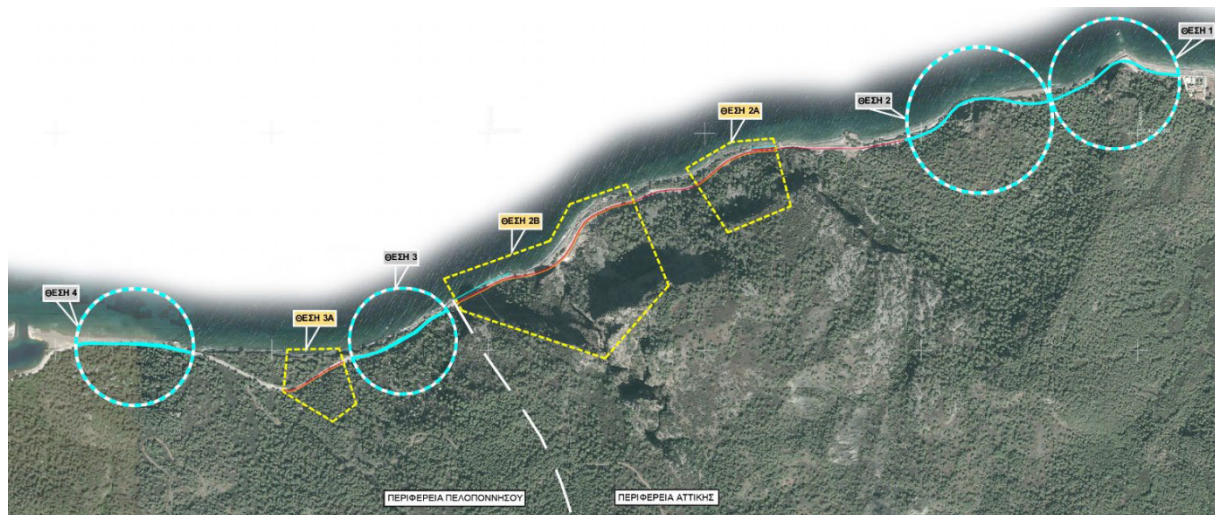

ΜΕ την υπ' αρ. 63883/05-03-2025 Διαταγή Οριστικής διακοπής εργασιών της 223158/54271/οικ./22-09-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007368252) Σύμβασης **καθώς Απαιτείται μια συνολική αντιμετώπιση** του προβλήματος σε ολόκληρο το οδικό τμήμα ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΧΙΝΟΥ και όχι μόνο στα επιμέρους τμήματα που εξετάζει η παρούσα Μελέτη

Σε συνεργασία με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και με Χρηματοδότηση από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, είναι σε διαδικασία Προσυμβατικού Ελέγχου, νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 του άρθρου 2§3 του Ν.4674/2020 και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) μεταξύ των

1. Ο.Τ.Α. Β' βαθμού «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
2. Ο.Τ.Α. Β' βαθμού «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ («Α.Ο.Π. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.»)

με αντικείμενο

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ»

Προϋπολογισμός: 430.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

1.1. Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελείται από τα κάτωθι τρία (3) υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκπόνηση μελετών

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» θα αναλάβει να εκπονήσει, να

θεωρήσει, και να παραδώσει τις απαιτούμενες επιμέρους μελέτες σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ/466/19 (ΦΕΚ 1047 Β/29-03-2019): «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα».

Α' Φάση: Κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης της πράξης θα εκπονηθούν και παραδοθούν οι απαιτούμενες επιμέρους μελέτες για την σύνταξη του Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με σκοπό την έκδοση Α.Ε.Π.Ο. Ειδικότερα:

- Τοπογραφική & Βυθομετρική αποτύπωση
- Αξιολόγηση Γεωτεχνικής Έρευνας
- Προμελέτη Οδοποιίας
- Οριστική Γεωλογική Μελέτη
- Ακτομηχανική Μελέτη
- Προμελέτη Υδραυλικών Έργων
- Προμελέτη Τεχνικών Έργων
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Β' Φάση: Κατά το δεύτερο στάδιο υλοποίησης της πράξης και σε συνέχεια της έκδοσης Α.Ε.Π.Ο., θα εκπονηθούν και παραδοθούν οι οριστικές μελέτες. Ειδικότερα:

- Γεωτεχνική Μελέτη
- Οριστική Μελέτη Οδοποιίας
- Οριστική Υδραυλική Μελέτη
- Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων
- Οριστική Μελέτη Λιμενικών Έργων
- Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης
- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Γεωτεχνικές Έρευνες

Ο «Α.Ο.Π. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» θα αναλάβει τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση των Γεωτεχνικών Ερευνών.

Η επίβλεψη, η παραλαβή και όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εκπόνηση των ερευνών θα γίνουν από τον «Α.Ο.Π. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.».

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του Αναπτυξιακού Οργανισμού για την υλοποίηση των μελετών - Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έργων – Διάθεση Επιστημονικού Προσωπικού

Ο «Α.Ο.Π. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» θα αναλάβει την οργάνωση και προγραμματισμό των εργασιών του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης συνολικά, την παραλαβή των παραδοτέων, τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης-τη διενέργεια του διαγωνισμού- την επίβλεψη και την παραλαβή του υποέργου 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

A. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

B. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

- ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

A.A

ΜΙΧΑΗΛ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ

ΠΟΛ. Μηχανικός με Α' Β

Γ. ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
