


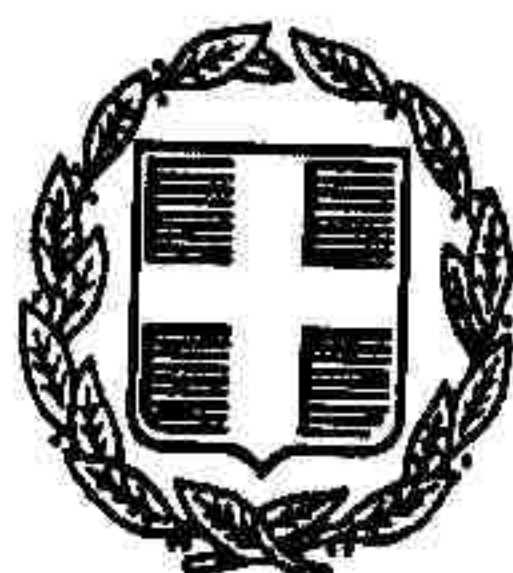

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

4239

12.4

12 ΑΠΡ. 2011

Αθήνα, 12.4.2011

Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./309

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.379

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

~~Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου~~
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη
2. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 4239/18.3.2011 Αναφορά

Το έργο «Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.)», με φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η.), προέβλεπε 5 κτήρια και τον περιβάλλοντα χώρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 42.000.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χωρίς να περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός.

Τον Ιούλιο 2003 εντάχθηκε στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, στο Ε.Π. «Πολιτισμός», μέρος του συνολικού έργου, δηλαδή 3 κτήρια και ο αντίστοιχος περιβάλλον χώρος (συγχρηματοδοτούμενο τμήμα), προϋπολογισμού 17.000.000,00 € πλέον του μη επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση Φ.Π.Α. Τα άλλα 2 κτήρια και ο αντίστοιχος περιβάλλον χώρος αποτελούσαν το αυτοχρηματοδοτούμενο τμήμα του έργου.

Μετά από την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία τον Απρίλιο 2006, το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα διαμορφώθηκε στο ποσόν των 22.180.077,30 € πλέον Φ.Π.Α. Για το συγχρηματοδοτούμενο τμήμα ήταν 16.324.553,42 € πλέον Φ.Π.Α. και για το αυτοχρηματοδοτούμενο 5.855.523,88 € πλέον Φ.Π.Α.

Έτσι, ο φορέας στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ., έχει χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕ 014/3 για το σύνολο του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση ποσό, δηλαδή 16.324.853,42 €, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες ανέρχονταν στο ποσό των 11.814.687,43 €.

Ο Δήμος Ηρακλείου στο παρελθόν δεσμεύτηκε εγγράφως (αναφορά στο ΤΔΕ) για την εξασφάλιση των πόρων α) του αυτοχρηματοδοτούμενου τμήματος, β) του μη επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση Φ.Π.Α. του συνόλου του έργου και γ) του εξοπλισμού όλου του Π.Σ.Κ.Η.

Σύμφωνα όμως με τον 3^ο ΑΠΕ, που ακολούθησε και ο οποίος δεν έχει έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΠΟΤ (ΕΥΤΟΠ), ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 29.847.695 €, ποσόν που δηλώθηκε στο ΤΔΕ κατά εθνικούς πόρους που έστειλε ο Δήμος Ηρακλείου τον Αύγουστο 2010 (βλ. συν. 2).

Τον Μάιο και τον Αύγουστο 2010, ύστερα από αιτήματα του Δήμου Ηρακλείου, και σχετικές προτάσεις της ΕΥΤΟΠ στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ, ο προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ/ΣΑΕ 014/3 διαμορφώθηκε σε 22.324.853 € και παράλληλα εγκρίθηκαν πιστώσεις 2010, ύψους 6.000.000 € (4.000.000 + 2.000.000 €). Ωστόσο, το σύνολο της επιχορήγησης που τελικά έλαβε η ΔΕΠΤΑΗ το 2010, ανέρχεται σε 4.336.218 €.

Ύστερα από τα παραπάνω, σας πληροφορούμε ότι προκειμένου η ΔΕΠΤΑΗ να επιχορηγηθεί το υπολειπόμενο ποσόν του έτους 2010 ύψους 1.663.781 € (6.000.000-4.336.218 €), το ΥΠΠΟΤ πρόκειται να υποβάλλει σχετικό αίτημα προς το ΥΠΟΙΑΝ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

