



17 ΙΩΝ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
 101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 16.06.2015

Αρ. Πρωτ 223

✓ Προς τη
 Βουλή των Ελλήνων
 Δ/ση Κοινοβουλευτικού
 Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις καθυστερήσεις στα έργα του οδικού άξονα Καλλονής- Σιγρίου

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2550/14.05.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
 ο Βουλευτής κύριος Αντώνιος Γρέγος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Αντώνιο Γρέγο
 2) Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης –Γρ. Υπουργού


Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης , παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. βουλευτή ,ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΚΓ/ΦΚΑΘ75.00/ΟΔ/ΔΗ/1/Δ/οικ.3813/20-5-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών και το με αρ.πρ. 6913/20-5-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ«Υποδομές Μεταφορών ,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.ΚΓ/ΦΚΑΘ75.00/ΟΔ/ΔΗ/1/Δ/οικ.3813/20-5-2015 έγγραφο
- το με αρ.πρ. 6913/20-5-2015 σχετικό έγγραφο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
 Γρ. Κοιν. Ελέγχου

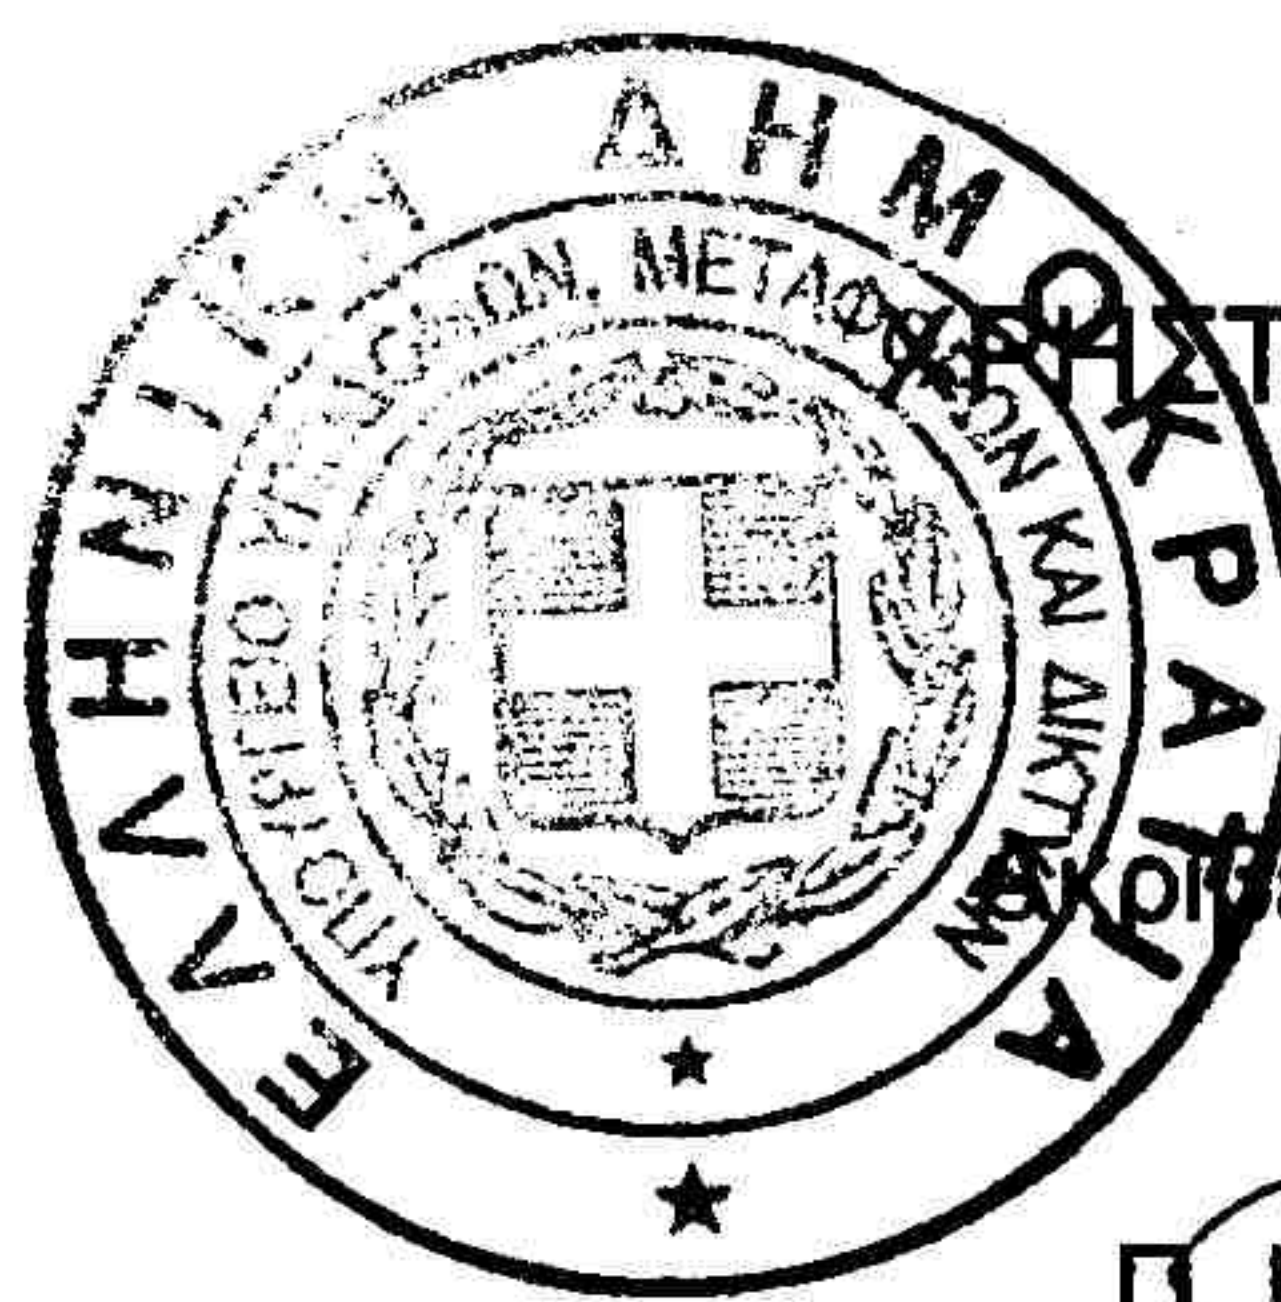


ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη

✓

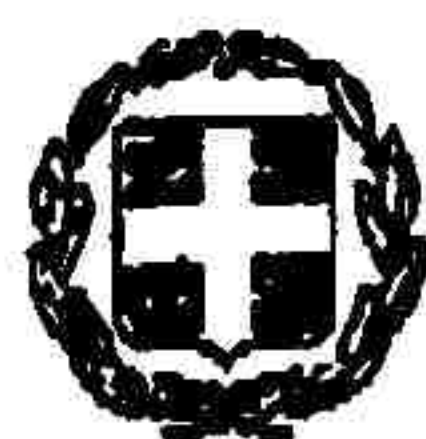

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
X	X

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ. : 115 23, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ευτ. Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6417579
FAX : 210 6417530

Αθήνα 20 /05/2015

Α.Π. ΚΓ/ΦΚ ΑΘ 75.00/ΟΔ/ΔΗ/1/Δ/οικ. 3813

Σχετ.:

ΠΡΟΣ

Υ.ΟΙΚΟ.ΥΠΟ.ΝΑ.&ΤΟΥ.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Χαρ. Τρικούπη 182
10178, ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 6467912

✓ (διά του γραφείου του Γεν. Δντή Σ. Υ.)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο ερώτημα με αρ. πρ. 2550/14-05-2015 του βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Αντώνιου Γρέγου.

Κατόπιν του με αρ. πρ. 223/19-05-2015 εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσατε την με αρ. πρ. 2550/14-05-2015 ερώτηση του βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Αντωνίου Γρέγου που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» αφορά στην αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής –Σιγρίου Λέσβου μήκους 46,7 χλμ. (έναντι 52 χλμ. της υπάρχουσας οδού) και περιλαμβάνει: α) την βελτίωση σε μήκος περίπου 21 χιλιομέτρων της υφιστάμενης οδού με αναβάθμιση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αυτής και β) την κατασκευή νέων τμημάτων επί μήκους 25,7 χλμ. περίπου.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 39.515.400,00 € με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός του έργου διενεργήθηκε στις 27-03-2012. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10-09-2012 με συνολικό ποσό 38.004.088,80 € (με ΦΠΑ, μέση έκπτωση 4,17%).

Οι πιστοποιημένες εργασίες μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ποσό των 6.792.064,42 € με ΦΠΑ (1ος έως 8ος λογαριασμός), με ανεξόφλητο υπόλοιπο τον 9ο Λογαριασμό 629.480,24 € με ΦΠΑ και ανεκτέλεστο αντικείμενο 30.582.544,14 € με ΦΠΑ.

Η εγκεκριμένη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι μέχρι την 9-9-2016.

Όσον αφορά την εξέλιξη των εργασιών, έχει ολοκληρωθεί το 19% του συνόλου των εργασιών που περιλαμβάνει τις εργασίες χωματουργικών, τεχνικών και οδοστρωσίας.

Προβλήματα κατά την υλοποίηση του έργου:

1. Καθυστέρηση του έργου λόγω των εκσκαφικών εργασιών που παρακολουθούνται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ.Λέσβου) με σκοπό τον εντοπισμό και εν συνεχεία την διάσωση των απολιθωμένων κορμών. Το Μ.Φ.Ι.Α.Δ. Λέσβου απαγόρευσε τη χρήση εκρηκτικών σε όλο το μήκος της Προστατευόμενης Περιοχής από την Αρχή του έργου (Σίγρι) μέχρι τον κόμβο Άντισσας, περίπου 16,00 χλμ. και επέβαλε οι εκσκαφές να γίνονται με την εποπτεία του και τις εντολές του προς τους χειριστές των μηχανημάτων. Η συλλογή των απολιθωμάτων γίνεται από το Μ.Φ.Ι.Α.Δ. Λέσβου.

2. Καθυστέρηση στην μετατόπιση των δικτύων Ο.Κ.Ω.

3. Καθυστέρηση στην κατάληψη των εκτάσεων.

Μέχρι στιγμής η κατάληψη των εκτάσεων γίνεται με επιτάξεις και υπάρχουν προβλήματα λόγω άρνησης των ιδιοκτητών για παράδοση των ακινήτων τους ζητώντας αλλαγές στη μελέτη του έργου ή πρόσθετες αποζημιώσεις.

Επίσης, η πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» με την αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ.2784/18-08-2011 Απόφαση. Με την με την αρ. πρωτ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ.5964/15.12.2014 Απόφαση ανακλήθηκε η Απόφαση ένταξης του εν λόγω έργου. Στην παρούσα φάση το έργο έχει συμπεριληφθεί στην πρόταση για χρηματοδότηση του στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η ένταξη του θα ολοκληρωθεί με την ενεργοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.»), η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2015.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φακ. Πρ/νου ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
2. Τμήμα Γ
3. ΦΚ ΑΘ 75.00/ΟΔ
4. κ. Ευτ. Γιαννοπούλου
5. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

α.α.

Σ. ΜΠΑΣΙΘΥΚΑΣ

Πολ. Μηχ. με Β' βαθμό





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ
ΚΑΙ ΤΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Μονάδα Α1
Ταχ. Δ/ση: Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Διμέλλης
Τηλέφωνο: 210-6412972
Fax: 210-6930188
Email: gdimellis@epoalaa.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αθήνα, 20-5-2015
Α.Π.: 6913

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υποδομών
gke@ggde.gr
FAX : 210-6442940

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΘΕΜΑ: Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 2550/14-5-2015 του Βουλευτή κ. Αντώνιου Γρέγου.

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 223/19-5-2015 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η Ερώτηση αριθμ. πρωτ. 2550/14-5-2015 του Βουλευτή κ. Αντώνιου Γρέγου, και αναφορικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Υπηρεσία μας, με το υπ. αριθμ. πρωτ. 4030/7-5-2015 έγγραφό της, προχώρησε στην έναρξη της διαδικασίας σταδιακής εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της διαβίβασης, στις αρμόδιες Επιτελικές Δομές ή/και – ελλείψει αυτών - στις σχετικές Υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και στις ΕΥΔ των ΠΕΠ, Τυποποιημένου Έντυπου Πρότασης για την υποβολή των προτάσεων δράσεων αρμοδιότητάς τους, που εμπίπτουν στις επενδυτικές προτεραιότητες και στους ειδικούς στόχους του ανωτέρω Προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου μας, η οποία είναι αρμόδια για το έργο του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου, αναμένεται να υποβάλει την πρότασή της για το έργο, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο, εμπίπτει στις επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 5 «Περιφερειακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών» του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράμματος, περιλαμβάνεται δε στις ενδεικτικές δράσεις του Α.Π.

Σε συνέχεια της ως ανωτέρω διαδικασίας σταδιακής εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα εκδοθεί σχετική πρόσκληση, προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση, να αξιολογηθεί και, εφόσον εμπίπτει στα ανωτέρω κριτήρια, να ενταχθεί στον Α.Π. 5.

Η Προϊσταμένη
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Ζωή Παπασιωπη

Διευθύντρια Αντιγραφο
Ειδικής Γραμματείας



Εσωτερική Διανομή:

- 1) Φ.Ε. (Φ.Δ06.1)
- 2) Μονάδα Α1
- 3) Γ. Διμέλλης



\\W2003s\env\ΑΡΧΕΙΑ\ΕΠΕΠ\34_ΒΟΥΛΗ\2015\Φ VIII 1_3\Ερχόμενο Έγγραφο_0013-19-5-2015-ΓΡΕΓΟΣ.docx

Σελ. 1 / 1

ΚΩΔ. ΑΡ.: Φ. VIII.1_3

Ερχόμενο Έγγραφο

Έκδοση: 7

Ισχύει από: 01/04/2015
